




Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt: N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
Vertragnehmer: INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau/BSA
Projektnummer: 090069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU): August


Vertragsdatum: 14.11.2018
Vertragslaufzeit: 31.12.2022
Finanzierungskonto: Unterhalt
Inventarobjekt: FUP.2
Phasen, beauftragt: GHGW
Phasen, rapportiert: GHGW

Aktuelle Stundenausschöpfung

(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

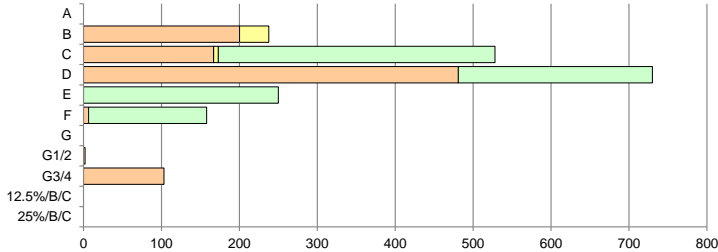

Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B	130	200.25	37.5		107.75	183%
C	528	167	6	355		33%
D	730	481		249		66%
E	250		250			
F	158	6.5		151.5		4%
G						
G1/2		2			2	
G3/4		103.25			103.25	
12.5%/B/C						
25%/B/C						
Σ	1796	960	43.5	1005.5	1003.5	56%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung 89%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach CHF 152'200.00
Kosten ist CHF 87'759
Kostenausschöpfung 57.66%
Stundenausschöpfung 56%

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B	2													2
	Kategorie	C	7.25													7.25
	Kategorie	D	20	17.75												37.75
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Jauslin Stebler AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B	0.25													0.25
	Kategorie	C	124	8.75												132.75
	Kategorie	D	282.75	124.5	29.25											436.5
	Kategorie	E														
	Kategorie	F	6.5													6.5
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2			2											2
Leipert AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B	60	48.5	28		11	13.5	6.5	30.5	37.5					235.5
	Kategorie	C		4						23	6					33
	Kategorie	D			6.75											6.75
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Holinger AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B														
	Kategorie	C														
	Kategorie	D														
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Total			559.5	250	66		11	13.5	6.5	53.5	43.5					1003.5

Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MwSt., inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A														
CHF 122.00	B	7595	5917	3416		1342	1647	793	3721	4575					29'006
CHF 95.00	C	12469	1211						2185	570					16'435
CHF 86.00	D	26'037	12'234	3'096											41'366
CHF 62.00	E														
CHF 50.00	F	325													325
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2			8											8
CHF 6.00	G3/4	341	279												620
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		46'765.25	19'640.75	6'520.00		1'342.00	1'647.00	793.00	5'906.00	5'145.00					CHF 87'759.00

Leipert AG**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.08.2022 bis 31.08.2022****Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, GHGW**

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Name Vorname	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Leipert Markus	B	31.5	122	3'843.00
Herzog Stefan	B	6	122	732.00
Riderle Timo	B	0	122	0.00
Total	B	37.5		4'575.00
Mozzillo Sergio	C	6	95	570.00
Weisskopf Silvan	C	0	95	0.00
Hofer Michael	C	0	95	0.00
Lazzarato Roberto	C	0	95	0.00
Total	C	6		570.00
Gassmann Silvia	D	0	86	0.00
Hofer Michael	D	0	86	0.00
Total	D	0		0.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Gesamttotal		43.5		5'145.00

Tag	Tätigkeitsbeschreibung		
	Stunden 100%	Zuschlag 25%	Zuschlag 50%
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12	3.00		
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30	3.00		
31			
Total	6.00	0.00	0.00

Name: **Mozzillo**

Vorname: **Sergio**

Monat: **August**

Jahr: **2022**

Kategorie: **C**

Kostenart: **1.3100**

Auftraggeber: **INGE EP RF BB**

Auftragsnummer: **327.2**

Bezeichnung: **N03, EP Rheinfelden Frick, GHGW (MK)**

Vertrag Nr.: 

Auftragsnummer extern:

Tag	Stunden	Zuschlag	Zuschlag	Tätigkeitsbeschreibung
	100%	25%	50%	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24	1.00			Besprechung mit JSAG und Überarbeitung Kostenzusammenstellung MK BSA & AP SABA
25	1.00			Überarbeitung und Abgabe Kostenzusammenstellung MK BSA & AP SABA an JSAG & AeBo
26	2.00			Überarbeitung und Finalisierung der MK BSA & AP SABA für Abgabe an AeBo
27				
28				
29	0.50			div. tel. Abklärungen mit AeBo & JSAG zu Abgabe MK BSA & AP SABA
30	1.50			Besprechung & Bereinigung Unterlagen mit D. Spieler, Abgabe MK BSA & AP SABA
31				
Total		6.00	0.00	0.00



Name: Herzog	Vorname: Stefan	Monat: August	Jahr: 2022	Kategorie: B	Kostenart:
Auftraggeber: INGE EP RF BB Auftragsnummer: 327.2 Bezeichnung: N03, EP Rheinfelden Frick, GHGW (MK)					
Vertrag Nr.: Auftragsnummer extern:					



Tag	Stunden 100%	Zuschlag 25%	Zuschlag 50%	Tätigkeitsbeschreibung
1	8.00			Überarbeiten MK, Kap. 4.4 / 4.5 / 4.6, Ergänzungen in div. Prinzipschemata
2	2.00			div. Abkl. und Ergänzungen für Prinzipschema an Zeichner gemeldet, Prüfen Auswirkungen neue AXPO-Leitung im Abschnitt
3	2.50			Bearbeitung MK, Vorbereitung Inhaltsverzeichnis und zus. Pläne Bau
4	3.00			div. Abkl. betr. Planbeilagen, Bearbeitung / Abgleich Texte / Pläne MK
5	9.00			Bearbeitung D7 / D8, Anforderungen an Bau Termine, Kosten
6	5.50			Ergänzungen Kosten im MK, Bereinigung Zusammenstellen Beilagen, kleine Korrekturen an Beilagen
7				
8				
9				
10				
11				
12	1.50			Bearbeitung / Stellungnahme / tel. Abkl. betr. AXPO-Leitung
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
Total	31.50	0.00	0.00	

Name:
Leipert

Vorname:
Markus

Monat:
August

Jahr:
2022

Kategorie:
B

Kostenart:
1.3100

Auftraggeber:
INGE EP RF BB

Auftragsnummer:
327.2

Bezeichnung:
N03, EP Rheinfelden Frick, GHGW (MK)

Vertrag Nr.:

Auftragsnummer extern:

