




## Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA  
Vertragnehmer: INGE EP RF-BB  
Vertrag Nr.: 000003  
Vertragsgegenstand: PV Bau und BSA  
Projektnummer: 90069  
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2022  
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Jul

Projektleiter Bauherr: Nicole Schulz  
Vertragsdatum: 22.10.2018  
Vertragslaufzeit: 01.07.18-31.01.22  
Finanzierungskonto:  
Inventarobjekt:  
Phasen, beauftragt: EK/GP - AP/MK  
Phasen, rapportiert: AP/MK

Aktuelle Stundenausschöpfung  
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

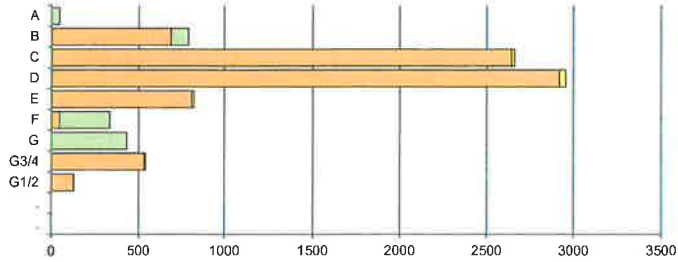

Gesamtübersicht in %



| Kategorien gem. Vertrag | Std. Dach | Std. IST | Std. NEU | Std. REST | Std. Überzug | Std. Verbrauch % |
|-------------------------|-----------|----------|----------|-----------|--------------|------------------|
| A                       | 43.75     | 1        |          | 42.75     |              | 2%               |
| B                       | 787.5     | 884.5    | 0.25     | 102.75    |              | 87%              |
| C                       | 1172.5    | 2844     | 18.25    |           | 1489.75      | 227%             |
| D                       | 1531.25   | 2917.5   | 38       |           | 1424.25      | 193%             |
| E                       | 481.25    | 808.25   | 12.5     |           | 339.5        | 171%             |
| F                       | 332.5     | 45.25    |          | 287.25    |              | 14%              |
| G                       | 428.75    |          |          | 428.75    |              |                  |
| G3/4                    |           | 529      | 9        |           | 538          |                  |
| G1/2                    |           | 128.25   | 2.25     |           | 128.5        |                  |
| Σ                       | 4777.5    | 7755.75  | 80.25    | 861.5     | 3920         | 164%             |

### quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung 85%

### rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Kostendach          | CHF 395'388 |
| Kosten ist          | CHF 647'662 |
| Kostenausschöpfung  | 163.80%     |
| Stundenausschöpfung | 164%        |

### Stundenabrechnung

| Name             | Vorname   | Kategorie | Vorjahr | Jan    | Feb    | Mrz  | Apr | Mai | Jun   | Jul   | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total  |
|------------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Zusammenzug Std. |           | G3/4      | 348.75  |        |        |      |     |     |       |       |     |     |     |     |     | 348.75 |
|                  |           | G1/2      | 114     |        |        |      |     |     |       |       |     |     |     |     |     | 114    |
|                  |           | D         | 201.75  |        |        |      |     |     |       |       |     |     |     |     |     | 201.75 |
| Roth             | Stefan    | A         | 1       |        |        |      |     |     |       |       |     |     |     |     |     | 1      |
| Forlin           | Sandro    | B         | 483     | 27     | 9.5    |      | 0.5 |     |       | 0.25  |     |     |     |     |     | 500.25 |
| Mantinger        | Michael   | B         | 2       |        |        |      |     |     |       |       |     |     |     |     |     | 2      |
| Methner          | Raphael   | B         | 182.5   |        |        |      |     |     |       |       |     |     |     |     |     | 182.5  |
| Brauchli         | Stefan    | C         | 1541    | 78.75  | 36.5   | 2.5  |     |     | 8.5   | 5.75  |     |     |     |     |     | 1673   |
| Gneder           | Fabio     | C         | 795     | 22.25  | 13.75  | 24   | 4   | 13  | 21    | 12.5  |     |     |     |     |     | 905.5  |
| Hunziker         | Livia     | C         | 32.75   |        |        |      |     |     |       |       |     |     |     |     |     | 32.75  |
| Stocker          | Thomas    | C         | 49      | 2      |        |      |     |     |       |       |     |     |     |     |     | 51     |
| Abdelmoghni      | Ahmed     | D         | 363.75  | 11.75  | 37.5   |      | 2   |     | 12.25 | 6.5   |     |     |     |     |     | 433.75 |
| Boeglin          | Chantal   | D         | 1       |        |        |      |     |     |       |       |     |     |     |     |     | 1      |
| Brunner          | Andreas   | D         | 3       |        |        |      |     |     |       |       |     |     |     |     |     | 3      |
| Challandes       | Cesarina  | D         | 7.5     |        |        |      |     |     |       |       |     |     |     |     |     | 7.5    |
| Deck             | Andreas   | D         | 404     | 0.5    |        |      |     |     |       |       |     |     |     |     |     | 404.5  |
| Dolder           | Silvio    | D         |         | 2.5    |        |      |     |     |       |       |     |     |     |     |     | 2.5    |
| Haberthur        | Nicolas   | D         | 228.5   |        |        |      |     |     |       |       |     |     |     |     |     | 228.5  |
| Nyffenegger      | Christoph | D         |         |        |        |      |     |     |       |       |     |     |     |     |     |        |
| Rothfuss         | Fabian    | D         | 1025.5  |        | 6      |      |     | 3   | 3.5   | 19.5  |     |     |     |     |     | 1057.5 |
| Seebacher        | Andreas   | D         | 546.25  | 28.25  | 20     |      | 0.5 |     | 8.5   | 12    |     |     |     |     |     | 615.5  |
| Tudisco          | Romina    | D         |         |        |        |      |     |     |       |       |     |     |     |     |     |        |
| Brüngger         | Marco     | E         | 599     | 12     | 7.5    |      |     |     |       | 12.5  |     |     |     |     |     | 631    |
| Ladner           | Roman     | E         | 84.75   | 7.5    | 11.5   |      |     |     |       |       |     |     |     |     |     | 83.75  |
| Müller           | Jan       | E         | 105.5   |        |        |      |     |     |       |       |     |     |     |     |     | 105.5  |
| Russer           | Elisabeth | E         | 0.5     |        |        |      |     |     |       |       |     |     |     |     |     | 0.5    |
| Köchli           | Pascal    | F         | 45.25   |        |        |      |     |     |       |       |     |     |     |     |     | 45.25  |
| Hegi             | Yannick   | G3/4      |         |        |        |      |     |     | 11    | 9     |     |     |     |     |     | 20     |
| Schreiber        | Severin   | G3/4      | 98.75   |        |        |      |     |     |       |       |     |     |     |     |     | 98.75  |
| Aston            | Tim       | G3/4      |         | 18.5   | 52     |      |     |     |       |       |     |     |     |     |     |        |
| Schneider        | Anika     | G1/2      | 2.5     | 3.25   | 2      |      |     |     | 4.5   | 2.25  |     |     |     |     |     | 14.5   |
| Total            |           |           | 7226.5  | 214.25 | 196.25 | 26.5 | 7   | 16  | 69.25 | 80.25 |     |     |     |     |     | 7836   |

### Kostenabrechnung

| Ansatz<br>(exkl. MwSt.,<br>inkl. Restzahl.) | Kategorie | Vorjahr    | Jan       | Feb       | Mrz      | Apr    | Mai      | Jun      | Jul      | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total      |
|---|-----------|------------|-----------|-----------|----------|--------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| 145.00                                      | A         | 145        |           |           |          |        |          |          |          |     |     |     |     |     | 145.00     |
| 122.00                                      | B         | 78'995     | 3'294     | 1'159     |          | 61     |          |          | 31       |     |     |     |     |     | 83'539.50  |
| 95.00                                       | C         | 229'686    | 9'785     | 4'774     | 2'518    | 380    | 1'235    | 2'803    | 1'734    |     |     |     |     |     | 252'913.75 |
| 86.00                                       | D         | 239'188    | 3'698     | 5'461     |          | 215    | 258      | 2'086    | 3'268    |     |     |     |     |     | 254'173.00 |
| 62.00                                       | E         | 47'725     | 1'209     | 1'178     |          |        |          |          | 775      |     |     |     |     |     | 50'886.50  |
| 50.00                                       | F         | 2'263      |           |           |          |        |          |          |          |     |     |     |     |     | 2'262.50   |
| 8.00  | G         |            |           |           |          |        |          |          |          |     |     |     |     |     |            |
| 5.00  | G3/4      | 2'685      | 111       | 312       |          |        |          | 66       | 54       |     |     |     |     |     | 3'228.00   |
| 4.00  | G1/2      | 466        | 13        | 8         |          |        |          | 18       | 9        |     |     |     |     |     | 514.00     |
| Total Monat                                 |           | 601'151.75 | 18'110.00 | 12'891.75 | 2'517.50 | 656.00 | 1'493.00 | 4'972.00 | 5'870.25 |     |     |     |     |     | 647'662.25 |

# ARBEITSRAPPORT



**Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022**

|              |   |                 |                        |
|--------------|---|-----------------|------------------------|
| Projekt-Nr.: | 702288.2160   |                 |                        |
| Bezeichnung  | <b>Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA</b><br><b>Projektkurzbezeichnung: EP RhFr</b><br><b>Projektnummer: 090069</b> |                 |                        |
| Auftrag-Nr.: | 702288.2160_PH 31 T-G   |                 |                        |
| Bezeichnung  | <b>EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-G</b>  |                 |                        |
| Mitarbeiter  | <b>Forlin Sandro (SFo)</b>  | Kategorie: B353 | Leitender Ingenieur(B) |
| Datum        | Leistungsbeschrieb  | Stunden         |                        |
| 05.07.2022   | Korreferat Anpassungen Abgabedossier  | 0.25            |                        |
| <b>Summe</b> |   | 0.25            |                        |

# ARBEITSRAPPORT



**Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022**

|              |  |                 |                          |
|--------------|--|-----------------|--------------------------|
| Projekt-Nr.: | 702288.2160  |                 |                          |
| Bezeichnung  | <b>Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA</b><br><b>Projektkurzbezeichnung: EP RhFr</b><br><b>Projektnummer: 090069</b>  |                 |                          |
| Auftrag-Nr.: | 702288.2160_PH 31 T-G  |                 |                          |
| Bezeichnung  | <b>EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-G</b>   |                 |                          |
| Mitarbeiter  | <b>Brauchli Stefan</b> (bsn)   | Kategorie: C354 | Architekt, Ingenieur (C) |
| Datum        | Leistungsbeschrieb   | Stunden         |                          |
| 05.07.2022   | Zusammenstellung Dossier T/G zur Abgabe  | 3.50            |                          |
| 13.07.2022   | Schlusskontrolle Dossier T/G, Korrektur Verteilerliste,<br>Zusammenstellen und Versand Dossier zur Abgabe; Korrektur und<br>Versand Kostenzusammenstellung je Objekt für Gesamt KV | 2.25            |                          |
| <b>Summe</b> |  | <b>5.75</b>     |                          |

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022

---

|              |   |
|--------------|---|
| Projekt-Nr.: | 702288.0  |
| Bezeichnung  | <b>Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA</b><br><b>Projektkurzbezeichnung: EP RhFr</b><br><b>Projektnummer: 090069</b> |
| Auftrag-Nr.: | 702288.0_PH 31 PL   |
| Bezeichnung  | <b>EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) PL</b>   |

|             |                           |                 |                     |
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| Mitarbeiter | <b>Grieder Fabio</b> (fg) | Kategorie: C253 | Leitender Ingenieur |
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------|

| Datum        | Leistungsbeschreibung                    | Stunden     |
|--------------|--|-------------|
| 07.07.2022   | Mini PS Bau inkl. Vor- und Nachbereitung | 1.50        |
| <b>Summe</b> |  | <b>1.50</b> |

# ARBEITSRAPPORT



**Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022**

Projekt-Nr.: 702288.0  
Bezeichnung: **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**  
**Projektkurzbezeichnung: EP RhFr**  
**Projektnummer: 090069**  
Auftrag-Nr.: 702288.0\_PH 31 T-U  
Bezeichnung: **EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U**

Mitarbeiter: **Grieder Fabio** (fg) Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

| Datum        | Leistungsbeschreibung   | Stunden      |
|--------------|---|--------------|
| 05.07.2022   | Koordination mit Y. Hegi betreffend Synoptischer Plan T/U (offene Fragen), Zusammenstellung Ergänzungen BSA-Pläne (neue VTV und div. weitere Punkte)  | 1.75         |
| 06.07.2022   | Dossier T/U (Abgleich BSA-Pläne, aufgleisen Aktualisierung KV)  | 0.50         |
| 11.07.2022   | Jour Fix im T/U-Team zur Dossierbereinigung; Abgleich intern mit A. Seebacher und A. Abdelmoghni betreffend Stand der Arbeiten und offene Punkte  | 1.50         |
| 12.07.2022   | Überarbeitung MK-Dokumente für Abgabedossier V0.9 (NV T/U, Ereignismanagement, Durchsicht Pläne, Technischer Bericht); Koordination mit PV Akustik betreffend Überarbeitung Dokumente Lärmschutz                | 2.50         |
| 13.07.2022   | Koreferat Technischer Bericht und Pläne inkl. diverse Ergänzungen; Bereitstellen NV und Ereignismanagement für Abgabe   | 1.50         |
| 14.07.2022   | Prüfen Anfrage BHU betreffend überdeckten BSA-Schächten inkl. telefonischem Abgleich mit BHU und PV BSA; Aktualisieren Gesamt-KV für Synthesedossier inkl. separate Aufstellung je Fachdisziplin für Beilage S2 | 3.25         |
| <b>Summe</b> |   | <b>11.00</b> |

# ARBEITSRAPPORT



**Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022**

|              |   |
|--------------|---|
| Projekt-Nr.: | 702288.0  |
| Bezeichnung  | <b>Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA</b><br><b>Projektkurzbezeichnung: EP RhFr</b><br><b>Projektnummer: 090069</b> |
| Auftrag-Nr.: | 702288.0_PH 31 T-U  |
| Bezeichnung  | <b>EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U</b>  |

|             |                                |            |      |               |
|-------------|--------------------------------|------------|------|---------------|
| Mitarbeiter | <b>Abdelmoghni Ahmed (aha)</b> | Kategorie: | D154 | Ingenieur (D) |
|-------------|--------------------------------|------------|------|---------------|

| Datum        | Leistungsbeschreibung  | Stunden     |
|--------------|--|-------------|
| 08.07.2022   | Ergänzung VTV-Kameras im Bericht & KV. Abgleich mit dem Zeichner. Erstellung Excell-Tabelle mit Kameras und Mehrausmass. | 3.50        |
| 11.07.2022   | Erstellung und Ablage Dokumente im Ablageordner 12.09.2022. Abgleich Baulinie Pläne 10.7.6 mit dem Zeichner              | 2.00        |
| 13.07.2022   | Ablage und Prüfung abzugebende Dokumente   | 1.00        |
| <b>Summe</b> |  | <b>6.50</b> |

# ARBEITSRAPPORT



**Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022**

|              |   |
|--------------|---|
| Projekt-Nr.: | 702288.2160   |
| Bezeichnung  | <b>Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA</b><br><b>Projektkurzbezeichnung: EP RhFr</b><br><b>Projektnummer: 090069</b> |
| Auftrag-Nr.: | 702288.2160_PH 31 K   |
| Bezeichnung  | <b>EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) K</b>  |

|             |                              |            |      |               |
|-------------|------------------------------|------------|------|---------------|
| Mitarbeiter | <b>Rothfuss Fabian</b> (rfa) | Kategorie: | D154 | Ingenieur (D) |
|-------------|------------------------------|------------|------|---------------|

| Datum        | Leistungsbeschreibung  | Stunden      |
|--------------|--|--------------|
| 01.07.2022   | Überarbeitung Fachdossier K gem. Rückmeldungen BHU, Erstellen Vorabzug 12.09 Dokumente Fachbereich K Version 0.9                 | 4.00         |
| 05.07.2022   | Überarbeitung Fachdossier K gem. Rückmeldungen BHU, Erstellen Vorabzug 12.09 Dokumente Fachbereich K Version 0.9                 | 4.00         |
| 06.07.2022   | Erstellen Vorabzug 12.09 Dokumente Fachbereich K Version 0.9   | 5.00         |
| 07.07.2022   | Erstellen Vorabzug 12.09 Dokumente Fachbereich K Version 0.9, Kontrolle Pläne  | 3.00         |
| 08.07.2022   | Erstellen Vorabzug 12.09 Dokumente Fachbereich K Version 0.9, Ändern Verteileier gem. Absprache INGE Partner in allen Dokumenten | 2.00         |
| 11.07.2022   | Fertigstellen Vorabzug 12.09 Dokumente Fachbereich K Version 0.9, Versand Dokumente an INGE Partner für Abgabe 15.07             | 1.50         |
| <b>Summe</b> |  | <b>19.50</b> |

# ARBEITSRAPPORT



**Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022**

Projekt-Nr.: 702288.0  
Bezeichnung: **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**  
**Projektkurzbezeichnung: EP RhFr**  
**Projektnummer: 090069**  
Auftrag-Nr.: 702288.0\_PH 31 T-U  
Bezeichnung: **EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U**

Mitarbeiter: **Seebacher Andreas (san)** Kategorie: D154 Ingenieur (D)

| Datum        | Leistungsbeschreibung  | Stunden      |
|--------------|--|--------------|
| 04.07.2022   | Ermitteln Anzahl Signale, Fundamente und Steher inkl. Rückmeldung an PV BSA  | 1.50         |
| 11.07.2022   | Kurzabgleich mit fg zu Abgabe Dossier offene Dokumente u. Pläne inkl. vorbereiten und nachbereiten; Anpassen Titelblatt VF Bericht; Einarbeiten KV   | 1.00         |
| 12.07.2022   | Nachführen KV insb. Signalisation und in TB u. Bericht KV; Detailplan 40.3-1 überarbeiten inkl. erarbeiten neues Detail  | 2.50         |
| 13.07.2022   | 10.8: Anpassen IO Liste und zusammenstellen Dokument; Dokument KV zusammenstellen und Kosten in TB nachfführen; Plankotnrolle Synoptischer Plan Konzept; Verteilen Unterlagen INGE intern; Nachführen S+M Plan inkl. versenden | 6.25         |
| 14.07.2022   | Nachführen TB; Auftrag Anpassungen Sig Plan für FB BSA   | 0.75         |
| <b>Summe</b> |  | <b>12.00</b> |



# ARBEITSRAPPORT



**Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022**

|              |   |                 |             |
|--------------|---|-----------------|-------------|
| Projekt-Nr.: | 702288.2160   |                 |             |
| Bezeichnung  | <b>Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA</b><br><b>Projektkurzbezeichnung: EP RhFr</b><br><b>Projektnummer: 090069</b> |                 |             |
| Auftrag-Nr.: | 702288.2160_PH 31 K   |                 |             |
| Bezeichnung  | <b>EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) K</b>  |                 |             |
| Mitarbeiter  | <b>Brüngger Marco</b> (mbr)   | Kategorie: E356 | Zeichner(E) |
| Datum        | Leistungsbeschreibung   | Stunden         |             |
| 04.07.2022   | Titelblätter anpassen für Abgabedossier   | 4.00            |             |
| 11.07.2022   | Anpassungen Titelblätter  | 0.50            |             |
| <b>Summe</b> |   | <b>4.50</b>     |             |

# ARBEITSRAPPORT



**Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022**

|              |   |                 |             |
|--------------|---|-----------------|-------------|
| Projekt-Nr.: | 702288.2160   |                 |             |
| Bezeichnung  | <b>Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA</b><br><b>Projektkurzbezeichnung: EP RhFr</b><br><b>Projektnummer: 090069</b> |                 |             |
| Auftrag-Nr.: | 702288.2160_PH 31 T-G   |                 |             |
| Bezeichnung  | <b>EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-G</b>  |                 |             |
| Mitarbeiter  | <b>Brüngger Marco (mbr)</b>   | Kategorie: E356 | Zeichner(E) |
| Datum        | Leistungsbeschreibung   | Stunden         |             |
| 04.07.2022   | Titelblätter anpassen für Abgabedossier, Anpassen Zaun N3-360   | 4.50            |             |
| 05.07.2022   | Titelblätter anpassen für Abgabedossier, Senkungsmulde Abgleiche zur anderen Plänen T/G ergänzen  | 3.50            |             |
| <b>Summe</b> |   | 8.00            |             |

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022

Projekt-Nr.: 702288.0  
Bezeichnung: **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**  
**Projektkurzbezeichnung: EP RhFr**  
**Projektnummer: 090069**  
Auftrag-Nr.: 702288.0\_PH 31 T-U  
Bezeichnung: **EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U**

Mitarbeiter: **Hegi Yannick (yh)** Kategorie: H Lehrling (3. + 4. LJ)

| Datum        | Leistungsbeschreibung  | Stunden     |
|--------------|--|-------------|
| 05.07.2022   | Korrekturen von A.Seebacher in den Plan: "Konzept Synoptischer Plan" einarbeiten (S+M abgleichen und Massnahmen anpassen sowie darstellerische Anpassungen)<br>Korrekturen von A.Seebacher in den Grundlagenplänen einarbeiten (SABA Mumpf ausblenden)<br>Korrekturen von A.Seebacher in S+M Plänen einarbeiten (Korrekturen an Massnahmen und darstellerische Anpassungen)<br>Korrekturen von A.Seebacher in Signalisationsplan für FB BSA einarbeiten (Titelblätter anpassen sowie die Anpassungen von den S+M Plänen in diesen Plan übernehmen) | 6.00        |
| 06.07.2022   | Anpassungen von F.Grieder in BSA Pläne einarbeiten (Leitungsverlauf SABA Mumpf, VTV Standorte und ESP Mumpf)   | 3.00        |
| <b>Summe</b> |  | <b>9.00</b> |

# ARBEITSRAPPORT



**Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022**

|              |   |
|--------------|---|
| Projekt-Nr.: | 702288.0  |
| Bezeichnung  | <b>Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA</b><br><b>Projektkurzbezeichnung: EP RhFr</b><br><b>Projektnummer: 090069</b> |
| Auftrag-Nr.: | 702288.0_PH 31 T-U  |
| Bezeichnung  | <b>EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U</b>  |

|             |                              |              |                       |
|-------------|------------------------------|--------------|-----------------------|
| Mitarbeiter | <b>Schneider Anika</b> (sca) | Kategorie: I | Lehrling (1. + 2. LJ) |
|-------------|------------------------------|--------------|-----------------------|

| Datum        | Leistungsbeschreibung  | Stunden     |
|--------------|--|-------------|
| 06.07.2022   | Detail Ersatz Schachtabdeckungen: Textboxenergänzen (0.25), Bei 3 Plänen Baulinie einlesen (0.75h) | 1.00        |
| 11.07.2022   | Baulinie ersetzen und neu Importieren im Installationsflächenplan                                  | 0.50        |
| 14.07.2022   | Titelblätter anpassen im 99 Ordner und einzelne PDFs abspeichern                                   | 0.75        |
| <b>Summe</b> |  | <b>2.25</b> |
