




### Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA  
Vertragnehmer: INGE EP RF-BB  
Vertrag Nr.: 000003  
Vertragsgegenstand: PV Bau und BSA  
Projektnummer: 90069  
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2022  
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Jul

Projektleiter Bauherr: Nicole Schulz  
Vertragsdatum: 22.10.2018  
Vertragslaufzeit: 01.07.18-31.01.22  
Finanzierungskonto:  
Inventarobjekt:  
Phasen, beauftragt: EK/GP - AP/MK  
Phasen, rapportiert: AP Lärm

Aktuelle Stundenausschöpfung  
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

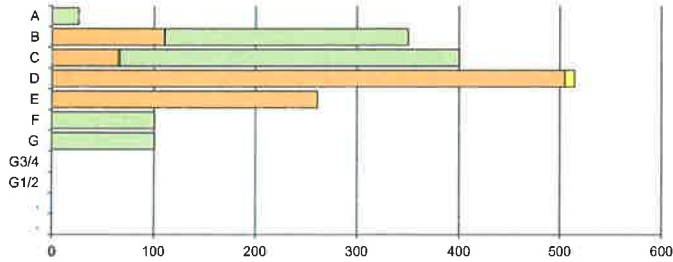

Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	25.00			25		
B	350.00	110	0.5	239.5		32%
C	400.00	64	1.5	334.5		16%
D	450.00	504.75	9.75		64.5	114%
E	125.00	261.25			136.25	209%
F	100.00			100		
G	100.00			100		
G3/4						
G1/2						
Σ	1550	940	11.75	799	200.75	61%

#### quantitative Selbststeinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbststeinschätzung 92%

#### rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach CHF 136'575  
Kosten ist CHF 80'148  
Kostenausschöpfung 58.68%  
Stundenausschöpfung 61%

Stundenabrechnung																
Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Forlin	Sandro	B	82							0.5						82.5
Methner	Raphael	B	28													28
Brauchli	Stefan	C	1													1
Grieder	Fabio	C	62						1	1.5						64.5
Abdelmoghni	Ahmed	D	2.5													2.5
Brunner	Andreas	D	446.25							9.75						456
Haberthur	Nicolas	D														
Meyer	Monitz	D	55													55
Nosdeo	Maya	D														
Prince	Surya	D														
Rothfuss	Fabian	D	1													1
Brüngger	Marco	E	41.25													41.25
Ladner	Roman	E	220													220
Russer	Elisabeth	E														
Total			939						1	11.75						951.75

Kostenabrechnung																
Ansatz (inkl. MwSt., kein Brutlohn)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total	
145.00	A															
122.00	B	13'420							61						13'481.00	
95.00	C	5'985						95	143						6'222.50	
86.00	D	43'409							839						44'247.00	
62.00	E	16'198													16'197.50	
50.00	F															
8.00	G															
6.00	G3/4															
4.00	G1/2															

# ARBEITSRAPPORT



**Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022**

---

Projekt-Nr.:	702288.2160
Bezeichnung	<b>Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA</b> <b>Projektkurzbezeichnung: EP RhFr</b> <b>Projektnummer: 090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.2160_PH 31 AP LSP
Bezeichnung	<b>EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (AP LSP)</b> <b>Projektkurzbezeichnung: EP RhFr</b> <b>Projektnummer: 090069</b> <b>Phase 31 AP LSP</b>

Mitarbeiter	<b>Forlin Sandro (SFo)</b>	Kategorie:	B353	Leitender Ingenieur(B)
-------------	----------------------------	------------	------	------------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
05.07.2022	Definieren Korrekturen (notwendige Anpassungen) Teilprojekt PV Bau, interen Besprechung	0.50

<b>Summe</b>		0.50
--------------	--	------

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022

Projekt-Nr.:	702288.0		
Bezeichnung	<b>Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA</b> <b>Projektkurzbezeichnung: EP RhFr</b> <b>Projektnummer: 090069</b>		
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 AP LSP		
Bezeichnung	<b>EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (AP LSP)</b>		
Mitarbeiter	<b>Grieder Fabio</b> (fg)	Kategorie: C253	Leitender Ingenieur
Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden	
07.07.2022	Info Projektbeteiligte betreffend Abgabetermin und -formalitäten (aus Mini PS) inkl. Erstellung Vorlage-Titelblätter	1.50	
<b>Summe</b>		1.50	

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022

Projekt-Nr.:	702288.2160
Bezeichnung	<b>Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA</b> <b>Projektkurzbezeichnung: EP RhFr</b> <b>Projektnummer: 090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.2160_PH 31 AP LSP
Bezeichnung	<b>EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (AP LSP)</b> <b>Projektkurzbezeichnung: EP RhFr</b> <b>Projektnummer: 090069</b> <b>Phase 31 AP LSP</b>

Mitarbeiter	<b>Brunner Andreas</b> (ban)	Kategorie:	D154	Ingenieur (D)
-------------	------------------------------	------------	------	---------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
05.07.2022	Prüfen der Rückmeldung der FU	2.25
06.07.2022	Rückmeldung auf Anmerkungen FU	0.50
25.07.2022	Aktualisieren / Überarbeiten NV + TB	6.25
26.07.2022	Aktualisieren / Überarbeiten NV + TB (Titelblätter & Datum)	0.75
<b>Summe</b>		<b>9.75</b>
