


Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt:	Erhaltungsprojekt N03 Rheinfelden Frick
Vertragnehmer:	Ingenieurgemeinschaft EP RF - BB
Vertrag Nr.:	
Vertragsgegenstand:	Projektverfasser Bau und BSA
Projektnummer:	
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2018
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Oktober

Projektleiter Bauherr	
Vertragsdatum:	
Vertragslaufzeit:	01.07.18 - 31.01.2022
Finanzierungskonto:	
Inventarobjekt:	
Phasen, beauftrag:	
Phasen, rapportiert:	

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

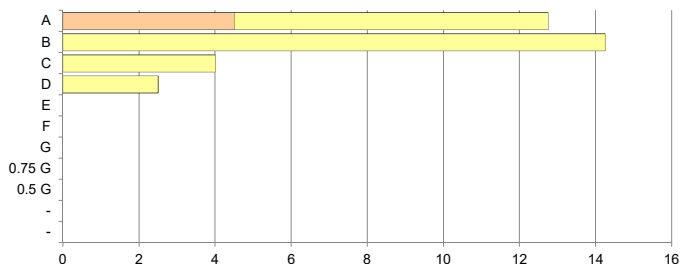

Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Ver- brauch %
A		4.5	8.25	0	12.75	0%
B		0	14.25	0	14.25	0%
C		0	4	0	4	0%
D		0	2.5	0	2.5	0%
E		0	0	0	0	0%
F		0	0	0	0	0%
G		0	0	0	0	0%
0.75 G		0	0	0	0	0%
0.5 G		0	0	0	0	0%
-		0	0	0	0	0%
-		0	0	0	0	0%
Σ	0	4.5	29	0	33.5	0%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer	
	Selbsteinschätzung

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)	
Kostendach	CHF 0
Kosten ist	CHF 4'165
Kostenausschöpfung	#DIV/0!
Stundenausschöpfung	0%

[illegible]

Kostenabrechnung															
Ansatz (exkl. MwSt., inkl. Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
150.00	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675	1'238	0	0	1'913
118.00	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1'682	0	0	1'682
94.00	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376	0	0	376
78.00	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	0	0	195
64.00	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.00	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.00	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.00	0.75 G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.00	0.5 G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	3'490.00	0.00		CHF 4'165.00
