




Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt: N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
Vertragnehmer: INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau/BSA
Projektnummer: 090069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2023
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Januar


Vertragsdatum: 14.11.2018
Vertragslaufzeit: 31.12.2022
Finanzierungskonto: Unterhalt
Inventarobjekt: FUP.2
Phasen, beauftragt: AP Bypass
Phasen, rapportiert: AP Bypass

Aktuelle Stundenausschöpfung

(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

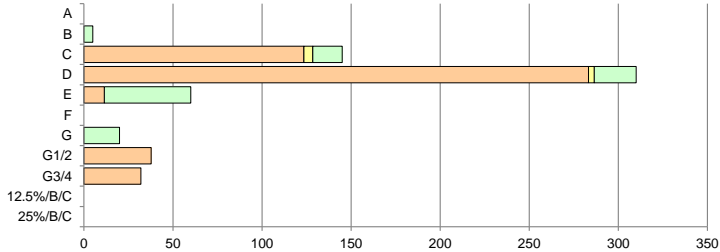

Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B	5			5		
C	145	123.5	5	16.5		89%
D	310	283.25	3.25	23.5		92%
E	60	11.5		48.5		19%
F						
G	20			20		
G1/2		37.75			37.75	
G3/4		32			32	
12.5%/B/C						
25%/B/C						
Σ	540	488	8.25	113.5	496.25	92%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung 97%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach CHF 44'925.00

Kosten ist CHF 37'903

Kostenausschöpfung 84.37%

Stundenausschöpfung 92%

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B														
	Kategorie	C														
	Kategorie	D														
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Jauslin Stebler AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B														
	Kategorie	C	123.5	5												128.5
	Kategorie	D	283.25	3.25												286.5
	Kategorie	E	11.5													11.5
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2	37.75													37.75
Leipert AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B														
	Kategorie	C														
	Kategorie	D														
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Holinger AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B														
	Kategorie	C														
	Kategorie	D														
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Total				488	8.25											496.25

Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MwSt., inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A														
CHF 122.00	B														
CHF 95.00	C	11'733	475												12'208
CHF 86.00	D	24'360	280												24'639
CHF 62.00	E	713													713
CHF 50.00	F														
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2	151													151
CHF 6.00	G3/4	192													192
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		37'148.00	754.50												CHF 37'902.50

JAUSLIN STEBLER AG
Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.01.23 bis 31.01.23
Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP Bypass

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Roth Stefan	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Forlin Sandro	B	0	122	0.00
Hartmann Peter	B	0	122	0.00
Mantinger Michael	B	0	122	0.00
Methner Raphael	B	0	122	0.00
Total	B	0		0.00
Brauchli Stefan	C	0	95	0.00
Grieder Fabio	C	3.5	95	332.50
Hunziker Livia	C	1.5	95	142.50
Name Vorname	C	0	95	0.00
Total	C	5		475.00
Abdelmoghni Ahmed	D	0.25	86	21.50
Deck Andreas	D	0	86	0.00
Dolder Silvio	D	3	86	258.00
Rothfuss Fabian	D	0	86	0.00
Seebacher Andreas	D	0	86	0.00
Meyer Moritz	D	0	86	0.00
Nyffenegger Christoph	D	0	86	0.00
Brunner Andreas	D	0	86	0.00
Boeglin Chantal	D	0	86	0.00
Total	D	3.25		279.50
Meier Karin	E	0	62	0.00
Meier Vera	E	0	62	0.00
Müller Jan	E	0	62	0.00
Brüngger Marco	E	0	62	0.00
Ladner Roman	E	0	62	0.00
Russer Elisabeth	E	0	62	0.00
Wortelboer Alexander	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Dogan Esra	F	0	50	0.00
Prescha Deliah	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Strittmatter Katja (Praktikantin)	G	0	8	0.00
Möri Anna	G	0	8	0.00
Total	G	0		0.00
Aston Tim	G3/4	0	6	0.00
Straub Vanessa	G3/4	0	6	0.00
Hegi Yannick	G3/4	0	6	0.00
Schneider Anika	G1/2	0	4	0.00
Total	G	0		0.00
Gesamttotal		8.25		754.50

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.01.2023 - 31.01.2023

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung: N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung: Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
AP Bypass

Mitarbeiter: **Grieder Fabio (fg)** Kategorie: B353 Leitender Ingenieur(B)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
04.01.2023	Sichtung Stellungnahme FU und erste Vorsortierung (Fachmandate oder IG)	0.75
06.01.2023	Abgleich im Projektteam betreffend weiterem Vorgehen und Aufbereitung Stellungnahme FU	0.75
11.01.2023	Sichtung und kommentieren Anmerkungen Abf für Vorbesprechung	0.50
19.01.2023	Abgleich mit BHU betreffend offene Frage zu Anmerkung ASTRA LV	0.50
20.01.2023	PFS T/U Akustik (Anmerkungen Abf)	0.50
24.01.2023	Kurzabgleich im Projektteam zum Stand der Arbeiten und aufbereiten Tabelle Stellungnahme für PFS T/U	0.50
Summe		3.50

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.01.2023 - 31.01.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass

Mitarbeiter	Hunziker Livia (Lgr)	Kategorie:	C354	Architekt, Ingenieur (C)
-------------	-----------------------------	------------	------	--------------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
03.01.2023	Grunderwerbstabelle anpassen mit ASTRA Parzellen	0.50
27.01.2023	Enteignungspläne und Grunderwerbstabelle anpassen	1.00
Summe		1.50

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.01.2023 - 31.01.2023

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung: N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung: Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
AP Bypass

Mitarbeiter: Abdelmoghni Ahmed (aha) Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
06.01.2023	Rückmeldung FU in der Tabelle kommentieren	0.25
Summe		0.25

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.01.2023 - 31.01.2023

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung: N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung: Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
AP Bypass

Mitarbeiter: Dolder Silvio (sdo) Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
06.01.2023	Aufarbeiten der Excel-Liste Stellungnahmen AP zur Bearbeitung durch die IG	1.00
09.01.2023	Bearbeitung Punkte 3 und 4 der Stellungnahme zum Vorabzug	0.50
17.01.2023	Bearbeitung Stellungnahme FU und Übertragen auf Sharepoint	1.00
24.01.2023	Interne Besprechung weiteres Vorgehen	0.50
Summe		3.00
