




Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt: N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
Vertragnehmer: INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau/BSA
Projektnummer: 090069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Juli


Vertragsdatum: 14.11.2018
Vertragslaufzeit: 31.12.2022
Finanzierungskonto: Unterhalt
Inventarobjekt: FUP.2
Phasen, beauftragt: Option Lärm
Phasen, rapportiert: Option Lärm

Aktuelle Stundenausschöpfung

(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

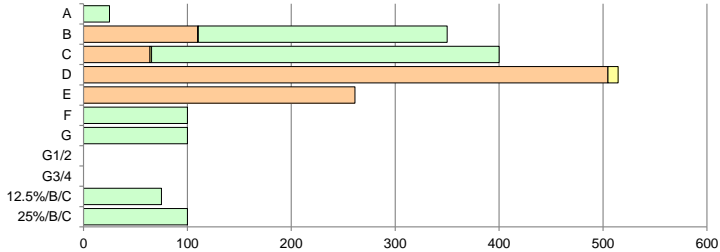

Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	25			25		
B	350	110	0.5	239.5		32%
C	400	64	1.5	334.5		16%
D	450	504.75	9.75		64.5	114%
E	125	261.25			136.25	209%
F	100			100		
G	100			100		
G1/2						
G3/4						
12.5%/B/C	75			75		
25%/B/C	100			100		
Σ	1725	940	11.75	974	951.75	55%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung 90%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach	CHF 140'304.69
Kosten ist	CHF 80'148
Kostenausschöpfung	57.12%
Stundenausschöpfung	55%

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B														
	Kategorie	C														
	Kategorie	D														
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Jauslin Stebler AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B	110													110.5
	Kategorie	C	63						1	1.5						65.5
	Kategorie	D	504.75							9.75						514.5
	Kategorie	E	261.25													261.25
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Leipert AG	Kategorie	B														
	Kategorie	C														
	Kategorie	D														
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
Holinger AG	Kategorie	B														
	Kategorie	C														
	Kategorie	D														
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
Total			939						1	11.75						951.75

Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MwSt., inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A														
CHF 122.00	B	13'420							61						13'481
CHF 95.00	C	5'985						95	143						6'223
CHF 86.00	D	43'409							839						44'247
CHF 62.00	E	16'198													16'198
CHF 50.00	F														
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2														
CHF 6.00	G3/4														
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		79'011.00						95.00	1'042.00						CHF 80'148.00

JAUSLIN STEBLER AG
Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.07.22 bis 31.07.22
Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP Lärm

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Roth Stefan	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Forlin Sandro	B	0.5	122	61.00
Hartmann Peter	B	0	122	0.00
Mantinger Michael	B	0	122	0.00
Methner Raphael	B	0	122	0.00
Total	B	0.5		61.00
Brauchli Stefan	C	0	95	0.00
Grieder Fabio	C	1.5	95	142.50
Hunziker Livia	C	0	95	0.00
Name Vorname	C	0	95	0.00
Total	C	1.5		142.50
Abdelmoghni Ahmed	D	0	86	0.00
Deck Andreas	D	0	86	0.00
Rothfuss Fabian	D	0	86	0.00
Seebacher Andreas	D	0	86	0.00
Meyer Moritz	D	0	86	0.00
Nyffenegger Christoph	D	0	86	0.00
Brunner Andreas	D	9.75	86	838.50
Boeglin Chantal	D	0	86	0.00
Total	D	9.75		838.50
Müller Jan	E	0	62	0.00
Brüngger Marco	E	0	62	0.00
Ladner Roman	E	0	62	0.00
Russer Elisabeth	E	0	62	0.00
Wortelboer Alexander	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Dogan Esra	F	0	50	0.00
Prescha Deliah	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Strittmatter Katja (Praktikantin)	G	0	8	0.00
Möri Anna	G	0	8	0.00
Total	G	0		0.00
Straub Vanessa	G3/4	0	6	0.00
Hegi Yannick	G1/2	0	4	0.00
Total	G	0		0.00
Gesamttotal		11.75		1'042.00

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022

Projekt-Nr.: 702288.2160
Bezeichnung: **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Auftrag-Nr.: 702288.2160_PH 31 AP LSP
Bezeichnung: **EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (AP LSP)**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
Phase 31 AP LSP

Mitarbeiter **Forlin Sandro (SFo)** Kategorie: B353 Leitender Ingenieur(B)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
05.07.2022	Definieren Korrekturen (notwendige Anpassungen) Teilprojekt PV Bau, interen Besprechung	0.50

Summe 0.50

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 AP LSP
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (AP LSP)

Mitarbeiter	Grieder Fabio (fg)	Kategorie: C253	Leitender Ingenieur
-------------	---------------------------	-----------------	---------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
-------	-----------------------	---------

07.07.2022	Info Projektbeteiligte betreffend Abgabetermin und -formalitäten (aus Mini PS) inkl. Erstellung Vorlage-Titelblätter	1.50
------------	---	------

Summe		1.50
--------------	--	------

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022

Projekt-Nr.:	702288.2160
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.2160_PH 31 AP LSP
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (AP LSP) Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 Phase 31 AP LSP

Mitarbeiter	Brunner Andreas (ban)	Kategorie:	D154	Ingenieur (D)
-------------	------------------------------	------------	------	---------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
05.07.2022	Prüfen der Rückmeldung der FU	2.25
06.07.2022	Rückmeldung auf Anmerkungen FU	0.50
25.07.2022	Aktualisieren / Überarbeiten NV + TB	6.25
26.07.2022	Aktualisieren / Überarbeiten NV + TB (Titelblätter & Datum)	0.75
Summe		9.75
