




Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt: **N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
Vertragnehmer: **INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG**
Vertrag Nr.: **000003**
Vertragsgegenstand: **PV Bau/BSA**
Projektnummer: **090069**
Aktuelles Beobachtungsjahr: **2022**
Beobachtungsmonat (Std. NEU): **August**


Vertragsdatum: **14.11.2018**
Vertragslaufzeit: **31.12.2022**
Finanzierungskonto: **Unterhalt**
Inventarobjekt: **FUP.2**
Phasen, beauftragt: **MK, Phase 31**
Phasen, rapportiert: **MK, Phase 31**

Aktuelle Stundenausschöpfung

(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

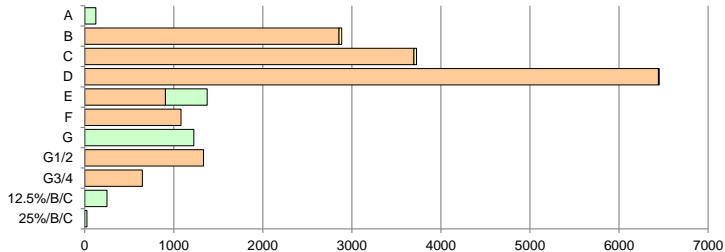

Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	125	1		124		1%
B	2250	2855.5	30.25		635.75	128%
C	3350	3696.75	28.75		375.5	111%
D	4375	6442	9.25		2076.25	147%
E	1375	906.25		468.75		66%
F	950	1081.25			131.25	114%
G	1225			1225		
G1/2		1334			1334	
G3/4		647.25			647.25	
12.5%/B/C	250			250		
25%/B/C	25			25		
Σ	13925	16964	68.25	2092.75	17032.25	122%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung **99%**

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach **CHF 1'133'743.75**

Kosten ist **CHF 1'380'406**

Kostenausschöpfung **121.76%**

Stundenausschöpfung **122%**

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B	1469.5	51.25	135	40.75	18	26.25	28.5	45	30.25					1844.5
	Kategorie	C	899.25	52	49.75	12.25	-12.25	1	8	10	3					1023
	Kategorie	D	2578	194.25	284.75	10.5	14.25	64.5	37	56.75	3.75					3243.75
	Kategorie	E	83.25													83.25
	Kategorie	F	896.25	104.25	20.75				7.5	7.25						1036
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2	1144.75						13							1157.75
Jauslin Stebler AG	Kategorie	G3/4	109.25													109.25
	Kategorie	A	1													1
	Kategorie	B	647.5	27	9.5		0.5			0.25						684.75
	Kategorie	C	2410.25	103	50.25	10.75	4	13	29.5	18.25	25.75					2664.75
	Kategorie	D	2781.25	43	63.5		2.5	3	24.25	38	5.5					2961
	Kategorie	E	769.75	19.5	19					12.5						820.75
	Kategorie	F	45.25													45.25
	Kategorie	G														
Leipert AG	Kategorie	G1/2	116.5	3.25	2				4.5	2.25						128.5
	Kategorie	G3/4	447.5	18.5	52				11	9						538
	Kategorie	B	278													278
	Kategorie	C	7													7
	Kategorie	D	192													192
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
Holinger AG	Kategorie	B	78.5													78.5
	Kategorie	C	30.75													30.75
	Kategorie	D	54.5													54.5
	Kategorie	E	2.25													2.25
	Kategorie	F														
	Kategorie	G1/2	47.75													47.75
	Kategorie	G														
	Kategorie	G3/4														
Total			15090	616	686.5	74.25	27	107.75	163.25	199.25	68.25					17032.25

Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MwSt., inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A	145													145
CHF 122.00	B	301767	9547	17629	4972	2257	3203	3477	5521	3691					352062
CHF 95.00	C	317989	14725	9500	2185	-784	1330	3563	2684	2731					353923
CHF 86.00	D	482095	20404	29950	903	1441	5805	5268	8149	796					554808
CHF 62.00	E	53026	1209	1178					775						56188
CHF 50.00	F	47075	5213	1038				375	363						54063
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2	5236	13	8				70	9						5336
CHF 6.00	G3/4	3341	111	312				66	54						3884
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		1210672.25	51220.50	59614.00	8059.50	2913.75	10337.50	12818.00	17553.25	7217.25					CHF 1'380'406.00

Aegerter & Bosshardt AG**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.08.2022 bis 31.08.2022****Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Projektleitung (MK)**

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
--	A	0	145	0.00
--	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Falzone Lorenzo	B	0	122	0.00
Fuchs Christian	B	10.5	122	1'281.00
Schädler Beat	B	0	122	0.00
Spieler Daniel	B	0	122	0.00
Total	B	10.5		1'281.00
Nef Regula	D	0	86	0.00
Martin Noëlle	D	0	86	0.00
Total	D	0		0.00
Gesamttotal		10.5		1'281.00

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.08.2022 bis 31.08.2022

Mandant Name	AeBo	1000		
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	100	Projektleitung	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9890 EP RF-BB

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Fuchs Christian	B	10.50	122.00	1'281.00
Total PLA 100.Projektleitung		10.50	122.00	1'281.00

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.08.2022 bis 31.08.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	100	Projektleitung	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Christian Fuchs

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
100	13.08.2022	Mailkorrespondenz nach Ferien aufarbeiten	0.50
100	15.08.2022	Mailkorrespondenz intern, Debriefing nach Ferien	0.25
100	16.08.2022	Telefonat mit F. Grieder: aktueller Stand Arbeiten, Sitzungsvorbereitung Mini-PS; Prüfen der KV -Vorgaben (Spielregeln); Abgleich zum Stand Lieferungen Berichte Verkehrsingenieur; Mails hierzu; Prüfen / Antwortvorschläge zu Stellungnahmen für AP SABA Mumpf	3.00
100	17.08.2022	Bemerkungen von D. Martin zu Stellungnahme AP SABA Mumpf besprechen, Mails von A. Kaufmann /O. Drengemann sichten und intern weitergeben	0.75
100	18.08.2022	Diverse Mails INGE-intern zu Dossierabgabe, Mailkorrespondenz zu weiteren Berichten durch AKP, Vorinfo an Beteiligte; Telefonat mit F. Grieder (Arbeitsstand, Vorbereitung Mini-PS)	0.50
100	19.08.2022	Sitzungsteilnahme, Vor- und Nachbereitung der Mini PS; interne Termine mit Team setzen (Nachverfolgung Abgabe)	2.75
100	22.08.2022	Besprechen der Überarbeitung Dossiers mit D. Spieler und D. Martin, Vorgehen für Produktion und Abgabe festlegen	0.75
100	23.08.2022	Absprache Dossier-Erstellung mit F. Grieder und D. Spieler	1.00
100	31.08.2022	Abklärungen mit AKP, Besprechen Anpassungen in Synthesedossier (Präzisierungen) mit D. Spieler	1.00
Subtotal			10.50

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:


 08.09.2022

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.08.2022 bis 31.08.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	100	Projektleitung	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter		Stunden
FCh	Christian Fuchs	10.50
Aktivität		Stunden
100	Projektleitung	10.50
Total		10.50

Aegerter & Bosshardt AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.08.2022 bis 31.08.2022

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Massnahmenkonzept

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
--	A	0	145	0.00
--	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Beck Peter	B	0	122	0.00
Falzone Lorenzo	B	0	122	0.00
Häner David	B	0	122	0.00
Fuchs Christian	B	0	122	0.00
Niedermeyer Friederike	B	0	122	0.00
Ruff Ute	B	0	122	0.00
Schädler Beat	B	0	122	0.00
Spieler Daniel	B	19.75	122	2'409.50
Weber Madeleine	B	0	122	0.00
Total	B	19.75		2'409.50
Brem Jakob	C	0	95	0.00
Chroust Steffi	C	0	95	0.00
Kern Etienne	C	0	95	0.00
Martin Dirk	C	3	95	285.00
Mendoza Maria	C	0	95	0.00
Yelman Mahir	C	0	95	0.00
Wieland Manuel	C	0	95	0.00
Total	C	3		285.00
Hardmeyer Christian	D	0	86	0.00
Delmas Marc	D	0	86	0.00
Beuret Agnès	D	0	86	0.00
Chrysopoulos Viktorria	D	3.75	86	322.50
Fischer Michel	D	0	86	0.00
Lüthi Tobias	D	0	86	0.00
Meier Lukas	D	0	86	0.00
Moser Tobias	D	0	86	0.00
Meyer Ramona	D	0	86	0.00
Nicolosi Lucia	D	0	86	0.00
Schaub Anja	D	0	86	0.00
Schneider Martin	D	0	86	0.00
Nef Regula	D	0	86	0.00
Martin (Weider) Noëlle	D	0	86	0.00
Total	D	3.75		322.50
Schär Cédric	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Boser Florian	F	0	50	0.00
Boschung Jan	F	0	50	0.00
Christ Florian	F	0	50	0.00
Karabasoglu Emre	F	0	50	0.00
Schär Raphaël	F	0	50	0.00
Schmidlin Julian	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Bätscher Basil	G 1/2	0	4	0.00
Rizzo Arianna	G 1/2	0	4	0.00
Wagner Mika	G 1/2	0	4	0.00
Honegger Mark	G 1/2	0	4	0.00
Zimmermann Alec	G 1/2	0	4	0.00
Total	G 1/2	0		0.00
Krenger Kyara	G 3/4	0	6	0.00
Weber Fabian	G 3/4	0	6	0.00
Davet Kilian	G 3/4	0	6	0.00
Manz Selena	G 3/4	0	6	0.00
Total	G 3/4	0		0.00
Gesamttotal		26.5		3'017.00

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.08.2022 bis 31.08.2022

Mandant Name	AeBo	1000			
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt			
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs	
PLA	310	MK, FB T-U	PLA Leiter	Christian Fuchs	
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen			
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9890 EP RF-BB	

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Spieler Daniel	B	19.75	122.00	2'409.50
Martin Dirk	C	3.00	95.00	285.00
Total PLA 310.MK, FB T-U		22.75	118.44	2'694.50

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.08.2022 bis 31.08.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	310	MK, FB T-U	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Dirk Martin

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
310	02.08.2022	GWSZ Neumatt: Beurteilung Dichtheitsprüfung inkl. Abklärungen Normen und Neubewertung Atteste, Abklärungen R. Brodmann	1.00
310	03.08.2022	GWSZ Neumatt: Beurteilung Dichtheitsprüfung, Neubewertung Atteste und Übersichtsplan	2.00
Subtotal			3.00

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:


 08.09.2021

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.08.2022 bis 31.08.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	310	MK, FB T-U	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Daniel Spieler


Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
310	23.08.2022	Schlusskontrolle Pläne und Bericht für Papierdruck für Trasse/Umwelt und Kunstbauten, Korrex an Zeichner bei Situationen Entwässerung Konzept für GWS-Bereiche Au, Kernteambesprechung mit C. Fuch und F. Grieder betreff Fertigstellungsarbeiten wer macht was, Koordination plotten Pläne und drucken Bericht, Abklärungen mit Repro-Team, Inhaltsverzeichnis angepasst für T/U, Unterlagen für Druck und Plot zusammengestellt und hochgeladen	9.00
310	29.08.2022	Schlusskontrolle Unterlagen Lärmschutz und Strassenbau, Bearbeitung TB in den Abschnitten KV und Termine, Bericht zusammengestellt für Druck Inkl. Beilagen geprüft und für Bericht aufgearbeitet, Unterlagen für Druck und Plot bereitgestellt und hochgeladen, Besprechung mit S. Herzog (Fa. Leipert) betreff Abgabe der BSA-Unterlagen	3.50
310	30.08.2022	Prüfung und Bearbeitung Synthesebericht, Zusammenstellen der einzelnen TP1 bis TP3 Kosten und Anpassungen im Synthesebericht (inkl. BHU und Fachexperten), Abklärungen Kosten mit F. Grieder (JSAG), Bearbeitung Dokument S2 Identitätskarte, Zusammenstellen und Prüfung der T/G Dokument auf Vollständigkeit für Stick, Bearbeitung Inhaltsverzeichnis, Unterlagen für Druck und Plot zusammengestellt und hochgeladen	4.50
310	31.08.2022	Abklärung mit S. Herzog (Leipert) und Kostenzusammenstellung BSA MK für Synthesebericht und Identitätskarte, Überarbeitung Inhaltsverzeichnisse T/U und K und Abstimmung auf Inhalt der Boxen	2.75
Subtotal			19.75

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:


 08.09.2022

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.08.2022 bis 31.08.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	310	MK, FB T-U	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter		Stunden
MD	Dirk Martin	3.00
SD	Daniel Spieler	19.75
Aktivität		Stunden
310	MK, FB T-U	22.75
Total		22.75

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.08.2022 bis 31.08.2022

Mandant Name	AeBo	1000			
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt			
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs	
PLA	320	MK, FB K	PLA Leiter	Christian Fuchs	
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen			
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9890 EP RF-BB	

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Chrysopoulos Viktoria	D	3.75	86.00	322.50
Total PLA 320.MK, FB K		3.75	86.00	322.50

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.08.2022 bis 31.08.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	320	MK, FB K	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Viktoria Chrysopoulos

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
320	30.08.2022	Div. Absprachen Investitionskosten inkl. Nachbearbeitung	1.00
320	31.08.2022	Bereinigung K6 KV, Inhaltsverzeichnis & Gesamt-KV inkl. Korrespondenz INGE	2.75
Subtotal			3.75

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:


 08.09.2022

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.08.2022 bis 31.08.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	320	MK, FB K	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter		Stunden
ChV	Viktoria Chrysopoulos	3.75
Aktivität		Stunden
320	MK, FB K	3.75
Total		3.75

JAUSLIN STEBLER AG
Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.08.22 bis 31.08.22
Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Massnahmenkonzept

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Roth Stefan	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Forlin Sandro	B	0	122	0.00
Hartmann Peter	B	0	122	0.00
Mantinger Michael	B	0	122	0.00
Methner Raphael	B	0	122	0.00
Total	B	0		0.00
Brauchli Stefan	C	9.5	95	902.50
Grieder Fabio	C	16.25	95	1'543.75
Hunziker Livia	C	0	95	0.00
Stocker Thomas	C	0	95	0.00
Total	C	25.75		2'446.25
Abdelmoghni Ahmed	D	0.5	86	43.00
Deck Andreas	D	0	86	0.00
Dolder Silvio	D	0	86	0.00
Rothfuss Fabian	D	0	86	0.00
Haberthür Nicolas	D	0	86	0.00
Seebacher Andreas	D	3.5	86	301.00
Meyer Moritz	D	0	86	0.00
Nosdeo Maya	D	1.5	86	129.00
Nyffenegger Christoph	D	0	86	0.00
Brunner Andreas	D	0	86	0.00
Boeglin Chantal	D	0	86	0.00
Total	D	5.5		473.00
Müller Jan	E	0	62	0.00
Brüngger Marco	E	0	62	0.00
Ladner Roman	E	0	62	0.00
Russer Elisabeth	E	0	62	0.00
Wortelboer Alexander	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Dogan Esra	F	0	50	0.00
Köchli Pascal	F	0	50	0.00
Prescha Deliah	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Strittmatter Katja (Praktikantin)	G	0	8	0.00
Möri Anna	G	0	8	0.00
Total	G	0		0.00
Aston Tim	G3/4	0	6	0.00
Gloor Leoni	G3/4	0	6	0.00
Straub Vanessa	G3/4	0	6	0.00
Schreiber Severin	G3/4	0	6	0.00
Hegi Yannick	G3/4	0	6	0.00
Total	G	0		0.00
Schneider Anika	G1/2	0	4	0.00
Total	G	0		0.00
Gesamttotal		31.25		2'919.25

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.08.2022 - 31.08.2022

Projekt-Nr.: 702288.2160
Bezeichnung: **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.: 702288.2160_PH 31 T-G
Bezeichnung: **EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-G**

Mitarbeiter: **Brauchli Stefan (bsn)** Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
16.08.2022	Durchlesen/Analysieren Bericht Senkungsmulde, Besprechung Fazit mit S. Forlin, Zusammenfassung in Email	4.25
23.08.2022	Ergänzung KV T/G mit Kosten für BHU und Projektierung/BL, Übertrag in Gesamt KV	2.75
30.08.2022	Ergänzung KV T/G mit kompletter Übersichtsseite (alle Konten inkl. "Nuller"), Versand an INGE-Partner, upload auf Sharepoint	1.75
31.08.2022	Organisation Ausdruck Abgabedossier, Instruktion Assistentin	0.75
Summe		9.50

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.08.2022 - 31.08.2022

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung: **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Auftrag-Nr.: 702288.0_PH 31 PL
Bezeichnung: **EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) PL**

Mitarbeiter: **Grieder Fabio (fg)** Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
09.08.2022	Zusammenstellen und organisieren native KVs inkl. Versand an BHU; kurze Koordination mit M. Lüthi betreffend Termin PS Bau	1.00
15.08.2022	Koordination mit C. Fuchs betreffend Vorbesprechung Mini PS und Abgleich offene Punkte zur Dossierabgabe; Anfrage bei S. Forlin betreffend Rückmeldung Erkenntnisse geologischer Bericht Senkungsmulde	1.75
16.08.2022	Abgleich mit C. Fuchs betreffend Mini PS Bau (Traktanden, offene Punkte), ÜK Gesamt-KV, Termine und Kommunikation IG-intern	1.50
18.08.2022	Vorbereitung Mini PS Bau (ÜK Gesamt-KV, Prüfung Termsituation)	0.50
19.08.2022	Mini PS Bau inkl. Vor- und Nachbereitung; Info INGE betreffend Umgang mit ÜK und Preisbasis	2.50
23.08.2022	Abgleich mit BHU betreffend ÜK inkl. anschliessende Information der IG; IG-interne PL-Absprache betreffend Zuständigkeiten Dossiererstellung	2.00
24.08.2022	Zusammenstellen übergeordnete Angaben für Dossierabgabe und Versand an IG	0.75
Summe		10.00

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.08.2022 - 31.08.2022

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung: **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH 31 T-U
Bezeichnung: **EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U**

Mitarbeiter: **Grieder Fabio** (fg) Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
08.08.2022	Koordination mit A. Seebacher und A. Abdelmoghni betreffend Ergänzungen T-U Dossier aufgrund Rückmeldungen PV BSA; Ergänzung Gesamt-KV mit Zahlen vom PV BSA	1.50
24.08.2022	Koordination mit D. Spieler betreffend div. Punkten zur Dossierabgabe; Kurzbesprechung mit A. Seebacher betreffend Ergänzung KV T/U	1.00
25.08.2022	Koordination mit A. Seebacher betreffend Zusammenstellen überarbeitete Dokumente T/U für Dossierabgabe und Ergänzung KV T/U mit übergeordneten Kosten	1.00
29.08.2022	Unterstützung Erstellung Papierdossiers inkl. Kontrolle und Abgleich mit D. Spieler	1.75
30.08.2022	Schlusskontrolle Papierdossiers inkl. Koordination für Verarbeitung mit D. Spieler	1.00

Summe

6.25

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.08.2022 - 31.08.2022

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 T-U
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U

Mitarbeiter	Abdelmoghni Ahmed (aha)	Kategorie:	D154	Ingenieur (D)
-------------	--------------------------------	------------	------	---------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
25.08.2022	Prüfung KV-Bericht und Abgleich mit A. Seebacher	0.50

Summe		0.50
--------------	--	------

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.08.2022 - 31.08.2022

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung: **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH 31 T-U
Bezeichnung: **EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U**

Mitarbeiter: **Seebacher Andreas** (san) Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
25.08.2022	KV: Einarbeiten in allen 6 IO und in Bericht, Erarbeiten eigenen Kontenplan T/U Gesamt inkl. Rückmeldung an IG zu aktuelle Kosten; Textbaustein KV: Liefern IG inkl. Text überdeckte BSA Schächte im GS bei NRS	3.50

Summe

3.50

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.08.2022 - 31.08.2022

Projekt-Nr.:	702288.2160
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.2160_PH 31 T-G
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-G

Mitarbeiter	Nosdeo Maya (mn)	Kategorie:	D375	Kaufm.- /Sekretariatspers.(D)
-------------	-------------------------	------------	------	----------------------------------

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
31.08.2022	Vorbereiten / Erstellen Berichtdokumente für Abgabe MK T-G	1.50
Summe		1.50
