




Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt: N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
Vertragnehmer: INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau/BSA
Projektnummer: 090069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2023
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Januar


Vertragsdatum: 14.11.2018
Vertragslaufzeit: 31.12.2022
Finanzierungskonto: Unterhalt
Inventarobjekt: FUP.2
Phasen, beauftragt: GHGW
Phasen, rapportiert: GHGW

Aktuelle Stundenausschöpfung

(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

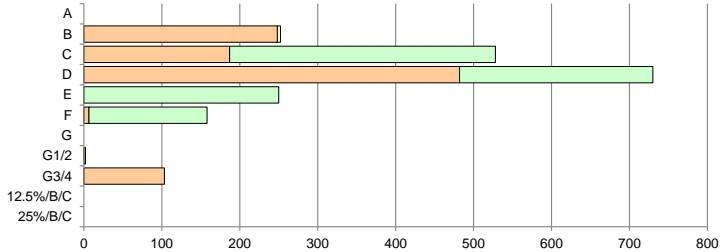

Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A		248.25	4	341		
B	130	248.25			122.25	194%
C	528	187		341		35%
D	730	482		248		66%
E	250			250		
F	158	6.5		151.5		4%
G						
G1/2		2			2	
G3/4		103.25			103.25	
12.5%/B/C						
25%/B/C						
Σ	1796	1029	4	990.5	1033	58%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung 90%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach CHF 152'200.00

Kosten ist CHF 90'944

Kostenausschöpfung 59.75%

Stundenausschöpfung 58%

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B	2													2
	Kategorie	C	7.25													7.25
	Kategorie	D	38.75													38.75
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Jauslin Stebler AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B	0.25													0.25
	Kategorie	C	132.75													132.75
	Kategorie	D	436.5													436.5
	Kategorie	E														
	Kategorie	F	6.5													6.5
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2	2													2
Leipert AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B	246	4												250
	Kategorie	C	47													47
	Kategorie	D	6.75													6.75
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Holinger AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B														
	Kategorie	C														
	Kategorie	D														
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Total				1029	4											1033

Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MwSt., inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A														
CHF 122.00	B	30'287	488												30'775
CHF 95.00	C	17'765													17'765
CHF 86.00	D	41'452													41'452
CHF 62.00	E														
CHF 50.00	F	325													325
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2	8													8
CHF 6.00	G3/4	620													620
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		90'456.00	488.00												CHF 90'944.00

Leipert AG**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.01.2023 bis 31.01.2023****Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, GHGW**

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Name Vorname	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Leipert Markus	B	4	122	488.00
Herzog Stefan	B	0	122	0.00
Riderle Timo	B	0	122	0.00
Total	B	4		488.00
Mozzillo Sergio	C	0	95	0.00
Weisskopf Silvan	C	0	95	0.00
Hofer Michael	C	0	95	0.00
Lazzarato Roberto	C	0	95	0.00
Total	C	0		0.00
Gassmann Silvia	D	0	86	0.00
Hofer Michael	D	0	86	0.00
Total	D	0		0.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Gesamttotal		4		488.00



Leipert AG

ELEKTROPLANUNG/-BAULEITUNG

Name: Leipert	Vorname: Markus	Monat: Januar	Jahr: 2023	Kategorie: B	Kostenart
Auftraggeber: INGE EP RF BB				Vertrags- oder Bestellnummer:	
Auftragsnummer: 327.2					
Bezeichnung: N03 EP Rheinfelden - Frick, GHGW (MK)					

Tag	Stunden	Nacht	Sonntag	Tätigkeitsbeschreibung
	100%	25.0%	50.0%	
1				
2				
3				
4				
5	2.00			Interne Bespr. der Rückm FU, Durchsicht Rückm FU, Überlegungen zum Bereinigungsverfahren, Anfrage Fut bearbeitet
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	1.00			Rückm. zu Stellungnahme, Abkl. mit VI
13				
14				
15				
16				
17				
18	1.00			Interne Bespr. betr. MK/AP-Anpassungen
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
Total	4.00	0.00	0.00	

MA:

PL:
