


### **Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)**

Projekt:	EP Sissach - Eptingen
Vertragnehmer:	INGE EPSI, c/o Jauslin+Stebler AG
Vertrag Nr.:	070017/000025
Vertragsgegenstand:	Submission TP3 Kunstbauten
Vertragsteil:	gesamte Std. gemäss Vertrag + NO10 + NO11
aktuelles Beobachtungsjahr:	2020
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Juli


**aktuelle Stundenausschöpfung**

(Std. bisher/ Std. neu/ Std. Rest gem. Tabelle rechts)

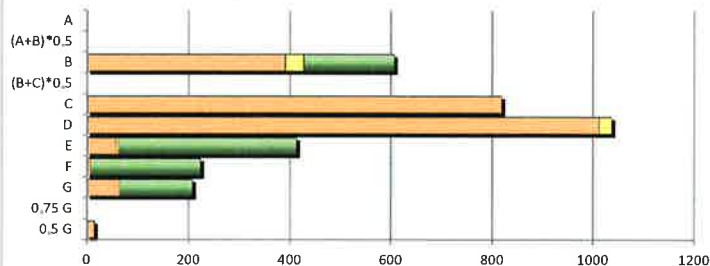

Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	0	0	0	0	0	0%
(A+B)*0,5	0	0	0	0	0	0%
B	607	390.25	36.75	180	0	70%
(B+C)*0,5	0	0	0	0	0	0%
C	413	819	0	0	406	198%
D	805	1012.75	24.5	0	232.25	129%
E	413	56.75	4.75	351.5	0	15%
F	224	6.75	0	217.25	0	3%
G	208	63.75	0	144.25	0	31%
0.75 G	0	0	0	0	0	0%
0.5 G	0	14.75	0	0	14.75	0%
<b>Σ</b>	2670	2364	66	0	2430	91%

## Gesamtübersicht



quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer		
	Selbsteinschätzung	86%
qualitative Auswertungen (exkl. MWSt, inkl. Rabatt)		
	Kostendach	SFr. 265'909.00
	Kosten ist	SFr. 267'912.00
	Kostenausschöpfung	101%
	Stundenausschöpfung	91%

[illegible]

Kostenabrechnung															
Ansatz (nach Maßstab (2020))	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Ok¹	Nov	Dez	Total
SFr. 150,00	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SFr. 145,00	(A+B)*0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SFr. 140,00	B	42'595	6'545	2'975	840	280	490	910	5'145	0	0	0	0	0	59'780
SFr. 129,00	(B+C)*0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SFr. 118,00	C	86'022	5'605	3'009	1'888	0	118	0	0	0	0	0	0	0	96'642
SFr. 100,00	D	88'400	1'150	6'650	3'675	375	825	200	2'450	0	0	0	0	0	103'725
SFr. 75,00	E	4'069	94	75	19	0	0	0	356	0	0	0	0	0	4'613
SFr. 60,00	F	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405
SFr. 35,00	G	1'884	0	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2'251
SFr. 35,00	0,75 G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SFr. 35,00	0,5 G	0	0	0	0	0	0	516	0	0	0	0	0	0	516
Total		223'355	13'394	13'077	6'422	655	1'433	1'826	7'851	0	0	0	0	0	SFr. 267'991

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.07.2020 bis 31.07.2020


<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
<b>Projekt</b>	BS.N.09246	ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen	<b>Projektleiter</b>	Lorenzo Falzone
<b>PLA</b>	100	ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen, Projektleitung	<b>PLA Leiter</b>	Lorenzo Falzone
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	<b>Projektleiter Auftraggeber</b>	S. Roth / J + S AG
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Vertragsnummer extern</b>	070017/000025

Mitarbeiter: Peter Beck

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
100	20.07.2020	Rückmeldung und Kommentar zu Konzept Befahrung Si-Ep, inkl Datenkatalog, -erfassung, -austausch	2.00
<b>Subtotal</b>			<b>2.00</b>


Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:

  
 6.8.20

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

  
 5.8.20

## Zuweisung Projektleitung Phase 41

TP1 (44%): ..... 1.0 .....  
 TP2 (22%): ..... 0.25 .....  
 TP3 (34%): ..... 0.75 .....  
 Total: ..... 2.00 .....

## Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.07.2020 bis 31.07.2020

<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
<b>Projekt</b>	BS.N.09246	ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen	<b>Projektleiter</b>	Lorenzo Falzone
<b>PLA</b>	100	ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen, Projektleitung	<b>PLA Leiter</b>	Lorenzo Falzone
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	<b>Projektleiter Auftraggeber</b>	S. Roth / J + S AG
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Vertragsnummer extern</b>	070017/000025

Mitarbeiter: Lorenzo Falzone

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
100	06.07.2020	Arbeiten am Projekt, Erstellen von Projektunterlagen WTQ	10.25
100	07.07.2020	Arbeiten am Projekt, Erstellen von Projektunterlagen WTQ	5.75
100	08.07.2020	Arbeiten am Projekt, Erstellen von Projektunterlagen WTQ	1.00
100	09.07.2020	Arbeiten am Projekt, Erstellen von Projektunterlagen WTQ	4.00
100	13.07.2020	Arbeiten am Projekt, Erstellen von Projektunterlagen, Analyse PEP Phase 52	1.00
100	20.07.2020	Prüfung Konzept MLS-Aufnahmen	3.00
100	21.07.2020	Prüfung Konzept MLS-Aufnahmen Arbeiten an Submissionsauswertung Arbeiten an Studie WTQ	3.50
100	22.07.2020	Arbeiten an Submissionsauswertung Arbeiten an Studie WTQ	6.75
100	23.07.2020	Arbeiten an Submissionsauswertung Preisanalysen	7.75
100	24.07.2020	Arbeiten an Submissionsauswertung	6.50
100	27.07.2020	Arbeiten am Projekt. Auswertung Submission Baumeister	7.25
100	28.07.2020	Arbeiten am Projekt. Auswertung Submission Baumeister	1.00
100	29.07.2020	Arbeiten am Projekt. Auswertung Submission Baumeister	9.00
100	30.07.2020	Arbeiten am Projekt. Auswertung Submission Baumeister	7.00
100	31.07.2020	Arbeiten am Projekt. Auswertung Submission Baumeister	4.25
<b>Subtotal</b>			<b>78.00</b>

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:

5.8.20

## Zuweisung Projektleitung Phase 41

TP1 (44%): 34.5  
 TP2 (22%): 17.0  
 TP3 (34%): 26.5  
 Total: 78.0

## Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 701323.3003 Periode 01.07.2020 - 31.07.2020  
Bezeichnung **N02 EP Sissach - Eptingen TP3 Kunstbauten**  
**Phase: Pläne für die Ausführung**

Mitarbeiter Forlin Sandro (SFo) Kategorie: B353 Leitender Ingenieur(B)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
24.07.2020	Projektleitung: Wiederaufnahme der Arbeiten; Aufwandschätzung Pläne für die Ausführung (1. Entwurf Planliste); Stellungnahme zu Datenkatalog Befahrung	8.50
29.07.2020	Projektleitung Bereinigung Aufwandschätzung Unterlagen für die Ausführung Teil Brücken / UNF / UEF Teil JS - K	1.00
<b>Summe</b>		<b>9.50</b>



## Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag:	701323.4002	Periode	01.07.2020 - 31.07.2020
Bezeichnung	<b>N02 EP Sissach - Eptingen - Projektleitung Phase 41</b>		
Mitarbeiter	Boeglin Chantal (cd)	Kategorie:	D375 Kaufm./Sekretariatspers.(D)
Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden	
27.07.2020	Unterstützung Datenbaufbereitung für Bewertung	0.50	
30.07.2020	Zusammenstellen Texte für Bewertung	1.00	
<b>Summe</b>		<b>1.50</b>	

*C. Boeglin*

### Zuweisung Projektleitung Phase 41

TP1 (44%): ..... 0.75 .....

TP2 (22%): ..... 0.25 .....

TP3 (34%): ..... 0.50 .....

Total: ..... 1.50 .....

*[Signature]*

## Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 701323.3002 Periode 01.07.2020 - 31.07.2020  
Bezeichnung **N02 EP Sissach - Eptingen TP3 Kunstbauten**  
**Phase 41**

Mitarbeiter Grieder Fabio (fg) Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
21.07.2020	Koreferat Konzept Vermessung inkl. Abgleich diverser Inputs mit M. Malfatti	0.50
<b>Summe</b>		<b>0.50</b>



## Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 701323.4002 Periode 01.07.2020 - 31.07.2020  
Bezeichnung **N02 EP Sissach - Eptingen - Projektleitung  
Phase 41**

Mitarbeiter Malfatti Marco (mma) Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
16.07.2020	Erhalt physische Offerten Baumeister.	1.00
17.07.2020	Sichtung und Ablage Offerten. Interne Info an St. Roth und M. Palumbo.	3.50
20.07.2020	Vollständigkeitsprüfung und Durchsicht Offerten. Sichten diverse Infos und Vorlagen von J. Merian. Vorbereitung Ablage. Prüfung Vermessungskonzept.	6.00
21.07.2020	Prüfung Vermessungskonzept und Zusammentragen div. Punkte inkl. interner Abklärung. Durchsicht und Ablage Offerten. Vorbereitung Evaluationsablauf.	3.00
22.07.2020	Koord. Absage PS. INGE interne Zustellung der Offerten. Mitteilung mit Info zu Konzept Vermessungsaufnahmen. Vorbereitung Zuständigkeitsverteilung INGE-intern. Prüfung Termine und Abgleich mit Ausschreibungsplan.	3.75
23.07.2020	Einlesen Angebotespreise. Erstellung Vergleich je Heft. INGE-Koordination bzgl. Terminen und Zuständigkeiten inkl. Abgleich mit L. Falzone. Vorbereitung Dok. formelle Prüfung. Kenntnisnahme Auswertung Preisanalysen.	4.50
24.07.2020	Abklärung Termine und Vorgehen Evaluation mit J. Merian. Vorbereitung projektspezifische Evaluationstabelle zuhanden Inge. Info mit Terminen und Zuständigkeiten an Inge. Erstellung Übersicht Preisvergleiche für alle Hefte und Inge-interne Verteilung. Zustimmung Liste für Vermessung. Interne Abstimmung (St. Roth, M. Palumbo) für Evaluation.	7.50
26.07.2020	Prüfung Vollständigkeit und Eignungskriterien Offerten Baumeister. Bearbeitung Tabellen formelle Prüfungen. Erste Sichtung der Unterlagen. Zustellung Unterlagen PNP/Henz zur Evaluation. Info an Falzone mit Bemerkungen aus formeller Prüfung und Aufteilung Pendenzen. Verifizierung Budget mit Aufwandsschätzung Trasse Phase 51. Vorbereitung Arbeiten Phase 51.	8.50
27.07.2020	Abklärung und Angaben Perimeter Vermessung an Cantaluppi. Erhalt Infos Ph. Noordam zu ZK3.1 und Rückfrage. Abklärung Messerli ausgabe mit Th. Stocker. Erstellung Detailevaluationstabelle.	5.50
28.07.2020	Beauftragung A. Merz mit Zusammenzug Heft-Preise. Anfrage zu Inhalt TB an M. Palumbo. Evaluation technische Berichte. Überprüfung Annahmen Implenla (TB).	4.75
29.07.2020	Evaluation Offerten: TB und Bauprogramme. Einarbeitung Rückmeldung Ph. Noordam und Erstellung Tabelle zur Berechnung Dauer der Arbeiten. Abspache mit M. Palumbo.	5.50
30.07.2020	Bewertung Offerte. Evaluation Bauprogramme. Abklärung Details mit M. Palumbo. Einarbeitung Inputs AeBo.	7.50



## Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 701323.4002 Periode 01.07.2020 - 31.07.2020  
Bezeichnung **N02 EP Sissach - Eptingen - Projektleitung Phase 41**

Mitarbeiter Malfatti Marco (mma) Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
	Instruktionen an A.Merz zur rechnerischen Kontrolle von Preisen (Summe aller Hefte). Abklärung zu Bauzeit mit St. Roth. Info zu Skala Evaluatoin an R. Henz.	
31.07.2020	Besprechung Stand Auswertung Offerten mit L. Falzone. Zusammenstellung Detailevaluation JS-AeBo. Detailevaluation und Überarbeitung Bauprogramme. Info an Jürg Merian mit Stand der Arbeiten (ZK2 und formelle Prüfung)	5.75
<b>Summe</b>		<b>66.75</b>



### Zuweisung Projektleitung Phase 41

TP1 (44%): ..... 29.50 .....  
TP2 (22%): ..... 14.25 .....  
TP3 (34%): ..... 22.75 .....  
Total: ..... 66.75 .....





## Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 701323.4002 Periode 01.07.2020 - 31.07.2020  
Bezeichnung N02 EP Sissach - Eptingen - Projektleitung  
Phase 41

Mitarbeiter Merz Andreas (mrz) Kategorie: D375 Kaufm.-/Sekretariatspers.(D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
28.07.2020	Offerten A-D rechnerische Kontrolle aller Hefte Zuarbeit M. Malfatti	1.00
30.07.2020	Offerten A-D rechnerische Kontrolle aller Hefte im MesserliBAUAD Zuarbeit M. Malfatti	0.75
31.07.2020	Offertenkontrolle Bauprogramm Zuarbeit M. Malfatti	0.50
<b>Summe</b>		<b>2.25</b>



### Zuweisung Projektleitung Phase 41

TP1 (44%): ..... 1.00 .....  
TP2 (22%): ..... 0.50 .....  
TP3 (34%): ..... 0.75 .....  
Total: ..... 2.25 .....




## Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 701323.3002 Periode 01.07.2020 - 31.07.2020  
Bezeichnung **N02 EP Sissach - Eptingen TP3 Kunstbauten**  
**Phase 41**

Mitarbeiter Brüngger Marco (mbr) Kategorie: E356 Zeichner(E)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
01.07.2020	EpSi Stand Grundlage Submission auf A3 drucken, Ordnerstruktur erstellen	3.25
<b>Summe</b>		<b>3.25</b>



## Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 701323.4002 Periode 01.07.2020 - 31.07.2020  
Bezeichnung N02 EP Sissach - Eptingen - Projektleitung  
Phase 41

Mitarbeiter Russer Elisabeth (eru) Kategorie: E376 Kaufm./Sekretariatspers.(E)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
24.07.2020	Angebotsordner für M. Malfatti/Palumbo zusammenstellen	3.50
27.07.2020	Pläne für Abgabe Dossiers für M. Malfatti zusammenstellen	0.75
<b>Summe</b>		<b>4.25</b>



### Zuweisung Projektleitung Phase 41

TP1 (44%): 2.0  
TP2 (22%): 0.75  
TP3 (34%): 1.5  
Total: 4.25

