

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Muttenz 1 02.12.2022
Projektleiter Grieder Fabio
Ihre Referenz

Unsere Referenz 702288.0
MwSt.-Nr. CHE-459.227.258 MWST

N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069

Rechnung Nr. 70023967

Periode 01.10.2022 - 30.11.2022

Leistungsbeschreibung:
Rechnung 11_AP I+LE

Eigene Leistungen	1'707.25
MWST 7.70 % von 1'707.25	<u>131.46</u>
Total Gesamtbetrag inkl. MWST	<u>1'838.71</u>

Alle Beträge in CHF
Zahlbar innert 30 Tage netto
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:
- Einzahlungsschein
- Rapporte

Detailbeleg Auftrag 702288.0_PH31_AP_IF + LE Installationensflächen und Landerwerb

Eigene Leistungen


Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202211	Grieder Fabio	7.50	95.00	712.50
202211	Hunziker Livia	6.25	95.00	593.75
Stundenleistung	C354 Architekt, Ingenieur (C)	13.75		1'306.25
202211	Dolder Silvio	4.50	86.00	387.00
Stundenleistung	D154 Ingenieur (D)	4.50		387.00
202211	Schneider Anika	3.50	4.00	14.00
Stundenleistung	I Lehrling (1. + 2. LJ)	3.50		14.00
Total eigene Leistungen				1'707.25

Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt:	EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer:	INGE EP RF-BB
Vertrag Nr.:	000003
Vertragsgegenstand:	PV Bau und BSA
Projektnummer:	90069
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Nov

Projektleiter Bauherr	Nicole Schulz
Vertragsdatum:	22.10.2018
Vertragslaufzeit:	01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:	
Inventarobjekt:	
Phasen, beauftrag:	EK/GP - AP/MK
Phasen, rapportiert:	AP Installationsflächen + LE

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

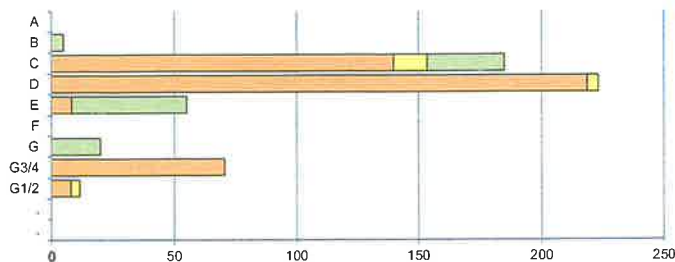

Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B	5,00			5		
C	185,00	139,75	13,75	31,5		83%
D	155,00	218,5	4,5		68	144%
E	55,00	8,25		46,75		15%
F						
G	20,00			20		
G3/4		70,25			70,25	
G1/2		8	3,5		11,5	
-						
-						
Σ	420	444,75	21,75	103,25	149,75	111%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer	
Selbsteinschätzung	90%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)	
Kostendach	CHF 35'085
Kosten ist	CHF 34'740
Kostenausschöpfung	99.02%
Stundenausschöpfung	111%

[illegible]

Kostenabrechnung																
Ansatz (inkl MwSt. keine Rabatte)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total	
145.00	A															
122.00	B															
95.00	C	7'885	1'686	2'019				594	998	95			1'306		14'582.50	
86.00	D	9'095	5'440	4'042				86	129				387		19'178.00	
62.00	E	186		326											511.50	
50.00	F															
8.00	G															
6.00	G3/4	144	116	162											421.50	
4.00	G1/2	8	6	4				4	8	2			14		46.00	
				</												

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.11.2022 - 30.11.2022

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung: **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung: **Installationensflächen und Landerwerb**

Mitarbeiter: **Grieder Fabio** (fg) Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
03.11.2022	Erstellung Präsentation für Vorstellung GE und ASTRA EP	1.50
07.11.2022	Vorbereitung Präsentation Dossiervorstellung	2.50
18.11.2022	Abgleich mit L. Hunziker betreffend Überarbeitung LE-Dossiers und Terminschiene	1.00
25.11.2022	Kurzabgleich mit L. Hunziker und S. Dolder betreffend Überarbeitung LE-Dossier (Stand Grundbuchauszüge und weiteres Vorgehen)	2.50
Summe		7.50

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.11.2022 - 30.11.2022

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung: **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung: **Installationensflächen und Landerwerb**

Mitarbeiter: **Hunziker Livia (Lgr)** Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
18.11.2022	Interne Besprechung mit Fabio Grieder betreffend weiterem Vorgehen Enteignungspläne und Grunderwerbstabelle, Telefonat mit dem Grundbuchamt betreffend GB Auszügen und Vormerkungen, Excelliste erstellen mit den benötigten Unterlagen für Grundbuchamt	1.00
21.11.2022	Weiteres Vorgehen Dossier Landerwerb, E-Mail an O. Drengemann ergänzen/anpassen inkl. Rückmeldung an F. Grieder, Grunderwerbstabelle anpassen	3.25
22.11.2022	GB Auszüge prüfen inkl. Rückmeldung an GB Amt betreffend Vormerkungen	0.75
25.11.2022	Interne Besprechung mit S. Dolder und F. Grieder betreffend weiterem Vorgehen	0.25
29.11.2022	E-Mail mit Arbeitsstand an S. Dolder zustellen, E-Mail an Grundbuchamt wegen neuen Grundeigentümern	1.00
Summe		6.25

Periode: 01.11.2022 - 30.11.2022

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
	ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
	ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung	Installationensflächen und Landerwerb

Mitarbeiter	Dolder Silvio (sdo)	Kategorie:	D154	Ingenieur (D)
-------------	----------------------------	------------	------	---------------

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
25.11.2022	Sitzung Überarbeitung LE-Dossiers mit F. Grieder und L. Hunziker	0.75
28.11.2022	Vorbereitung und Besprechung der Anpassung der Enteignungspläne aufgrund der Änderung der ASTRA Richtlinien, Anpassungen Besprechen zur temporärer Landerwerb bei den GHGW	3.75
Summe		4.50

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH11 0076 9401 1371 0200 1
JAUSLIN STEBLER AG
Gartenstrasse 15
4132 Muttenz

Zahlbar durch (Name/Adresse)

┌

└

Währung Betrag

CHF ┌

└

Annahmestelle

Zahlteil



Konto / Zahlbar an
CH11 0076 9401 1371 0200 1
JAUSLIN STEBLER AG
Gartenstrasse 15
4132 Muttenz

Zahlbar durch (Name/Adresse)

┌

└

Währung Betrag

CHF ┌

└

└

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.11.2022 - 30.11.2022

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung	Installationensflächen und Landerwerb

Mitarbeiter	Schneider Anika (sca)	Kategorie: I	Lehrling (1. + 2. Lj)
-------------	------------------------------	--------------	-----------------------

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
-------	--------------------	---------

28.11.2022	Anpassung und Änderungen an Enteignungskästchen nach neuem Muster von ASTRA	3.50
------------	---	------

Summe		3.50
--------------	--	------
