

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Muttenz 1 03.01.2023
Projektleiter Grieder Fabio
Ihre Referenz Christian Fuchs

Unsere Referenz 702288.0
MwSt.-Nr. CHE-459.227.258 MWST

N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069

Rechnung Nr. 70024532

Periode 01.12.2022 - 31.12.2022

Leistungsbeschreibung:
Rechnung 13 Installationsflächen+LE

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Eigene Leistungen | 1'664.25 |
| MWST 7.70 % von 1'664.25 | <u>128.15</u> |
| Total Gesamtbetrag inkl. MWST | <u>1'792.40</u> |

Alle Beträge in CHF
Zahlbar innert 30 Tage netto
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:
- Einzahlungsschein
- Rapporte

Detailbeleg Auftrag 702288.0_PH31_AP_IF + LE Installationensflächen und Landerwerb

Eigene Leistungen


| Periode | Mitarbeiter | Menge | Ansatz | Betrag |
|-------------------------|-------------------------------|-------|--------|----------|
| 202212 | Grieder Fabio | 1.00 | 95.00 | 95.00 |
| 202212 | Hunziker Livia | 3.75 | 95.00 | 356.25 |
| Stundenleistung | C354 Architekt, Ingenieur (C) | 4.75 | | 451.25 |
| 202212 | Dolder Silvio | 14.00 | 86.00 | 1'204.00 |
| Stundenleistung | D154 Ingenieur (D) | 14.00 | | 1'204.00 |
| 202212 | Schneider Anika | 2.25 | 4.00 | 9.00 |
| Stundenleistung | I Lehrling (1. + 2. LJ) | 2.25 | | 9.00 |
| Total eigene Leistungen | | | | 1'664.25 |

Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


| | |
|-------------------------------|--|
| Projekt: | EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA |
| Vertragnehmer: | INGE EP RF-BB |
| Vertrag Nr.: | 000003 |
| Vertragsgegenstand: | PV Bau und BSA |
| Projektnummer: | 90069 |
| Aktuelles Beobachtungsjahr: | 2022 |
| Beobachtungsmonat (Std. NEU): | Dez |

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Projektleiter Bauherr | Nicole Schulz |
| Vertragsdatum: | 22.10.2018 |
| Vertragslaufzeit: | 01.07.18-31.01.22 |
| Finanzierungskonto: | |
| Inventarobjekt: | |
| Phasen, beauftrag: | EK/GP - AP/MK |
| Phasen, rapportiert: | AP Installationsflächen + LE |

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

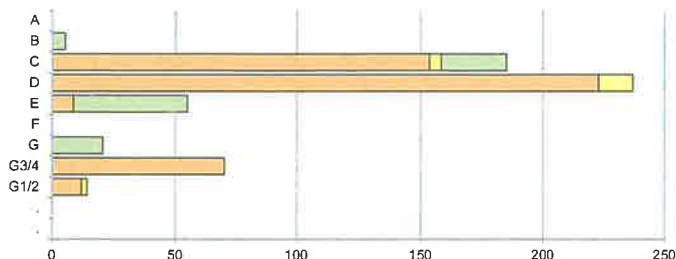

Gesamtübersicht in %



| Kategorien gem. Vertrag | Std. Dach | Std. IST | Std. NEU | Std. REST | Std. Überzug | Std. Verbrauch % |
|-------------------------|-----------|----------|----------|-----------|--------------|------------------|
| A | | | | | | |
| B | 5.00 | | | 5 | | |
| C | 185.00 | 153.5 | 4.75 | 26.75 | | 88% - |
| D | 155.00 | 223 | 14 | | 82 | 153% |
| E | 55.00 | 8.25 | | 46.75 | | 15% |
| F | | | | | | |
| G | 20.00 | | | 20 | | |
| G3/4 | | 70.25 | | | 70.25 | |
| G1/2 | | 11.5 | 2.25 | | 13.75 | |
| * | | | | | | |
| * | | | | | | |
| Σ | 420 | 466.5 | 21 | 98.5 | 166 | 116% |

| | |
|---|-----|
| quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer | |
| Selbsteinschätzung | 91% |

| | | |
|---|--|------------|
| rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.) | | |
| Kostendach | | CHF 35'085 |
| Kosten ist | | CHF 36'404 |
| Kostenausschöpfung | | 103.76% |
| Stundenausschöpfung | | 116% |

[illegible]

| Kostenabrechnung | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|----------|-----|-----|-----|--------|----------|-------|-----|-----|----------|----------|-----------|
| Ansatz (exkl. MwSt. kenn. Robott) | Kategorie | Vorjahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total |
| 145.00 | A | | | | | | | | | | | | | | |
| 122.00 | B | | | | | | | | | | | | | | |
| 95.00 | C | 7'885 | 1'686 | 2'019 | | | | 594 | 998 | 95 | | | 1'306 | 451 | 15'033.75 |
| 86.00 | D | 9'095 | 5'440 | 4'042 | | | | 86 | 129 | | | | 387 | 1'204 | 20'382.00 |
| 62.00 | E | 186 | | 326 | | | | | | | | | | | 511.50 |
| 50.00 | F | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.00 | G | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.00 | G3/4 | 144 | 116 | 162 | | | | | | | | | | | 421.50 |
| 4.00 | G1/2 | 8 | 6 | 4 | | | | 4 | 8 | 2 | | | 14 | 9 | 55.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Monat | | 17'317.50 | 7'247.25 | 6'552.25 | | | | 683.75 | 1'134.50 | 97.00 | | | 1'707.25 | 1'664.25 | 35'403.75 |

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.12.2022 - 31.12.2022

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069

Auftrag-Nr.: 702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung **Installationensflächen und Landerwerb**

Mitarbeiter **Grieder Fabio (fg)** Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

| Datum | Leistungsbeschrieb | Stunden |
|--------------|---|-------------|
| 20.12.2022 | Abgleich mit L. Hunziker betreffend Rückmeldung RDL und weiterem Vorgehen | 1.00 |
| Summe | | 1.00 |

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.12.2022 - 31.12.2022

| | |
|--------------|--|
| Projekt-Nr.: | 702288.0 |
| Bezeichnung | N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069 |
| Auftrag-Nr.: | 702288.0_PH31_AP_IF + LE |
| Bezeichnung | Installationensflächen und Landerwerb |

| | | | | |
|-------------|-----------------------------|------------|------|--------------------------|
| Mitarbeiter | Hunziker Livia (Lgr) | Kategorie: | C354 | Architekt, Ingenieur (C) |
|-------------|-----------------------------|------------|------|--------------------------|

| Datum | Leistungsbeschreibung | Stunden |
|--------------|---|-------------|
| 19.12.2022 | Telefonat mit Bruno Morgenthaler betreffend Grunderwerbstabelle | 0.25 |
| 20.12.2022 | Telefonat mit Bruno Morgenthaler betreffend weiterem Vorgehen, E-Mail an F. Grieder betreffend aktuellem Stand | 1.00 |
| 23.12.2022 | Exelliste für ASTRA Parzelle erstellen für Anfrage bei Grundbuchamt, Abgleichen der Pläne | 2.50 |
| Summe | | 3.75 |

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.12.2022 - 31.12.2022

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung: **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung: **Installationensflächen und Landerwerb**

Mitarbeiter: **Dolder Silvio (sdo)** Kategorie: D154 Ingenieur (D)

| Datum | Leistungsbeschreibung | Stunden |
|--------------|--|--------------|
| 05.12.2022 | Kontrolle Enteignungspläne nach Anpassung der Dienstbarkeiten und Besprechung mit A. Schneider | 3.75 |
| 07.12.2022 | Anpassen Grunderwerbstabelle und Pläne für die Parzellen 5379 und 5386 in Eiken, Besprechung Enteignungspläne mit A. Schneider | 2.75 |
| 09.12.2022 | Kontrolle Enteignungspläne AP Installationsflächen 1-11 und AP SABA 1-22 | 2.75 |
| 15.12.2022 | Kontrolle aller Enteignungspläne, Besprechung Enteignungspläne und Korrekturen mit A. Schneider | 4.75 |
| Summe | | 14.00 |

Periode: 01.12.2022 - 31.12.2022

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung **Installationensflächen und Landerwerb**

Mitarbeiter **Schneider Anika (sca)** Kategorie: I Lehrling (1. + 2. LJ)

| Datum | Leistungsbeschrieb | Stunden |
|--------------|--|-------------|
| 01.12.2022 | Enteignungsplan: Fertigstellung anpassungen an den Enteignungskästchen (1.25h) | 0.75 |
| 07.12.2022 | Fertigstellung Enteignungskästchen (1.5h) | 1.50 |
| Summe | | 2.25 |

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' shape with a horizontal stroke.

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH11 0076 9401 1371 0200 1
JAUSLIN STEBLER AG
Gartenstrasse 15
4132 Muttenz

Zahlbar durch (Name/Adresse)

┌

└

Währung Betrag
CHF ┌

└

Annahmestelle

Zahlteil



Währung Betrag
CHF ┌

└

Konto / Zahlbar an
CH11 0076 9401 1371 0200 1
JAUSLIN STEBLER AG
Gartenstrasse 15
4132 Muttenz

Zahlbar durch (Name/Adresse)

┌

└

┌

└
