




## Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt: N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen  
Vertragnehmer: INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG  
Vertrag Nr.: 000003  
Vertragsgegenstand: PV Bau/BSA  
Projektnummer: 090069  
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2022  
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Juli


Vertragsdatum: 14.11.2018  
Vertragslaufzeit: 31.12.2022  
Finanzierungskonto: Unterhalt  
Inventarobjekt: FUP.2  
Phasen, beauftragt: AP Bypass  
Phasen, rapportiert: AP Bypass

### Aktuelle Stundenausschöpfung

(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

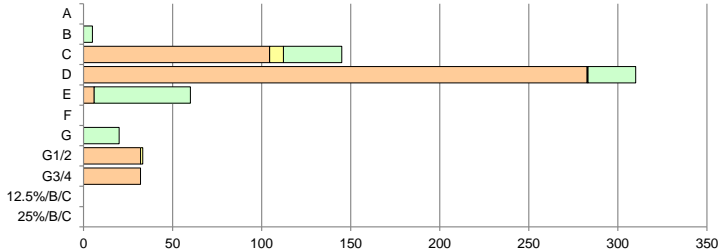

### Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B	5			5		
C	145	104.5	7.75	32.75		77%
D	310	282.75	0.5	26.75		91%
E	60	6		54		10%
F						
G	20			20		
G1/2		32	1.25		33.25	
G3/4		32			32	
12.5%/B/C						
25%/B/C						
Σ	540	457.25	9.5	138.5	466.75	86%

### quantitative Selbstschätzung seitens Auftragnehmer

Selbstschätzung 97%

### rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach CHF 44'925.00

Kosten ist CHF 35720

Kostenausschöpfung 79.51%

Stundenausschöpfung 86%

### Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B														
	Kategorie	C														
	Kategorie	D														
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Jauslin Stebler AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B														
	Kategorie	C	71.25	9	21.25				3	7.75						112.25
	Kategorie	D	166.5	54.5	61.75					0.5						283.25
	Kategorie	E	5		1											6
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2	12.5	5	14.5					1.25						33.25
Leipert AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B														
	Kategorie	C														
	Kategorie	D														
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Holinger AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B														
	Kategorie	C														
	Kategorie	D														
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Total			283.75	68.5	102				3	9.5						466.75

### Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MwSt., inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A														
CHF 122.00	B														
CHF 95.00	C	6'769	855	2'019				285	736						10'664
CHF 86.00	D	14'319	4'687	5'311					43						24'360
CHF 62.00	E	310		62											372
CHF 50.00	F														
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2	50	20	58					5						133
CHF 6.00	G3/4	171		21											192
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		21'618.75	5'562.00	7'470.25				285.00	784.25						CHF 35'720.25

**JAUSLIN STEBLER AG**
**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.07.22 bis 31.07.22**
**Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP Bypass**

<b>Mitarbeiter</b>	<b>Kat.</b>	<b>Stunden</b>	<b>Kostensatz</b>	<b>Betrag</b>
Roth Stefan	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
<b>Total</b>	<b>A</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>
Forlin Sandro	B	0	122	0.00
Hartmann Peter	B	0	122	0.00
Mantinger Michael	B	0	122	0.00
Methner Raphael	B	0	122	0.00
<b>Total</b>	<b>B</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>
Brauchli Stefan	C	0	95	0.00
Grieder Fabio	C	4	95	380.00
Hunziker Livia	C	3.75	95	356.25
Name Vorname	C	0	95	0.00
<b>Total</b>	<b>C</b>	<b>7.75</b>		<b>736.25</b>
Abdelmoghni Ahmed	D	0.5	86	43.00
Deck Andreas	D	0	86	0.00
Dolder Silvio	D	0	86	0.00
Rothfuss Fabian	D	0	86	0.00
Seebacher Andreas	D	0	86	0.00
Meyer Moritz	D	0	86	0.00
Nyffenegger Christoph	D	0	86	0.00
Brunner Andreas	D	0	86	0.00
Boeglin Chantal	D	0	86	0.00
<b>Total</b>	<b>D</b>	<b>0.5</b>		<b>43.00</b>
Müller Jan	E	0	62	0.00
Brüngger Marco	E	0	62	0.00
Ladner Roman	E	0	62	0.00
Russer Elisabeth	E	0	62	0.00
Wortelboer Alexander	E	0	62	0.00
<b>Total</b>	<b>E</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>
Dogan Esra	F	0	50	0.00
Prescha Deliah	F	0	50	0.00
<b>Total</b>	<b>F</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>
Strittmatter Katja (Praktikantin)	G	0	8	0.00
Möri Anna	G	0	8	0.00
<b>Total</b>	<b>G</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>
Aston Tim	G3/4	0	6	0.00
Straub Vanessa	G3/4	0	6	0.00
Hegi Yannick	G3/4	0	6	0.00
Schneider Anika	G1/2	1.25	4	5.00
<b>Total</b>	<b>G</b>	<b>1.25</b>		<b>5.00</b>
<b>Gesamttotal</b>		<b>9.5</b>		<b>784.25</b>

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022

Projekt-Nr.: 702288.0  
Bezeichnung: **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**  
**Projektkurzbezeichnung: EP RhFr**  
**Projektnummer: 090069**

Auftrag-Nr.: 702288.0\_PH 31\_AP BYPASS  
Bezeichnung: **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**  
**Projektkurzbezeichnung: EP RhFr**  
**Projektnummer: 090069**  
**AP Bypass**

Mitarbeiter: **Grieder Fabio (fg)** Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
11.07.2022	Zusammenstellen Plangrundlagen für PV U und aufgleisen Dossierzusammenstellung durch L. Hunziker	1.00
12.07.2022	Durchsicht der überarbeiteten AP-Dokumente für Abgabedossier V0.9	0.50
15.07.2022	Schlusskontrolle AP-Dossier inkl. div. Korrekturen, Upload ASTRA- Sharepoint	2.50
<b>Summe</b>		<b>4.00</b>

# ARBEITSRAPPORT



**Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022**

---

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	<b>Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA</b> <b>Projektkurzbezeichnung: EP RhFr</b> <b>Projektnummer: 090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	<b>Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA</b> <b>Projektkurzbezeichnung: EP RhFr</b> <b>Projektnummer: 090069</b> <b>AP Bypass</b>

Mitarbeiter	<b>Hunziker Livia (Lgr)</b>	Kategorie:	C354	Architekt, Ingenieur (C)
-------------	-----------------------------	------------	------	--------------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
12.07.2022	Grunderwerbstabelle anpassen, div. Dokumente anpassen, Zeichnerkoordination, anpassungen Pläne, Inhaltsverzeichnis ergänzen, Abgabedossier bereitstellen	3.50
15.07.2022	Angaben über Kosten Dokument ergänzen	0.25
<b>Summe</b>		<b>3.75</b>

Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022

Projekt-Nr.:	702288.0		
Bezeichnung	<b>Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA</b> <b>Projektkurzbezeichnung: EP RhFr</b> <b>Projektnummer: 090069</b>		
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS		
Bezeichnung	<b>Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA</b> <b>Projektkurzbezeichnung: EP RhFr</b> <b>Projektnummer: 090069</b> <b>AP Bypass</b>		
Mitarbeiter	<b>Abdelmoghni Ahmed</b> (aha)	Kategorie: D154	Ingenieur (D)
Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden	
19.07.2022	Vollständigkeitsprüfung AP Bypass Frick	0.50	
Summe		0.50	

F.9

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.07.2022 - 31.07.2022

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	<b>Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA</b> <b>Projektkurzbezeichnung: EP RhFr</b> <b>Projektnummer: 090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	<b>Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA</b> <b>Projektkurzbezeichnung: EP RhFr</b> <b>Projektnummer: 090069</b> <b>AP Bypass</b>

Mitarbeiter	<b>Schneider Anika</b> (sca)	Kategorie: I	Lehrling (1. + 2. LJ)
-------------	------------------------------	--------------	-----------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
-------	-----------------------	---------

06.07.2022	Alle Titelblätter anpassen und Pdf umbenennen	1.25
------------	---	------

<b>Summe</b>		1.25
--------------	--	------
