

Bundesamt für Strassen ASTRA
Nationalstr. - und Agglo.verk.fonds (NAF)
c/o DLZ FI
CH-3003 Bern

Versand an:
Jauslin Stebler AG
Elisabethenanlage 11
4051 Basel

Rechnung

UID Nr. CHE-105.932.199 MWST
Rechnung-Nr. 2231679
Datum 23.10.2023
Auftrag-Nr. 9960.100 -.400 /.888 / FL / BBr
Zahlungsziel 30 Tage netto

Einzelmassnahme Osttangente

PV und Bauleitung Brücke Bäumlhof / DP/MP Phase 32 / Phase 51
MP-180002

Vertragsnummer: 1355003667

Bestellnummer: 1357003508

Projektleiter / Zuständige Person Vertrag: Götz Schackenberg

Leistungszeitraum September 2023

Regierapport, verrechnet nach SIA-Honorarordnung 103, Zeittarif

	CHF	CHF
Honorar Phase 32, MP (Index .100)	4'602.50	
Honorar Phase 32, DP Lärm (Index .110)	648.75	
Honorar Phase 51, Unterlagen für Ausführung (Index .400)	4'628.00	
	9'879.25	
Verrechenbare Nebenkosten	0.00	
	9'879.25	9'879.25
Mehrwertsteuer 7.7%		760.70
Rechnungstotal		10'639.95

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH25 0077 0016 0501 2945 7
Ing A Aegerter & Dr O Bosshardt AG
Lautengartenstrasse 6
4052 Basel

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF

Annahmestelle

Zahlteil




Währung Betrag

CHF

Konto / Zahlbar an
CH25 0077 0016 0501 2945 7
Ing A Aegerter & Dr O Bosshardt AG
Lautengartenstrasse 6
4052 Basel

Zusätzliche Informationen
Rg. Nr.

Zahlbar durch (Name/Adresse)



EPF Kreditoren-Workflow
Trennblatt Anlagen

Version 1.0 - Patchcode I



Rechnungsdaten

Rechnungsnummer:	2231679
Rechnungsdatum:	23.10.2023
Leistungszeitraum von:	01.09.2023
Leistungszeitraum bis:	30.09.2023
Zahlungsbedingung:	innerhalb 30 Tage netto
Belegart	Rechnung

Projektdaten

Projektnummer:	MP-180002
Projektleiter:	Schackenberg Götz

Vertragsdaten

Vertragsnummer:	1355003667
Vertragsbezeichnung:	PV und BL Instandsetzung Belag Bäumlilhofbrücke
Vertragsbeginn:	01.04.2019
Vertragsende:	30.09.2024
Alte Vertragsnummer:	7

Vertragsgruppierung	Aufträge / Dienstleistungen
Rechnungsart:	Honorar / Dienstleistungen / Übrige
Schlussrechnung:	Nein
Währung:	CHF
Bemerkung:	

Projektbezeichnung:	Erhaltungsmassnahmen Osttangente
Zuständige Person Vertrag:	Schackenberg Götz
Bestellnummer:	1357003508
Vertragssumme inkl. MwSt:	2'174'704.80CHF
Kreditor:	1358000492 Ingenieurbureau A. Aegerter &
E-Mail-Adresse:	B.Boschung@AeBo.ch

Laufweg Rechnungsfreigabe

1	BHU
Firma:	JAUSLIN STEBLER AG
Prüfperson:	Stebler Judith
Email:	bhu-basel@jauslinstebler.ch
Stempel / Datum / Unterschrift oder Digitale Signatur	

2	
Firma:	
Prüfperson:	
Email:	
Stempel / Datum / Unterschrift oder Digitale Signatur	

Rechnungsbeträge gegliedert nach Vertragsposition

						Leistung exkl. MWST	Rabatt	Zwischentotal	Leistungen / NK ohne Rabatt exkl. MWST	TOTAL exkl. MWST	MwSt.	TOTAL inkl. MWST	Skonto	Skonto in CHF	Auszahlung inkl. MWST abzgl. Skonto und Rückbehalt
Pos.	PSP-Element	Inventarobjekt		Baukostenart			%				%		%		
10	MP-180002-1-P-X-03	TP Kunstbauten	12.02.08.410.24	BRÜCKE Bäumlilhof	13510003100	Projektiertung und Bauleitung	0.00	8'298.55		8'298.55	7.70	8'937.54	0	0.00	8'937.54
10	MP-180002-1-P-X-03	TP Kunstbauten	12.02.08.410.24	BRÜCKE Bäumlilhof	13510003950	Teuerung aktivierbar	0.00	0.00		0.00	7.70	0.00	0	0.00	0.00
10	MP-180002-1-P-X-03	TP Kunstbauten	12.02.08.410.25	BRÜCKE Zufahrt rechtes Rheinufer vor Sch	13510003100	Projektiertung und Bauleitung	0.00	1'580.70		1'580.70	7.70	1'702.41	0	0.00	1'702.41
10	MP-180002-1-P-X-03	TP Kunstbauten	12.02.08.410.25	BRÜCKE Zufahrt rechtes Rheinufer vor Sch	13510003950	Teuerung aktivierbar	0.00	0.00		0.00	7.70	0.00	0	0.00	0.00
10				Ergebnis				9'879.25	0.00	9'879.25		10'639.95		0.00	10'639.95
	TOTAL							9'879.25	0.00	9'879.25		10'639.95		0.00	10'639.95


Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt:	N02 - Einzelmassnahmen Osttangente Basel
Vertragnehmer:	Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.:	1355003667 (Alt 7)
Vertragsgegenstand:	PV + BL Brücke Bäumlhof
Projektnummer:	MP-180002
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2023
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Sep


Projektleiter Bauherr	U. Aeschlimann
Vertragsdatum:	01.04.2019
Vertragslaufzeit:	30.09.2025
Finanzierungskonto:	Unterhalt
Inventarobjekt:	TP2.12.02.08.410.24
Phasen, beauftrag:	Phase 32 - Phase 53
Phasen, rapportiert:	Phase 32 - DP/MP

Aktuelle Stundenausschöpfung

(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)



Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	70	0.5		69.5		1%
B	1630	954.75	15	660.25		59%
B/C						
C	340	367			27	108%
C/D						
D	850	1981.75	18.25		1150	235%
E	340	292	21	27		92%
F	100	439.5			339.5	440%
G	70			70		
G1		21.75	7		28.75	
G2		426			426	
Σ	3400	4483.25	61.25	826.75	1971.25	134%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer	
Selbsteinschätzung	95%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)		
Kostendach		CHF 362'380
Kosten ist		CHF 407'037
Kostenausschöpfung		112.32%
Stundenausschöpfung		134%

[illegible]

Kostenabrechnung															
Ansatz (exkl. MwSt., kein Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
135,00	A	68													67,50
126,00	B	100'296	1'197	914	3'591	2'646	2'489	4'725	2'300	2'142	1'890				122'188,50
115,50	B/C														
105,00	C	37'249					1'286								38'535,00
100,00	C/D														
95,00	D	144'210	1'306	1'639	14'915	11'020	4'798	2'589	5'273	2'518	1'734				190'000,00
65,00	E	1'219	1'983	1'463	2'990	634	98	3'185	4'680	2'730	1'365				20'345,00
55,00	F	23'389		743	41										24'172,50
50,00	G														
37,50	G1	638			178							263			1'078,13
25,00	G2	7'075				2'025	419	1'131							10'650,00
Total Monat		314'142,25	4'485,75	4'757,25	21'715,38	16'324,75	9'088,50	11'630,00	12'252,00	7'389,50	5'251,25				407'036,63

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.09.2023 bis 30.09.2023

Mandant Name	AeBo	1000			
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik			
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3	Projektleiter	Lorenzo Falzone	
PLA	100	EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof	PLA Leiter	Lorenzo Falzone	
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen			
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9960 OT Brücken Bäumlihof	
Mitarbeiter		Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Falzone Lorenzo		B	15.00	126.00	1'890.00
Meier Lukas		D	14.50	95.00	1'377.50
Christ Florian Michael		E	16.50	65.00	1'072.50
Rizzo Arianna		G3/4	7.00	37.50	262.50
Total PLA 100.Phase 32, MP			53.00	86.84	4'602.50

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.09.2023 bis 30.09.2023

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	100	EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv	Phase 32, MP		
Währung	CHF Switzerland Franc	Kundenprojekt, Aufwand, Offen		

Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
Florian Michael	100	19.09.2023	Anpassung Massnahmenpläne aufgrund neuem FZRS	8.25
Christ	100	20.09.2023	Anpassung Massnahmenpläne aufgrund neuem FZRS	4.25
	100	22.09.2023	Anpassung Massnahmenpläne aufgrund neuem FZRS	4.00
Subtotal				16.50
Lorenzo Falzone	100	01.09.2023	Prüfung Traktanden PS, Kontrolle Pendenzen Taskforce, Verifizierung Baulaborresultate	1.00
	100	06.09.2023	Teilnahme an Taskforce-Sitzung, inkl. Vorbereitung und Auswertung	2.00
	100	07.09.2023	Teilnahme an Projektsitzung, inkl. Vorbereitung und Auswertung; Terminfindung FU ARP 5, Tabelle Beschaffungen	3.00
	100	08.09.2023	Arbeiten am Sitzungsprotokoll	1.50
	100	11.09.2023	Thematik LSW/FZRS mit FU und PV Akustik besprechen / Mailverkehr	2.00
	100	12.09.2023	Bespr. mit FU Flächengewicht Blechen, Maeilkorrespondenz	2.00
	100	13.09.2023	Bespr. mit Z/K Anpassungen MP-Pläne bzgl. FZRS	1.00
	100	14.09.2023	Bespr. mit Z/K Anpassungen MP-Pläne bzgl. FZRS	1.50
	100	26.09.2023	Erstellung Korrekturen Pläne für MP	1.00
Subtotal				15.00
Lukas Meier	100	01.09.2023	Begehung mit Stadtgärtnerei und Erstellung Baufälligesuch	2.00
	100	06.09.2023	Erstellung und Versand Einladung PS	0.50
	100	07.09.2023	PS OT inkl. Protokoll, Überarbeitung Tabelle Submissionskonzept,	5.00
	100	25.09.2023	Optimierung Verkehrspläne und MP Dossier	1.25
	100	27.09.2023	Div. Abklärungen, Verkehrspläne	2.00
	100	28.09.2023	Bereinigung MP Dossier	1.00
	100	29.09.2023	Zusammenstellung MP Dossier Bäumlihof und Kopfdossier, Übergabe zum Druck	2.75
Subtotal				14.50
Arianna Rizzo	100	14.09.2023	Anpassungen Massnahmenpläne aufgrund neuem FZRS	3.00
	100	15.09.2023	Anpassungen Massnahmenpläne aufgrund neuem FZRS	4.00
Subtotal				7.00

Mitarbeiter		Kat.	Stunden
ChF	Florian Michael Christ	E	16.50
FL	Lorenzo Falzone	B	15.00
MeL	Lukas Meier	D	14.50
RAr	Arianna Rizzo	G3/4	7.00

Aktivität	Stunden
100 Phase 32, MP	53.00
Total	53.00

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.09.2023 bis 30.09.2023

Mandant Name	AeBo	1000			
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik			
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3	Projektleiter	Lorenzo Falzone	
PLA	110	EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof	PLA Leiter	Lorenzo Falzone	
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen			
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9960 OT Brücken Bäumlihof	
Mitarbeiter		Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Meier Lukas		D	3.75	95.00	356.25
Christ Florian Michael		E	4.50	65.00	292.50
Total PLA 110.Phase 32, DP Lärm			8.25	78.64	648.75

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.09.2023 bis 30.09.2023

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	110	EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv	Phase 32, DP Lärm		
Währung	CHF Switzerland Franc	Kundenprojekt, Aufwand, Offen		

Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
Florian Michael	110	26.09.2023	Anpassungen Pläne aufgrund Änderung Titelblatt (Plan Nr. 9960/41-44)	1.00
Christ	110	27.09.2023	Anpassungen Pläne aufgrund Änderung Titelblatt (Plan Nr. 9960/41-44)	3.50
			Subtotal	4.50
Lukas Meier	110	07.09.2023	Angaben an Zeichner zum Übersichtsplan DP Lärm	0.50
	110	29.09.2023	Zusammenstellung DP Lärm Übergabe zum Druck	3.25
			Subtotal	3.75

Mitarbeiter	Kat.	Stunden
ChF	E	4.50
MeL	D	3.75

Aktivität	Stunden
110	8.25
Total	8.25


Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt:	N02 - Einzelmassnahmen Osttangente Basel
Vertragnehmer:	Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.:	1355003667 (Alt 7)
Vertragsgegenstand:	PV + BL Brücke Bäumlilhof
Projektnummer:	MP-180002
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2023
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Sep


Projektleiter Bauherr	U. Aeschlimann
Vertragsdatum:	01.04.2019
Vertragslaufzeit:	30.09.2025
Finanzierungskonto:	Unterhalt
Inventarobjekt:	TP2.12.02.08.410.24
Phasen, beauftrag:	Phase 32 - Phase 53
Phasen, rapportiert:	Phase 51 - UfA

Aktuelle Stundenausschöpfung

(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

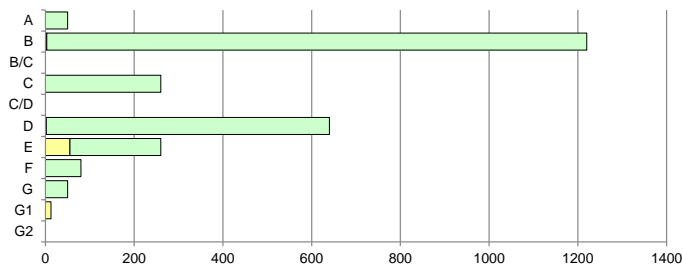

Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	50			50		
B	1220		3	1217		0%
B/C						
C	260			260		
C/D						
D	640		2	638		0%
E	260		55.25	204.75		21%
F	80			80		
G	50			50		
G1			12.5		12.5	
G2						
Σ	2560		72.75	2499.75	12.5	3%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer	
Selbsteinschätzung	2%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)	
Kostendach	CHF 272'370
Kosten ist	CHF 4'628
Kostenausschöpfung	2%
Stundenausschöpfung	3%

Stundenabrechnung

[illegible]

Kostenabrechnung

Kostensammlung																
Ansatz (inkl. MwSt., kein Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total	
135.00	A															
126.00	B										378				378.00	
115.50	B/C															
105.00	C															
100.00	C/D															
95.00	D										190				190.00	
65.00	E										3'591				3'591.25	
55.00	F															
50.00	G															
37.50	G1										469				468.75	
25.00	G2															
Total Monat											4'628.00				4'628.00	

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.09.2023 bis 30.09.2023

Mandant Name	AeBo	1000			
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik			
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3	Projektleiter	Lorenzo Falzone	
PLA	400	EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof	PLA Leiter	Lorenzo Falzone	
Typ	aktiv	Phase 51, Unterlagen für die Ausführung			
Währung	CHF Switzerland Franc	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen	Honorarklasse	9960 OT Brücken Bäumlihof	
Mitarbeiter		Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Falzone Lorenzo		B	3.00	126.00	378.00
Delmas Marc		D	2.00	95.00	190.00
Boser Florian		E	55.25	65.00	3'591.25
Bätscher Basil		G3/4	12.50	37.50	468.75
Total PLA 400.Phase 51, Unterlagen für die Ausführung			72.75	63.62	4'628.00

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.09.2023 bis 30.09.2023

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09960	ASTRA F3	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	400	EINZM_OT_Brücken_Bäumlihof	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv	Phase 51, Unterlagen für die Ausführung		
Währung	CHF Switzerland Franc	Kundenprojekt, Aufwand, Offen		

Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
Basil Bätcher	400	12.09.2023	Aufarbeitung Grundlagen lokal Strassenebene	5.00
	400	13.09.2023	Aufarbeitung Grundlagen lokal Strassenebene	7.50
			Subtotal	12.50
Florian Boser	400	18.09.2023	Erstellung S&M Pläne Lokalstrasse	2.75
	400	19.09.2023	Erstellung S&M Pläne Lokalstrasse	4.00
	400	20.09.2023	Erstellung S&M Pläne Lokalstrasse	1.50
	400	21.09.2023	Erstellung S&M Pläne Lokalstrasse	6.25
	400	22.09.2023	Erstellung S&M Pläne Lokalstrasse	6.25
	400	25.09.2023	Erstellung S&M Pläne Lokalstrasse	8.75
	400	26.09.2023	Erstellung S&M Pläne Lokalstrasse	7.75
	400	27.09.2023	Erstellung S&M Pläne Lokalstrasse	5.50
	400	28.09.2023	Erstellung S&M Pläne Lokalstrasse	4.50
	400	29.09.2023	Erstellung S&M Pläne Lokalstrasse	8.00
			Subtotal	55.25
Marc Delmas	400	11.09.2023	Sichtung Pläne	1.00
	400	27.09.2023	Besprechung Verkehrsführung und Kontrolle Pläne	1.00
			Subtotal	2.00
Lorenzo Falzone	400	18.09.2023	Bespr. mit Z/K S&M Pläne	1.50
	400	21.09.2023	Besprechung S&M CAD Bearbeitung	1.50
			Subtotal	3.00

Mitarbeiter		Kat.	Stunden
BBa	Basil Bätcher	G3/4	12.50
BoF	Florian Boser	E	55.25
DeM	Marc Delmas	D	2.00
FL	Lorenzo Falzone	B	3.00

Aktivität	Stunden
400 Phase 51, Unterlagen für die Ausführung	72.75
Total	72.75

N02 Einzelmassnahmen Osttangente Basel: PV + BL Brücke Bäumlihof

Stand per 01.09.2023

Mitarbeiterliste

Name/Vorname	Jg.	Berufsausbildung	Diplom	Zusatzausbildung	Diplom	Bisherige Praxis	Funktion in der Firma	Vorgesehene Funktion	Kat.	Ergänzung
		Titel, Ausbildung, Hochschule, Technikum, Berufslehre, Anlehre	Lehrabschluss	Titel, Ausbildung, Hochschule	(Jahr)	mit Angaben des Fachgebietes	Anzahl Jahre BL = Bereichsleiter FBL = Fachbereichsleiter	seit	im Rahmen des Auftrags	
Zemmers Guy	1961	Dipl. Bauring, TH Karlsruhe	1988			Verkehr, Informatik	35 Mitglied der GL, BL Verkehr + Umwelt, FBL Verkehrsmanagement, Leiter IZ, Chefingenieur	1989	Experte Verkehr	A
Rey Lionel	1975	Diplomgeologe, D.E.S. Umweltnaturwissenschaften	2001			Bereich Lärm, Luft, Umwelt	22 Diplomgeologe, Projektleiter Lärmschutz	2008	Projektingenieur	B
Falzone Lorenzo	1976	Dipl. Bauring, TU Mailand	2001			Bauernhalt, Tiefbau, Kanalisationen	22 Mitglied der GL, BL Bauernhalt/Geomatik, Chefingenieur Erhaltung, FBL Erhaltung Kunstbauten, Projektleiter	2010	PL	B
Bergmann Georg	1956	Dipl. Bauring, TH	1981	NDS ETH	1990	Bauernhalt, Kunstbauten, Bauleitung	42 Projekt- und Bauleiter	1990	Projektingenieur	C
Beck Peter	1960	Dipl. Vermessungssing, HTL	1986			Vermessung, GIS	37 FBL Geomatik u. Vermessung, Projektleiter	2001	Vermessung	C
Niedermeyer Friederike	1962	Dipl.-Biologin TU München	1992	UNIGIS professional	2002	Geoinformatik MS-Access	31 PL Umwelt und GIS	2012	Sachbearbeiter/ing Umwelt / Lärmschutz	C
Knoll Bernd	1969	Dipl. Bauring, TU Rostock	1996			Stahl-, Massivbau, Bauleitung	27 Projekt- und Bauleiter	2006	Bauleiter	C
Lüthi Tobias	1990	Dipl Bauring ETH ZH	2017			Bauernhalt	6 Bauingenieur	2017	Projektingenieur, PL-Siv, TPL, BL-Siv.	C
Meier Lukas	1991	Dipl. Bauring/MSc ETH ZH	2019				4 Bauingenieur	2019	TPL-Siv.	D
Schmidlin Julian	1995	Zeichner EFZ	2016		2021 *		2 Bauingenieur	2019	Projektingenieur	D
Özdoğan Seyfettin	1984	Dipl. Bauring/BSc-FHNW	2017	Dipl. Bauring/BSc-FHNW			21 Zeichner/Konstrukteur	2023	Projektingenieur	D
Delmas Marc	1982	Bauzeichner	2002				2 Bauleiter	2002	ZIK	D
Schär Cedric	1992	Bauzeichner	2013	Dipl. Techniker HF Bauplanung	2021 *	ZIK Bauernhalt	2 Bauleiter	2013	Bauleiter	D
Boschung Jan	1996	Bauzeichner	2016			ZIK Bauernhalt	7 Zeichner/Konstrukteur	2016	ZIK	D
Beuret Agnès	1966	KV-Abschluss	1985			Projektklassistentin	38 Bereichsassistentin	2010	Projektklassistentin	D
Weider Noëlle	1970	BTS Direktionssekretärin	1990			Projektklassistentin	33 Bereichsassistentin, SB Projektmanagement	1996	Projektklassistentin	D
Nel Regula	1963	Detaillhandelskauffrau	1983			Projektklassistentin	40 SB Projektmanagement/-assistentin	2018	Projektklassistentin	D
Eilers Brigitte	1961	Reprographin	1980				43 Reprographin	1993		E
Christ Florian Michael	1998	Zeichner EFZ	2019				4 Zeichner/Konstrukteur	2016	ZIK	E
Boser Florian	2000	Zeichner EFZ	2020				3 Zeichner/Konstrukteur	2016	ZIK	E
Tesan Laila	2000	Zeichnerin EFZ	2021				2 Zeichner/Konstrukteur	2017	ZIK	F
Bätscher Basil	2004	Zeichner EFZ						2019		G1
Rizzo Arianna	2005	Zeichnerin EFZ						2020		G1
Streff Timon	2006	Zeichner EFZ						2021		G2

- 1) Einstufung nach KBOB resp. SIA 103:2020 Stufe 3
- 2) Einstufung nach KBOB resp. SIA 103:2020 Stufe 2

Lorenzo
 Falzone

Digital signed by Lorenzo Falzone
 DN: cn=Lorenzo Falzone, c=CH, o=FA
 Aegert & Dr. O. Bosshardt AG,
 email=falzone@aabo.ch
 Grund: Ich stimme dem Dokument zu
 Datum: 2023.10.06 16:06:59 +02'00'
