

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Muttenz 1
Projektleiter
Ihre Referenz

26.09.2022
Grieder Fabio
Beat Schädler

Unsere Referenz
MWST - Nr.

702288
CHE-459.227.258 MWST

Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Rechnung 70022947

Periode 01.08.2022 - 31.08.2022

Eigene Leistungen

4'107.25

MWST 7.70 % von 4'107.25

316.26

Total Gesamtbetrag inkl. MWST

4'423.51

Alle Beträge in CHF
Zahlbar innert 30 Tage netto
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:

Detailbeleg 702288

Eigene Leistungen

Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202208	Forlin Sandro	8.00	122.00	976.00
Stundenleistung	B353 Leitender Ingenieur(B)	8.00	122.00	976.00
202208	Grieder Fabio	10.25	95.00	973.75
Stundenleistung	C253 Leitender Ingenieur	10.25	95.00	973.75
202208	Brunner Andreas	20.25	86.00	1'741.50
Stundenleistung	D154 Ingenieur (D)	20.25	86.00	1'741.50
202208	Ladner Roman	2.00	62.00	124.00
Stundenleistung	E356 Zeichner(E)	2.00	62.00	124.00
202208	Marsicovetere Liliana	4.50	62.00	279.00
Stundenleistung	E376 Kaufm.-/Sekretariatspers.(E)	4.50	62.00	279.00
202208	Werten Lukas	1.50	6.00	9.00
Stundenleistung	H Lehrling (3. + 4. LJ)	1.50	6.00	9.00
202208	Schneider Anika	1.00	4.00	4.00
Stundenleistung	I Lehrling (1. + 2. LJ)	1.00	4.00	4.00
Total eigene Leistungen				4'107.25

Projekt:	EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer:	INGE EP RF-BB
Vertrag Nr.:	000003
Vertragsgegenstand:	PV Bau und BSA
Projektnummer:	90069
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Aug

Projektleiter Bauherr	Nicole Schulz
Vertragsdatum:	22.10.2018
Vertragslaufzeit:	01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:	
Inventarobjekt:	
Phasen, beauftrag:	EK/GP - AP/MK
Phasen, rapportiert:	AP Lärm

Category	Number of Genes (approx.)
A	40
B	110
C	400
D	530
E	270
F	100
G3/4	100
G1/2	10

Kategorie	Prozent
Selbsteinschätzung	92%
Kostenausschöpfung	61.69%
Stundenausschöpfung	64%

Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	25.00			25		
B	350.00	110.5	8	231.5		34%
C	400.00	65.5	10.25	324.25		19%
D	450.00	514.5	20.25		84.75	119%
E	125.00	261.25	6.5		142.75	214%
F	100.00			100		
G	100.00			100		
G3/4			1.5		1.5	
G1/2			1		1	
.						
Σ	1550	951.75	47.5	780.75	230	64%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer	
Selbsteinschätzung	92%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)	
Kostendach	CHF 136'575
Kosten ist	CHF 84'255
Kostenausschöpfung	61.69%
Stundenausschöpfung	64%

[illegible]

Kostenabrechnung																
Ansatz (exkl. MwSt., kein Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total	
145.00	A															
122.00	B	13'420							61	976					14'457.00	
95.00	C	5'985						95	143	974					7'196.25	
86.00	D	43'409							839	1'742					45'988.50	
62.00	E	16'198								403					16'600.50	
50.00	F															
8.00	G															
6.00	G3/4									9					9.00	
4.00	G1/2									4					4.00	
Total Monat		79'011.00						95.00	1'042.00	4'107.25					84'255.25	

Fakturaübersicht zu Auftrag 702288

Auftrag	Eigene Honorare	Teuerung eig. Honorare	Eigene Nebenkosten	Rabatt	Rückbehalt	Betrag ohne MWST	Rechnungs-total	Bisher fakturiert	Vertrag
	Fremde		Fremde			MWST		Total fakturiert	Differenz
702288	4'107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4'107.25	4'423.51	1'358'164.68	1'308'013.76
Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA	0.00		0.00			316.26		1'362'588.19	-54'574.43
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr									
Projektnummer: 090069									
702288.0 / Rg. 70022947	1'265.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1'265.75	1'363.21	591'295.97	1'308'013.76
EP N03 Rheinfelden Frick, PV Bau/BSA	0.00		0.00			97.46		592'659.18	715'354.58
702288.2160 / Rg. 70022948	2'841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2'841.50	3'060.30	766'868.71	0.00
EP N03 Rheinfelden Frick, PV Bau/BSA	0.00		0.00			218.80		769'929.01	-769'929.01

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Muttenz 1
Projektleiter
Ihre Referenz

23.09.2022
Grieder Fabio
Beat Schädler

Unsere Referenz
MWST - Nr.

702288
CHE-459.227.258 MWST

Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Rechnung 70022931

Periode 01.08.2022 - 31.08.2022

Eigene Leistungen

2'919.25

MWST 7.70 % von 2'919.25

224.79

Total Gesamtbetrag inkl. MWST

3'144.04

Alle Beträge in CHF
Zahlbar innert 30 Tage netto
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:

Detailbeleg 702288

Eigene Leistungen

Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202208	Grieder Fabio	16.25	95.00	1'543.75
Stundenleistung	C253 Leitender Ingenieur	16.25	95.00	1'543.75
202208	Brauchli Stefan	9.50	95.00	902.50
Stundenleistung	C354 Architekt, Ingenieur (C)	9.50	95.00	902.50
202208	Abdelmoghni Ahmed	0.50	86.00	43.00
202208	Seebacher Andreas	3.50	86.00	301.00
Stundenleistung	D154 Ingenieur (D)	4.00	86.00	344.00
202208	Nosdeo Maya	1.50	86.00	129.00
Stundenleistung	D375 Kaufm.-/Sekretariatspers.(D)	1.50	86.00	129.00
Total eigene Leistungen				2'919.25

Fakturaübersicht zu Auftrag 702288


Auftrag	Eigene Honorare	Teuerung eig. Honorare	Eigene Nebenkosten	Rabatt	Rückbehalt	Betrag ohne MWST	Rechnungs- total	Bisher fakturiert	Vertrag
	Fremde		Fremde			MWST		Total fakturiert	Differenz
702288	2'919.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2'919.25	3'144.04	1'355'020.64	1'308'013.76
Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA	0.00		0.00			224.79		1'358'164.68	-50'150.92
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr									
Projektnummer: 090069									
702288.0 / Rg. 70022931	1'887.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1'887.75	2'033.11	589'262.86	1'308'013.76
EP N03 Rheinfelden Frick, PV Bau/BSA	0.00		0.00			145.36		591'295.97	716'717.79
702288.2160 / Rg. 70022932	1'031.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1'031.50	1'110.93	765'757.78	0.00
EP N03 Rheinfelden Frick, PV Bau/BSA	0.00		0.00			79.43		766'868.71	-766'868.71

Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer: INGE EP RF-BB
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau und BSA
Projektnummer: 90069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Aug

Projektleiter Bauherr: Nicole Schulz
Vertragsdatum: 22.10.2018
Vertragslaufzeit: 01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:
Inventarobjekt:
Phasen, beauftragt: EK/GP - AP/MK
Phasen, rapportiert: AP/MK

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

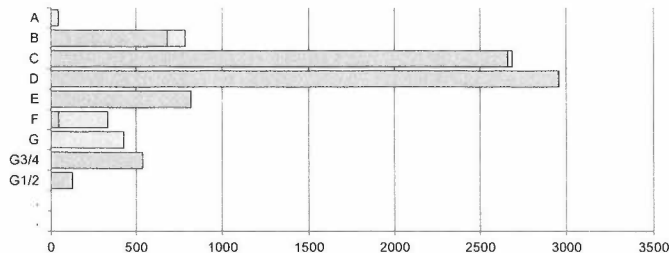

Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	43.75	1		42.75		2%
B	787.5	684.75		102.75		87%
C	1172.5	2662.25	25.75		1515.5	229%
D	1531.25	2955.5	5.5		1429.75	193%
E	481.25	820.75			339.5	171%
F	332.5	45.25		287.25		14%
G	428.75			428.75		
G3/4		538			538	
G1/2		128.5			128.5	
Σ	4777.5	7836	31.25	861.5	3951.25	165%

quantitative Selbststeinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbststeinschätzung 85%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach CHF 395'386
Kosten ist CHF 650'582
Kostenausschöpfung 164.54%
Stundenausschöpfung 165%

Stundenabrechnung																
Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Zusammenzug Std.			G3/4	348.75												348.75
			G1/2	114												114
			D	201.75												201.75
Roth			A	1												1
Forlin			B	463	27	9.5	0.5			0.25						500.25
Manlinger			B	2												2
Methner			B	182.5												182.5
Brauchli			C	1541	78.75	36.5	2.5		8.5	5.75	9.5					1682.5
Grieder			C	795	22.25	13.75	24	4	13	21	12.5	16.25				921.75
Hunziker			C	32.75												32.75
Stocker			C	49	2											51
Abdelmoghni			D	363.75	11.75	37.5	2		12.25	6.5	0.5					434.25
Boeglin			D	1												1
Brunner			D	3												3
Challandes			D	7.5												7.5
Deck			D	404	0.5											404.5
Dolder			D		2.5											2.5
Haberthur			D	228.5												228.5
Nosdeo			D								1.5					1.5
Nyffenegger			D													
Rothfuss			D	1025.5	6			3	3.5	19.5						1057.5
Seebacher			D	546.25	28.25	20	0.5		8.5	12	3.5					619
Tudisco			D													
Brüngger			E	599	12	7.5				12.5						631
Ladner			E	64.75	7.5	11.5										83.75
Müller			E	105.5												105.5
Russer			E	0.5												0.5
Kochli			F	45.25												45.25
Hegi			G3/4						11	9						20
Schreiber			G3/4	98.75												98.75
Aston			G3/4		18.5	52										
Schneider			G1/2	2.5	3.25	2			4.5	2.25						14.5
Total				7226.5	214.25	196.25	26.5	7	16	69.25	80.25	31.25				7867.25

Kostenabrechnung

Kostenabrechnung															
Ansatz (exkl. MwSt. inkl. Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
145.00	A	145													145.00
122.00	B	78'995	3'294	1'159		61			31						83'539.50
95.00	C	229'686	9'785	4'774	2'518	380	1'235	2'803	1'734	2'446					255'360.00
86.00	D	239'188	3'698	5'461		215	258	2'086	3'268	473					254'648.00
62.00	E	47'725	1'209	1'178					775						50'886.50
50.00	F	2'263													2'262.50
8.00	G														
6.00	G3/4	2'685	111	312				66	54						3'228.00
4.00	G1/2	466	13	8				18	9						514.00
Total Monat		601'551.75	18'110.00	12'891.75	2'517.50	656.00	1'493.00	4'972.00	5'870.25	2'919.25					650'581.50

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Muttenz 1 23.09.2022
Projektleiter Grieder Fabio
Ihre Referenz

Unsere Referenz 702288.0
MwSt.-Nr. CHE-459.227.258 MWST

Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Rechnung Nr. 70022928

Periode 01.08.2022 - 31.08.2022 ✓

Leistungsbeschreibung:
Rechnung I+LE 10

Eigene Leistungen	97.00 ✓
MWST 7.70 % von 97.00	7.47 ✓
Total Gesamtbetrag inkl. MWST	104.47 ✓

Alle Beträge in CHF
Zahlbar innert 30 Tage netto
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:
- Einzahlungsschein
- Rapporte

Detailbeleg Auftrag 702288.0_PH31_AP_IF + LE Installationensflächen und Landerwerb

Eigene Leistungen


Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202208	Grieder Fabio	1.00	95.00	95.00
Stundenleistung	C354 Architekt, Ingenieur (C)	1.00		95.00
202208	Schneider Anika	0.50	4.00	2.00
Stundenleistung	I Lehrling (1. + 2. LJ)	0.50		2.00
Total eigene Leistungen				97.00

Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt:	EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer:	INGE EP RF-BB
Vertrag Nr.:	000003
Vertragsgegenstand:	PV Bau und BSA
Projektnummer:	90069
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Aug

Projektleiter Bauherr	Nicole Schulz
Vertragsdatum:	22.10.2018
Vertragslaufzeit:	01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:	
Inventarobjekt:	
Phasen, beauftrag:	EK/GP - AP/MK
Phasen, rapportiert:	AP Installationsflächen + LE

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

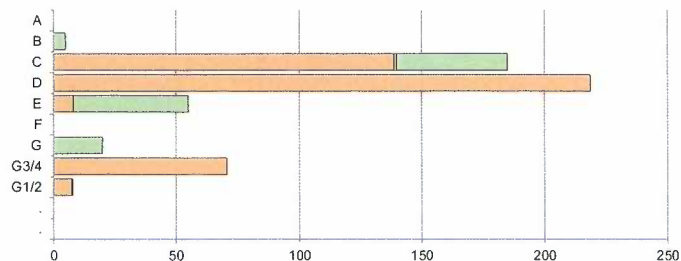

Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B	5.00			5		
C	185.00	138.75	1	45.25		76%
D	155.00	218.5			63.5	141%
E	55.00	8.25		46.75		15%
F						
G	20.00			20		
G3/4		70.25			70.25	
G1/2		7.5	0.5		8	
.						
Σ	420	443.25	1.5	117	141.75	108%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer	
Selbsteinschätzung	88%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)	
Kostendach	CHF 35'085
Kosten ist	CHF 33'032
Kostenausschöpfung	94.15%
Stundenausschöpfung	106%

[illegible]

Kostenabrechnung															
Ansatz <small>(evtl. MwSt., keine Rabatt!)</small>	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
145.00	A														
122.00	B														
95.00	C	7'885	1'666	2'019				594	998	95					13'276.25
86.00	D	9'095	5'440	4'042				86	129						18'791.00
62.00	E	186		326											511.50
50.00	F														
8.00	G														
6.00	G3/4	144	116	162											421.50
4.00	G1/2	8	6	4				4	8	2					32.00
Total Monat		17'317.50	7'247.25	6'552.25				683.75	1'134.50	97.00					33'032.25

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Muttenz 1 23.09.2022
Projektleiter Grieder Fabio
Ihre Referenz

Unsere Referenz 702288.0
MwSt.-Nr. CHE-459.227.258 MWST

Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Rechnung Nr. 70022927

Periode 01.08.2022 - 31.08.2022 ✓

Leistungsbeschreibung:
Rechnung AP Bypass 11

Eigene Leistungen	747.75 ✓
MWST 7.70 % von 747.75	57.58 ✓
Total Gesamtbetrag inkl. MWST	805.33 ✓

Alle Beträge in CHF
Zahlbar innert 30 Tage netto
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:
- Einzahlungsschein
- Rapporte

Detailbeleg Auftrag 702288.0_PH 31_AP BYPASS Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV
Bau/BSA

Projektkurzbezeichnung: EP RhFr

Projektnummer: 090069

AP Bypass

Eigene Leistungen

Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202208	Grieder Fabio	4.25	95.00	403.75
Stundenleistung	C354 Architekt, Ingenieur (C)	4.25		403.75
202208	Meier Karin	3.00	62.00	186.00
202208	Meier Vera	2.50	62.00	155.00
Stundenleistung	E376 Kaufm.-/Sekretariatspers.(E)	5.50		341.00
202208	Schneider Anika	0.75	4.00	3.00
Stundenleistung	I Lehrling (1. + 2. LJ)	0.75		3.00
Total eigene Leistungen				747.75




Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer: INGE EP RF-BB
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau und BSA
Projektnummer: 90069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Aug

Projektleiter Bauherr: Nicole Schulz
Vertragsdatum: 22.10.2018
Vertragslaufzeit: 01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:
Inventarobjekt:
Phasen, beauftragt: EK/GP - AP/MK
Phasen, rapportiert: AP Bypass

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

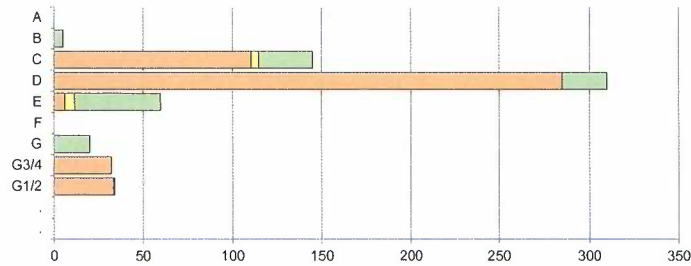

Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B	5.00			5		
C	145.00	110.25	4.25	30.5		79%
D	310.00	285.25		24.75		92%
E	60.00	6	5.5	48.5		19%
F						
G	20.00			20		
G3/4		32			32	
G1/2		33.25	0.75		34	
Σ	540	466.75	10.5	128.75	66	88%

quantitative Selbststeinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbststeinschätzung 87%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach CHF 44'925

Kosten ist CHF 36'450

Kostenausschöpfung 81.14%

Stundenausschöpfung 88%

Stundenabrechnung																
Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Grieder	Fabio	C	58	9	21.25				2.5	4	4.25					99
Hunziker	Livia	C	11.25						0.5	3.75						15.5
Abdelmoghni	Ahmed	D	59.25	17.5	34.5					0.5						111.75
Deck	Andreas	D	70													70
Dolder	Sivio	D	36.75	37	27.25											101
Hunziker	Livia	D	2													2
Seebacher	Andreas	D	0.5													0.5
Meier	Vera	E									2.5					2.5
Meier	Karin	E									3					3
Müller	Jan	E	5		1											6
Aston	Tim	G3/4			3.5											3.5
Hegi	Yannick	G3/4	28.5													28.5
Schneider	Anika	G1/2	12.5	5	14.5					1.25	0.75					34
Total				283.75	68.5	102			3	9.5	10.5					477.25

Kostenabrechnung															
Ansatz (exkl. MwSt., kein Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
145.00	A														
122.00	B														
95.00	C	6'579	855	2'019				285	736	404					10'877.50
86.00	D	14'491	4'687	5'311					43						24'531.50
62.00	E	310		62						341					713.00
50.00	F														
8.00	G														
6.00	G3/4	171		21											192.00
4.00	G1/2	50	20	58					5	3					136.00
Total Monat		21'600.75	5'562.00	7'470.25				285.00	784.25	747.75					36'450.00

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Muttenz 1 23.09.2022
Projektleiter Grieder Fabio
Ihre Referenz

Unsere Referenz 702288.0
MwSt.-Nr. CHE-459.227.258 MWST

Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Rechnung Nr. 70022926

Periode 01.08.2022 - 31.08.2022 ✓

Leistungsbeschreibung:
Rechnung AP SABA 13

Eigene Leistungen 285.00 ✓

MWST 7.70 % von 285.00 21.94 ✓

Total Gesamtbetrag inkl. MWST 306.94 ✓

Alle Beträge in CHF
Zahlbar innert 30 Tage netto
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

1.011110

Beilage:
- Einzahlungsschein
- Rapporte

Detailbeleg Auftrag 702288.0_PH 31_AP SABA AP SABA

Eigene Leistungen


Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202208	Grieder Fabio	3.00	95.00	285.00
Stundenleistung	C253 Leitender Ingenieur	3.00		285.00
Total eigene Leistungen				285.00

Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer: INGE EP RF-BB
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau und BSA
Projektnummer: 90069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Aug

Projektleiter Bauherr: Nicole Schulz
Vertragsdatum: 22.10.2018
Vertragslaufzeit: 01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:
Inventarobjekt:
Phasen, beauftragt: EK/GP - AP/MK
Phasen, rapportiert: AP SABA

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

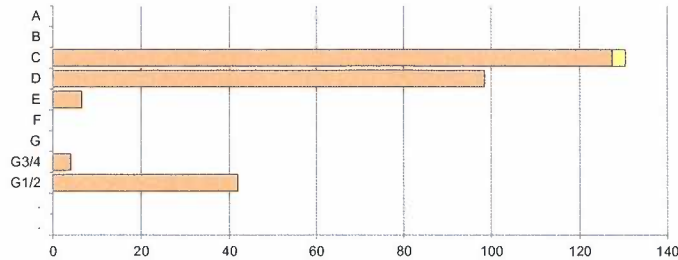

Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B						
C		127.5	3		130.5	
D		98.5			98.5	
E		6.5			6.5	
F						
G						
G3/4		4			4	
G1/2		42			42	
.						
Σ		278.5	3		281.5	

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach	
Kosten ist	CHF 21'464
Kostenausschöpfung	#DIV/0!
Stundenausschöpfung	

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Grieder	Fabio	C	16.75	1	3.5		3	1.25	5.5	4.5	3					38.5
Hunziker	Livia	C	10	14.25	41.5			1	11	14.25						92
Deck	Andreas	D	6													6
Dolder	Silvio	D	14.5	17.75	59.5											91.75
Seebacher	Andreas	D	0.75													0.75
Russer	Elisabeth	E			6.5											6.5
Aston	Tim	G3/4		4												4
Schneider	Anika	G1/2	7	13	12.5				5.5	4						42
Total			55	50	123.5		3	2.25	22	22.75	3					281.5

Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MwSt., kein Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
145.00	A														
122.00	B														
95.00	C	2'541	1'449	4'275		285	214	1'568	1'781	285					12'397.50
86.00	D	1'828	1'527	5'117											8'471.00
62.00	E			403											403.00
50.00	F														
8.00	G														
6.00	G3/4		24												24.00
4.00	G1/2	28	52	50				22	16						168.00
Total Monat		4'396.75	3'051.25	9'845.00		285.00	213.75	1'589.50	1'797.25	285.00					21'463.50

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH11 0076 9401 1371 0200 1
JAUSLIN STEBLER AG
Gartenstrasse 15
4132 Muttenz

Zahlbar durch (Name/Adresse)

┌

└

┌

└

Währung Betrag

CHF

┌

└

┌

└

Annahmestelle

Zahlteil



Konto / Zahlbar an
CH11 0076 9401 1371 0200 1
JAUSLIN STEBLER AG
Gartenstrasse 15
4132 Muttenz

Zahlbar durch (Name/Adresse)

┌

└

┌

└

Währung Betrag

CHF

┌

└

┌

└
