


Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt:	EP Sissach - Eptingen
Vertragnehmer:	INGE EPSI, c/o Jauslin+Stebler AG
Vertrag Nr.:	070017/000025
Vertragsgegenstand:	MK/AP TP1 Tunnel/Geotechnik
Vertragsteil:	gesamte Std. gemäss Vertrag
aktuelles Beobachtungsjahr:	2013
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	April


aktuelle Stundenausschöpfung

(Std. bisher/ Std. neu/ Std. Rest gem. Tabelle rechts)

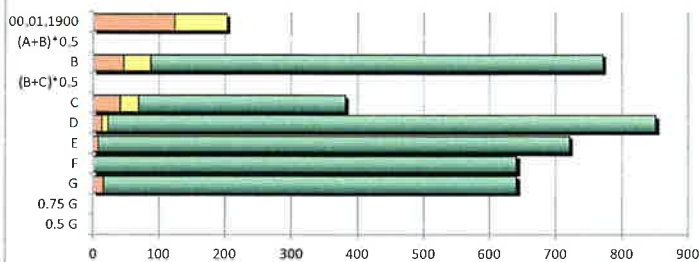

Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	0	0	0	0	0	0%
(A+B)*0.5	0	0	0	0	0	0%
B	770	46.5	40.25	683.25	0	11%
(B+C)*0.5	0	0	0	0	0	0%
C	380	40	29	311	0	18%
D	850	12.5	10	827.5	0	3%
E	720	7.5	0	712.5	0	1%
F	640	0	0	640	0	0%
G	640	15.5	0	624.5	0	2%
0.75 G	0	0	0	0	0	0%
0.5 G	0	0	0	0	0	0%
Σ	4000	122	79.25	0	201.25	5%

Gesamtübersicht



quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer	
Selbsteinschätzung	5%
rechnerische Auswertungen (exkl. MwSt. inkl. Rabatt)	
Kostendach	SFr. 352'440
Kosten ist	SFr. 23'644
Kostenausschöpfung	7%
Stundenausschöpfung	5%

Stundenabrechnung

Stundenabrechnung																	
Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total	
Bäumle	Michael	B	0				7									7	
Forlin	Sandro	B	0				0.5									0.5	
Müller	Stefan	B	0													0	
Nyfeier	Jürg	B	0	8.25	8.5	6.25	3.5									26.5	
Roth	Stefan	B	0	4.25	13.5	5.75	13.25									36.75	
Schädler	Beat	B	0				16									16	
																0	
																0	
Fuchs	Christian	C	0				16									16	
Henz	Ralph	C	0	2.5	7.75	18.75	12.5									41.5	
Herbst	Christian	C	0				0.5									0.5	
Zihmann	Niklaus	C				11										11	
																0	
Alt (ab 1.8.13)	Andreas	D	0													0	
Boeglin	Chantal	D	0	3.75	2.25	4	6.5									16.5	
Brändli	Markus	D	0		1.25											1.25	
Meister	Christine	D	0				2.5									2.5	
Moser-Andres	Catherine	D	0			0.75										0.75	
Stonig	Cesarina	D	0			0.5										0.5	
Ziegler	Bruno	D	0				1									1	
																0	
																0	
																0	
																0	
																0	
																0	
																0	
																0	
Kilcher-Frey	Debora	E	0		0.25											0.25	
Nyfeier	Edith	E	0	0.75												0.75	
Russer	Elisabeth	E	0		6.5											6.5	
																0	
																0	
																0	
Alt (bis 30.6.13)	Andreas	G	0			7										7	
Hirsig	Jasmin	G	0			8.5										8.5	
																0	
																0	
																0	
																0	
																0	
Total			0	19.5	40	62.5	79.25	0	0	0	0	0	0	0	0	201.25	
								Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SFr. 145.00	(A+B)*0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SFr. 140.00	B	0	1750	3080	1680	5635	0	0	0	0	0	0	0	0	12145	
	SFr. 129.00	(B+C)*0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SFr. 118.00	C	0	295	915	3511	3422	0	0	0	0	0	0	0	0	8143	
	SFr. 100.00	D	0	375	350	525	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	2250	
	SFr. 75.00	E	0	50	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	
	SFr. 60.00	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SFr. 35.00	G	0	0	0	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543	
	SFr. 35.00	0.75 G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SFr. 35.00	0.5 G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total			0	2476	4851	6258	10057	0	0	0	0	0	0	0	0	SFr. 23100	

Auftragsrapport Pfirter, Nyfeler + Partner AG

Auftrag: 479043.0000

Bezeichnung: **ASTRA, N02, EP SiEp, 070017, Geotechnik**

Periode: 01.01.2013 - 28.02.2013

Mitarbeiter: Nyfeler Jürg

Kategorie: B353 Leitender Ingenieur(B)

TP 1

Datum	Beschrieb	Stunden
21.01.2013	Projektbesprechung mit JSAG	1.75
25.01.2013	Unterlagen studiert, Sitzungsvorbereitung	0.50
28.01.2013	Vorbereitung und Sitzung in Zofingen	4.75
28.01.2013	Analyse der Objekte	0.75
31.01.2013	Koordination Auftrag	0.50
11.02.2013	Kopie der Besprechungsnotiz für he erstellt	0.25
11.02.2013	Daten abgelegt, Besprechung mit he betreffend dem weiteren Vorgehen	1.00
11.02.2013	Terminsuche für Besprechung Inge, Organisation	0.50
13.02.2013	Konzept Vorgehen und interne Organisation	0.25
15.02.2013	Organisation Termin Mail an Rotzler gelesen und abgelegt	0.25
19.02.2013	Vorgehen betreffend Sitzung nächste Woche festgelegt	0.25
21.02.2013	Vorbereitung Sitzung vom Montag	1.25
25.02.2013	Projektsitzung in Zofingen	3.00
25.02.2013	Vorbesprechung Henz bezüglich der Sitzung	0.75
27.02.2013	Stand Proekt mit he besprochen, Unterlagen für ihn bereit gelegt	0.50
28.02.2013	Vorbereitung mit he der Sitzung von morgen	0.50
Summe		16.75

=8.5

4

Auftragsrapport Jauslin + Stebler

Auftrag: 701323.0


Bezeichnung: **N02 EP Sissach - EptingenTP1 Tunnel / Geotechnik**

Periode: 01.02.2013 - 28.02.2013

Mitarbeiter: Roth Stefan

Kategorie: B353 Leitender Ingenieur(B)

Datum	Name extern	Stunden
04.02.2013	Vorbereitung und Besprechung bei R.Rotzler / Ablage Grunddaten / Einarbeitung	6.50
08.02.2013	Sichtung Unterlagen von Rapp (DVD)	3.00
14.02.2013	Eingegangene Daten Sichten (Archiv, Rapp, Kanal-TV, CAD)	4.00
Summe		13.50



Auftragsrapport Pfirter, Nyfeler + Partner AG

Auftrag: 479043.0000

Bezeichnung: **ASTRA, N02, EP SiEp, 070017, Geotechnik**

TP 1

Periode: 01.01.2013 - 28.02.2013

Mitarbeiter: Henz Ralph

Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

Datum	Beschrieb	Stunden
21.01.2013	Koordinationsbesprechung	2.00
23.01.2013	Datenzusammenstellung	0.25
25.01.2013	Projektbesprechung	0.25
04.02.2013	Grundlagenzusammenstellung	0.50
13.02.2013	Projektbesprechung	0.50
18.02.2013	Zusammenstellung Grundlagen; Grundlagenstudium	3.25
19.02.2013	Projektbesprechung	0.25
21.02.2013	Projektbesprechung; Klärung Inspektionsbedarf	1.50
22.02.2013	Ausarbeitung Vorschlag Inspektionen Anker	1.00
27.02.2013	Projektbesprechung	0.25
28.02.2013	Zusammenstellung Objekte Geotechnik	0.50
Summe		10.25

= 775

L

Auftragsrapport Pfirter, Nyfeler + Partner AG

Auftrag: 479043.0000

Bezeichnung: **ASTRA, N02, EP SiEp, 070017, Geotechnik**

Periode: 01.01.2013 - 28.02.2013

Mitarbeiter: Brändli Markus

Kategorie: D154 Ingenieur (D)

TP 1

Datum	Beschrieb	Stunden
21.02.2013	Besprechung intern	1.25
Summe		1.25

4

Auftragsrapport Pfirter, Nyfeler + Partner AG

Auftrag: 479043.0000
Bezeichnung: **ASTRA, N02, EP SiEp, 070017, Geotechnik**
Periode: 01.01.2013 - 28.02.2013
Mitarbeiter: Kilcher-Frey Debora Kategorie: E275 Kaufm.-/Sekretariatspers.(E)

TP 1

Datum	Beschrieb	Stunden
15.02.2013	Unterlagen Sitzung zusammenstellen, Unterstützung Projektleiter	0.25
Summe		0.25

6

Auftragsrapport Pfirter, Nyfeler + Partner AG

Auftrag: 479043.0000
Bezeichnung: **ASTRA, N02, EP SiEp, 070017, Geotechnik**
Periode: 01.01.2013 - 28.02.2013
Mitarbeiter: Nyfeler Jürg Kategorie: B353 Leitender Ingenieur(B)

TP 1

Datum	Beschrieb	Stunden
21.01.2013	Projektbesprechung mit JSAG	1.75
25.01.2013	Unterlagen studiert, Sitzungsvorbereitung	0.50
28.01.2013	Vorbereitung und Sitzung in Zofingen	4.75
28.01.2013	Analyse der Objekte	0.75
31.01.2013	Koordination Auftrag	0.50
11.02.2013	Kopie der Besprechungsnotiz für he erstellt	0.25
11.02.2013	Daten abgelegt, Besprechung mit he betreffend dem weiteren Vorgehen	1.00
11.02.2013	Terminsuche für Besprechung Inge, Organisation	0.50
13.02.2013	Konzept Vorgehen und interne Organisation	0.25
15.02.2013	Organisation Termin Mail an Rotzler gelesen und abgelegt	0.25
19.02.2013	Vorgehen betreffend Sitzung nächste Woche festgelegt	0.25
21.02.2013	Vorbereitung Sitzung vom Montag	1.25
25.02.2013	Projektsitzung in Zofingen	3.00
25.02.2013	Vorbesprechung Henz bezüglich der Sitzung	0.75
27.02.2013	Stand Proekt mit he besprochen, Unterlagen für ihn bereit gelegt	0.50
28.02.2013	Vorbereitung mit he der Sitzung von morgen	0.50
Summe		16.75

= 8,25

L

Auftragsrapport Pfirter, Nyfeler + Partner AG

Auftrag: 479043.0000

Bezeichnung: **ASTRA, N02, EP SiEp, 070017, Geotechnik**

Periode: 01.01.2013 - 28.02.2013

Mitarbeiter: Henz Ralph

Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

TP 1

Datum	Beschrieb	Stunden
21.01.2013	Koordinationsbesprechung	2.00
23.01.2013	Datenzusammenstellung	0.25
25.01.2013	Projektbesprechung	0.25
04.02.2013	Grundlagenzusammenstellung	0.50
13.02.2013	Projektbesprechung	0.50
18.02.2013	Zusammenstellung Grundlagen; Grundlagenstudium	3.25
19.02.2013	Projektbesprechung	0.25
21.02.2013	Projektbesprechung; Klärung Inspektionsbedarf	1.50
22.02.2013	Ausarbeitung Vorschlag Inspektionen Anker	1.00
27.02.2013	Projektbesprechung	0.25
28.02.2013	Zusammenstellung Objekte Geotechnik	0.50
Summe		10.25

L

Auftragsrapport Pfirter, Nyfeler + Partner AG

TP1

Auftrag: 479043.0000
Bezeichnung: **ASTRA, N02, EP SiEp, 070017, Geotechnik**
Periode: 01.01.2013 - 28.02.2013
Mitarbeiter: Nyfeler Edith Kategorie: E275 Kaufm.-/Sekretariatspers.(E)

Datum	Beschrieb	Stunden
24.01.2013	Unterstützung Projektleitung, Daten erfassen	0.50
31.01.2013	Unterstützung der Projektleitung, Daten erfassen	0.25
Summe		0.75

L

Auftrag:	701323.4000		
Bezeichnung:	N02 EP Sissach - EptingenProjektleitung		
Periode:	01.04.2013 - 30.04.2013		
Mitarbeiter:	Roth Stefan	Kategorie:	B353 Leitender Ingenieur(B)

4

TP1 (42%): 13,25
TP2 (27%): 8,50
TP3 (31%): 9,75
= 31,50

Auftragsrapport Jauslin + Stebler

Auftrag: 701323.4000
Bezeichnung: **N02 EP Sissach - EptingenProjektleitung**
Periode: 01.04.2013 - 30.04.2013
Mitarbeiter: Boeglin Chantal Kategorie: D375 Kaufm.-/Sekretariatspers.(D)

Datum	Name extern	Stunden
03.04.2013	Telefongespräch mit Fr. Meister AeBo, bereitstellen Dokumentvorlage	0.25
16.04.2013	Ändern Organigramm	0.50
17.04.2013	Protokoll PS 01/13 erstellen	3.50
24.04.2013	Vorbereiten Vorlagen Brief, Protokoll, Aktennotiz, Bericht, Logo, etc.	2.00
25.04.2013	Formular Massnahmenkonzept resp. Massnahmenprojekt erstellen, Brief betr. Organisationsänderungen erstellen	7.25
26.04.2013	Div. Unterstützung PL	0.75
29.04.2013	Div. Unterstützung PL	0.50
30.04.2013	Div. Unterstützung PL	0.50
Summe		15.25

Zuweisung auf TP's:

TP1 (42%):6.5.....

TP2 (27%):4.0.....

TP3 (31%):4.75.....
= 15.25

Auftrag:	701323.4000		
Bezeichnung:	N02 EP Sissach - Eptingen Projektleitung		
Periode:	01.03.2013 - 31.03.2013		
Mitarbeiter:	Roth Stefan	Kategorie:	B353 Leitender Ingenieur(B)
Datum	Name extern	Stunden	
01.03.2013	Arbeitsplanung / INGE-Arbeitssitzung	6.00	
11.03.2013	Erarbeitung Terminprogramm als Entwurf	4.00	
20.03.2013	Studium Unterlagen / Einlesen / ZU	4.00	
Summe		14.00	

4

TP1 (42%): 5.75

TP2 (27%): 3.75

TP3 (31%): 4.50

..... = 14.0

Auftragsrapport Jauslin + Stebler

Auftrag: 701323.4000
Bezeichnung: **N02 EP Sissach - EptingenProjektleitung**
Periode: 01.03.2013 - 31.03.2013
Mitarbeiter: Alt Andreas Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Name extern	Stunden
04.03.2013	Projektsichtung und Unterlagen aus Daten ablegen und strukturieren	1.00
11.03.2013	Projektsichtung und Unterlagen aus Daten ablegen und strukturieren	2.00
11.03.2013	Projektsichtung und Unterlagen aus Daten ablegen und strukturieren	4.00
12.03.2013	Projektsichtung und Unterlagen aus Daten ablegen und strukturieren	2.25
12.03.2013	Projektsichtung und Unterlagen aus Daten ablegen und strukturieren	3.75
12.03.2013	Projektsichtung und Unterlagen aus Daten ablegen und strukturieren	2.50
18.03.2013	Projektsichtung und Unterlagen aus Daten ablegen und strukturieren	1.00
Summe		16.50

Zuweisung auf TP's:

TP1 (42%): 7.0
TP2 (27%): 4.5
TP3 (31%): 5.0
= 16.5

Auftragsrapport Jauslin + Stebler

Auftrag: 701323.4000
Bezeichnung: **N02 EP Sissach - Eptingen** Projektleitung
Periode: 01.03.2013 - 31.03.2013
Mitarbeiter: Boeglin Chantal Kategorie: D375 Kaufm.-/Sekretariatspers.(D)

Datum	Name extern	Stunden
08.03.2013	Unterstützung PL, Projektadmin.	0.50
12.03.2013	Präsentation ergänzen	3.00
12.03.2013	Unterlagen für PL zusammenstellen	2.50
14.03.2013	Abklärungen Versicherung	0.50
15.03.2013	Std. Cash entwerfen, MA-Liste aktualisiert	1.50
26.03.2013	MA Liste für PL bereitstellen, Organigramm anpassen	1.50
Summe		9.50

4

Zuweisung auf TP's:

TP1 (42%): 4.0
TP2 (27%): 2.5
TP3 (31%): 3.0
= 9.5

Auftragsrapport Jauslin + Stebler

Auftrag: 701323.4000

Bezeichnung: **N02 EP Sissach - EptingenProjektleitung**

Periode: 01.03.2013 - 31.03.2013

Mitarbeiter: Stonig Cesarina

Kategorie: D375 Kaufm.-/Sekretariatspers.(D)

Datum	Name extern	Stunden
28.03.2013	Unterstützung PL: Organigramm anpassen	0.50
Summe		0.50

Zuweisung auf TP's:

TP1 (42%): 0.5

TP2 (27%):

TP3 (31%):
= 0.5

Auftragsrapport Jauslin + Stebler

Auftrag: 701323.4000
Bezeichnung: **N02 EP Sissach - Eptingen** Projektleitung
Periode: 01.02.2013 - 28.02.2013
Mitarbeiter: Boeglin Chantal Kategorie: D375 Kaufm.-/Sekretariatspers.(D)

Datum	Name extern	Stunden
01.02.2013	MA-Liste überarbeiten	0.75
06.02.2013	Stunden Cash erstellen, Unterstützung PL, Anpassungen Vertec	2.00
08.02.2013	Unterlagen für PL zusammenstellen und versenden	1.50
12.02.2013	Unterstützung PL	1.00
Summe		5.25

Zuweisung auf TP's:

TP1 (42%): 2.25

TP2 (27%): 1.5

TP3 (31%): 1.5
= 5.25

Auftragsrapport Jauslin + Stebler

Auftrag: 701323.4000
Bezeichnung: **N02 EP Sissach - Eptingen** Projektleitung
Periode: 01.02.2013 - 28.02.2013
Mitarbeiter: Russer Elisabeth Kategorie: E376 Kaufm.-/Sekretariatspers.(E)

Datum	Name extern	Stunden
06.02.2013	EK I u. II bereitstellen	2.50
07.02.2013	EK I u. II bereitstellen	2.00
08.02.2013	EK I u. II bereitstellen	2.25
11.02.2013	EK I u. II bereitstellen	3.00
12.02.2013	EK I u. II bereitstellen	2.50
14.02.2013	EK I u. II bereitstellen	2.00
15.02.2013	EK I u. II bereitstellen	1.00
Summe		15.25

4

Zuweisung auf TP's:

TP1 (42%): 6.5

TP2 (27%): 4.0

TP3 (31%): 4.75

Auftragsrapport Jauslin + Stebler

Auftrag: 701323.4000

Bezeichnung: **N02 EP Sissach - Eptingen** Projektleitung

Periode: 01.01.2013 - 31.01.2013

Mitarbeiter: Roth Stefan

Kategorie: B353 Leitender Ingenieur(B)

Datum	Name extern	Stunden
22.01.2013	Studium Unterlagen / Startsituation - Organisationen	2.00
23.01.2013	Unterlagen Studium / Vorbereitungsarbeiten	2.00
28.01.2013	Vorbereitung, Startsituation, Auswertung und Massnahmen	6.00
Summe		10.00

h

Zuweisung auf TP's:

TP1 (42%): 4.25

TP2 (27%): 2.75

TP3 (31%): 3.0
= 10.0

Auftragsrapport Jauslin + Stebler

Auftrag: 701323.4000
Bezeichnung: **N02 EP Sissach - Eptingen** Projektleitung
Periode: 01.01.2013 - 31.01.2013
Mitarbeiter: Boeglin Chantal Kategorie: D375 Kaufm.-/Sekretariatspers.(D)

Datum	Name extern	Stunden
21.01.2013	EP SIEP bereitstellen	3.00
21.01.2013	Projektstruktur anlegen	1.50
25.01.2013	Unterlagen für PL bereitstellen	2.00
29.01.2013	Zuarbeit PL: Projekt anlegen	1.00
30.01.2013	Unterlagen für PL bereitstellen	0.50
31.01.2013	Erstellen Entwurf Telefonliste	0.75
Summe		8.75

2

Zuweisung auf TP's:

TP1 (42%): 3.75

TP2 (27%): 2.25

TP3 (31%): 2.75

13 Gesamtbelastungen nach Mitarbeitern und Honorarklassen

Zeitraum: von 01.01.13 bis 30.04.13

Mitarbeiter	Zelttarif Stunden:	Kostentarif Stunden:	Ø Tarif	Total
BS.N.09246.100. ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen, Projektleitung / ASTRA F3, N02, EP Si				
Beat Schädler	38.00		140.00	5'320.00
TOTAL Honorarklasse N2 SIEP B	38.00	0.00	140.00	5'320.00
Christian Fuchs	36.50		118.00	4'307.00
TOTAL Honorarklasse N2 SIEP C	36.50	0.00	118.00	4'307.00
Christine Meister	1.00		100.00	100.00
Agnes Beuret	5.00		100.00	500.00
TOTAL Honorarklasse N2 SIEP D	6.00	0.00	100.00	600.00
TOTAL Projekt BS.N.09246.100.	80.50	0.00	127.04	10'227.00

Zuweisung auf TP's:
 TP 1 (4'000 $\hat{=}$ 42%)

Kat. B
 Kat. C
 Kat. D

16h
 16h
 2,5h

gebucht auf
 April
 B. Schädler
 C. Fuchs
 C. Meister

TP 2 (2'600 $\hat{=}$ 27%)

Kat. B
 Kat. C
 Kat. D

10h
 10h
 1,5h

TP 3 (3'000 $\hat{=}$ 31%)

Kat. B
 Kat. C
 Kat. D

11,5h
 11,5h
 1,5h

Total

80,5h

77 Regierapport 01.01.13 - 30.04.13

Projekt: BS.N.09246.100.ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen, Projektleitung / ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen

Vertrags-Nr.:

PL Auftraggeber:

Projektleiter AeBo: FCh

Mitarbeiter: 4155 Schädler Beat

Datum	Tätigkeit	Spesen	Zeit (h)
28.01.13	P-S Zustandsuntersuchung		3.00
04.02.13	Bilaterale Besprechung PV-BHU inkl Sichtung Unterlagen		2.00
28.02.13	Analyse Leistungserbringung		1.00
01.03.13	IG-Sitzung inkl Vorbereitung		3.00
15.03.13	Verifikation Planungsterminprogramm sowie Koordination HI		2.00
25.03.13	Planung der Planung, sowie IG-Sitzung		5.00
27.03.13	Koreferat Terminprogramm, Einsatzkonzept INGE, Organigramm bereinigen		5.00
28.03.13	Koreferat der Unterlagen Projektleitung		1.00
03.04.13	Koordination HI und Bereinigung Organisation und Terminplanung		3.00
11.04.13	Studium Grundlagen		1.00
12.04.13	Vorgehenskonzept Kunstbauten		2.00
15.04.13	P-S, sowie INGE-interne Koordination		4.00
29.04.13	INGE-Sitzung, Analyse Ausgangslage gem. Stellungnahme FU		3.00
30.04.13	AeBo-Team, Koordination der Arbeiten, Planung der Planung		3.00
Total von 4155 Schädler Beat für BS.N.09246.100.			38.00



77 Regierapport 01.01.13 - 30.04.13

Projekt: BS.N.09246.100.ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen, Projektleitung / ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen

Vertrags-Nr.:

PL Auftraggeber:

Projektleiter AeBo: FCh

Mitarbeiter: 4263 Fuchs Christian

Datum	Tätigkeit	Spesen	Zeit (h)
04.02.13	Besprechung Koordination Arbeiten EP SiEp mit Rapp (R.Rotzler)		2.00
11.02.13	Verifikation von Grundlagen, insb. erhaltenen Vermessungsinformationen in Lage und Höhe		2.00
25.02.13	Vorbereiten und Teilnahme Bespr. Zustandserfassung, Recherche weiteren Grundlagen (Bauwerke) gem Besprechung		4.50
27.02.13	Projektinitialisierung, Zusammenstellen von Grundlagen Tu, K und T/U		3.50
28.02.13	Projektinitialisierung, Zusammenstellen von Grundlagen Tu, K und T/U		3.50
11.03.13	Einlesen und Grundlagenstudium Tu + K., Ermitteln Aufwand und Umfang von zus. Inspektionen		3.50
12.03.13	Einlesen und Grundlagenstudium Tu + K., Pendenzen aus Besprechung Zustandsuntersuchung erledigen		3.00
19.03.13	Prüfen Pendenz zu Objekt 5.407 mit Vermessung		0.50
25.03.13	Vorbereitung und Teilnahme an INGE Sitzung		4.00
02.04.13	Grundlagenstudium & Ablage Dokumente ASTRA&Dritte		2.00
17.04.13	Aufbereiten/Ablage Projektunterlagen, Korresp. mit S. Roth, Studium Unterlagen		2.00
29.04.13	Vorbereiten und Teilnahme an INGE-Sitzung		2.00
30.04.13	Vorbereitung und Durchführung Projektstart mit TPL Tu, K & LSW		4.00
Total von 4263 Fuchs Christian für BS.N.09246.100.			36.50

07.05.2013 / FCh

SW

77 Regierapport 01.01.13 - 30.04.13

Projekt: BS.N.09246.100.ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen, Projektleitung / ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen

Vertrags-Nr.:

PL Auftraggeber:

Projektleiter AeBo: FCh

Mitarbeiter: 4245 Meister Christine

Datum	Tätigkeit	Spesen	Zeit (h)
03.04.13	Projektadministration, Anpass.Vorlage, Scan, Kopien, Versand Dok. per Post + Mail in Vertretung von A. Beuret		1.00
Total von 4245 Meister Christine für BS.N.09246.100.			1.00

07.05.13 / Ce. Kaiser

SW

77 Regierapport 01.01.13 - 30.04.13

Projekt: BS.N.09246.100.ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen, Projektleitung / ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen

Vertrags-Nr.:

PL Auftraggeber:

Projektleiter AeBo: FCh

Mitarbeiter: 4352 Beuret Agnes

Datum	Tätigkeit	Spesen	Zeit (h)
15.04.13	Protokolle ZU für Shd ausdrucken, neue Protokoll-Ordner im Explorer erstellen		0.50
17.04.13	Diverse E-Mails z.B. betr. Rechnungsstellung etc. ausdrucken und ablegen		1.00
29.04.13	Div. Unterlagen ausdrucken und ablegen, Dokumente für Startsituation per E-Mail an MA zur Vorbereitung senden		2.00
30.04.13	Startsituation, Projektstammblatt ausfüllen und ablegen von aktualisieren MA-Listen, Organigrammen etc.		1.50
Total von 4352 Beuret Agnes für BS.N.09246.100.			5.00

Beuret 07.05.13

SW

77 Regierapport 01.01.13 - 30.04.13

Projekt: BS.N.09246.400.ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen, TP1, Tunnel/Geotechnik / ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen

Vertrags-Nr.:

PL Auftraggeber:

Projektleiter AeBo: FCh

Mitarbeiter: 4179 Bäumle Michael

Datum	Tätigkeit	Spesen	Zeit (h)
19.04.13	Unterlagen sichten Protokolle lesen, Termine, Kosten		2.00
26.04.13	Geologie Oberbrug u. Ebenrain organisiert und gesichtet		1.50
29.04.13	Unterlagen sichten		1.00
30.04.13	Interne Startsitung, Liste f. best. PAW-Unterlagen ergänzt		2.50
Total von 4179 Bäumle Michael für BS.N.09246.400.			7.00

Baum / 07.05.13

Stil

Auftragsrapport Jauslin + Stebler

Auftrag: 701323.0

Bezeichnung: **N02 EP Sissach - EptingenTP1 Tunnel / Geotechnik**

Periode: 01.04.2013 - 30.04.2013

Mitarbeiter: Herbst Christian

Kategorie: B353 Leitender Ingenieur(B)

Datum	Name extern	Stunden
04.04.2013	Einsicht Tabelle mit Objektzuteilung	0.50
Summe		0.50

5

Auftragsrapport Pfirter, Nyfeler + Partner AG

Auftrag: 479043.0000
Bezeichnung: **N02, EP Sissach - Eptingen / TP1, Tunnel/Geotechnik, Phase MK/AP**
Periode: 01.04.2013 - 30.04.2013
Mitarbeiter: Nyfeler Jürg Kategorie: B353 Leitender Ingenieur(B)

Datum	Beschrieb	Stunden
09.04.2013	Info von Sandro, dass Mauern untersucht werden. PNP wird teilweise daran teilnehmen	0.50
12.04.2013	Koordination und Absprache Startsituation mit he	0.25
15.04.2013	Bearbeitung Projekt	0.50
25.04.2013	Bearbeitung Inspektion	0.50
28.04.2013	vertrag studiert, Vorgehen Geologie analysiert	0.50
29.04.2013	bearbeitung Konzept	1.00
30.04.2013	Organigramm studiert, ablage	0.25
Summe		3.50

J. Sissach

Auftragsrapport Pfirter, Nyfeler + Partner AG

Auftrag: 479043.0000

Bezeichnung: **N02, EP Sissach - Eptingen / TP1, Tunnel/Geotechnik, Phase MK/AP**

Periode: 01.04.2013 - 30.04.2013

Mitarbeiter: Henz Ralph

Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

Datum	Beschrieb	Stunden
09.04.2013	Datenablage	0.25
15.04.2013	Projektsitzung	3.50
15.04.2013	Vorbereitung Startsituation; Datenablage; Sichtung Unterlagen	1.50
16.04.2013	Sichtung- + Zusammenstellung Grundlagen	1.00
22.04.2013	Zusammenstellung fehlende Grundlagen	0.75
24.04.2013	Prüfung Inspektionsbedarf Obj. 6.303	0.25
25.04.2013	Bedarfsmeldung Grundlagen Obj. Geotechnik	1.00
26.04.2013	Sichtung und Ablage Daten	1.50
29.04.2013	Planungssitzung INGE	2.50
30.04.2013	Datenablage	0.25
Summe		12.50



77 Regierapport 01.01.13 - 30.04.13

Projekt: BS.N.09246.400.ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen, TP1, Tunnel/Geotechnik / ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen

Vertrags-Nr.:

PL Auftraggeber:

Projektleiter AeBo: FCh

Mitarbeiter: 4147 Ziegler Bruno

Datum	Tätigkeit	Spesen	Zeit (h)
29.04.13	Zusammentragen Unterlagen Geologie Tunnel Ebenrain/Oberburg		1.00
Total von 4147 Ziegler Bruno für BS.N.09246.400.			1.00

2.5.13 FCh
JH

Auftragsrapport Pfirter, Nyfeler + Partner AG

TP 1

Auftrag: 479043.0000
Bezeichnung: **ASTRA, N02, EP SiEp, 070017, Geotechnik**
Periode: 01.03.2013 - 31.03.2013
Mitarbeiter: Nyfeler Jürg Kategorie: B353 Leitender Ingenieur(B)

Datum	Beschrieb	Stunden
01.03.2013	Projektbesprechung und Koordination in Basel	3.00
11.03.2013	Projektbearbeitung	1.00
20.03.2013	Mailverkehr gelesen und Unterlagen studiert	0.50
21.03.2013	Projektbesprechung	0.25
25.03.2013	Konzept wie Vorgehen mit he diskutiert. Ny will zuerst wissen welche Objekte zu bearbeiten sind. EK, Stellungnahme dazu, Beurteilung PNP	1.50
Summe		6.25

6

Auftragsrapport Pfirter, Nyfeler + Partner AG

TP 1

Auftrag: 479043.0000

Bezeichnung: **ASTRA, N02, EP SIEp, 070017, Geotechnik**

Periode: 01.03.2013 - 31.03.2013

Mitarbeiter: Henz Ralph

Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

Datum	Beschrieb	Stunden
01.03.2013	Projektsitzung INGE	2.50
12.03.2013	Projektbesprechung	0.25
14.03.2013	Sichtung und Zusammenstellung Grundlagen SSS; Studium Terminprogramm	2.50
19.03.2013	Projektbesprechung	0.25
20.03.2013	Prüfung Leistungsumfang Steinschlagschutz; Termiprogramm	1.25
22.03.2013	Besprechungsvorbereitung; Leistungsabgrenzung	2.00
25.03.2013	Projektsitzung INGE; Bearbeitung Auftragsabgrenzung; Projektbesprechung	6.75
26.03.2013	Stellungnahme betr. Objekten Geotechnik; Grundlagenzusammenstellung	1.25
27.03.2013	Projektaufgleisung / -koordination	1.75
28.03.2013	Datenablage	0.25
Summe		18.75

4

Auftragsrapport Pfirter, Nyfeler + Partner AG

TP 1

Auftrag: 479043.0000
Bezeichnung: **ASTRA, N02, EP SiEp, 070017, Geotechnik**
Periode: 01.03.2013 - 31.03.2013
Mitarbeiter: Zihlmann Niklaus Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Beschrieb	Stunden
26.03.2013	Ustü PL, Ornderstruktur, Bereinigung Grundlagen	2.75
27.03.2013	Ustü PL	8.25
Summe		11.00

h

Auftragsrapport Pfirter, Nyfeler + Partner AG

TP 1

Auftrag: 479043.0000
Bezeichnung: **ASTRA, N02, EP SiEp, 070017, Geotechnik**
Periode: 01.03.2013 - 31.03.2013
Mitarbeiter: Moser-Andres Catherine Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Beschrieb	Stunden
19.03.2013	Abschätzung Aufwand pro Objekt	0.75
Summe		0.75

6

Auftragsrapport Jauslin + Stebler

Auftrag: 701323.0

Bezeichnung: **N02 EP Sissach - EptingenTP1 Tunnel / Geotechnik**

Periode: 01.03.2013 - 31.03.2013

Mitarbeiter: Hirsig Jasmine

Kategorie: H

Lehrling (3. + 4. LJ)

Datum	Name extern	Stunden
27.03.2013	Grundlagen Kunstbauten bereitstellen	2.50
28.03.2013	Grundlagen Kunstbauten bereitstellen	6.00
Summe		8.50

