

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.09.2019 bis 30.09.2019


Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09246	ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen	Projektleiter	Beat Schädler
PLA	210	TP2, MP Trasse & Umwelt	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	S. Roth / J + S AG
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	070017/000025

Mitarbeiter: Stefan Hagen

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
210	26.09.2019	Brief für Eigentümer anpassen. Lesen im Leitfaden wegen Frist bis Abschluss der Massnahmen an Gebäuden. Mail mit den Schreiben verschickt.	2.50
Subtotal			2.50

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:

30.10.2019 

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:


 30.10.2019


Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt:	EP Sissach - Eptingen
Vertragnehmer:	INGE EPSI, c/o Jauslin+Stebler AG
Vertrag Nr.:	070017/000025
Vertragsgegenstand:	Submission TP2 Trasse&Umwelt
Vertragsteil:	gesamte Std. gemäss Vertrag + NO10
aktuelles Beobachtungsjahr:	2019
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	September

Falsches Deckblatt wenn es um die Schallschutzfenster geht.
=> Phase MP/DP

aktuelle Stundenausschöpfung

(Std. bisher/ Std. neu/ Std. Rest gem. Tabelle rechts)

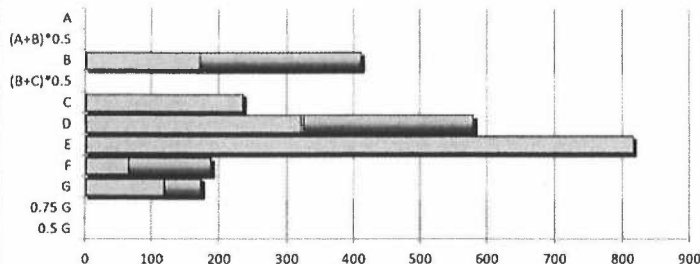

Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überlag	Std. Verbrauch
A	0	0	0	0	0	0%
(A*B)*0.5	0	0	0	0	0	0%
B	410	171,5	0	238,5	0	42%
(B*C)*0.5	0	0	0	0	0	0%
C	216	234,25	0	0	18,75	8%
D	579	320	4,5	254,5	0	55%
E	316	815	0	0	499	15%
F	188	65,5	0	122,5	0	35%
G	174	116,5	0	55,5	0	55%
0.75 G	0	0	0	0	0	0%
0.5 G	0	0	0	0	0	0%
Z	1553	1724,75	4,5	0	1720,25	92%

Gesamtübersicht



quantitative Selbsteneinschätzung seitens Auftraggeber		
	Selbsteneinschätzung	88%
technische Auswertungen (z.B. MYSYS, Inki, Rabat)		
	Kostendach	SFr. 181'858.00
	Kosten lat.	SFr. 153'304.00
	Kostenausschöpfung	84%
	Stundenausschöpfung	92%

[illegible]

Kostenabrechnung																
ASSET																
Cost Month - 1st Entry	Kategorie	Vorgabe	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Ok	Nov	Dez	Total	
SFr. 150.00	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SFr. 145.00	(A+B)*0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SFr. 140.00	B	22'785	105	0	0	0	210	280	35	595	0	0	0	0	0	24010
SFr. 129.00	(B+C)*0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SFr. 118.00	C	26'314	0	0	0	0	0	443	413	472	0	0	0	0	0	27'642
SFr. 100.00	D	30'700	0	0	0	0	0	600	550	150	450	0	0	0	0	32'450
SFr. 75.00	E	56'231	0	0	0	0	56	600	2'363	1'875	0	0	0	0	0	61'125
SFr. 80.00	F	3'210	0	0	0	0	0	480	0	240	0	0	0	0	0	3'330
SFr. 35.00	G	4'148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4'148
SFr. 35.00	0.75 G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SFr. 35.00	0.5 G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		143'388	105	0	0	0	266	2'403	3'361	3'332	450	0	0	0	0	SFr. 183'304

6-
