


Projekt:	EP Sissach - Eptingen
Vertragnehmer:	INGE EPSI, c/o Jauslin+Stebler AG
Vertrag Nr.:	070017/000025
Vertragsgegenstand:	Submission TP2 Trasse+Umwelt
Vertragsteil:	gesamte Std. gemäss Vertrag + NO10 + NO11
aktuelles Beobachtungsjahr:	2020
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Juli

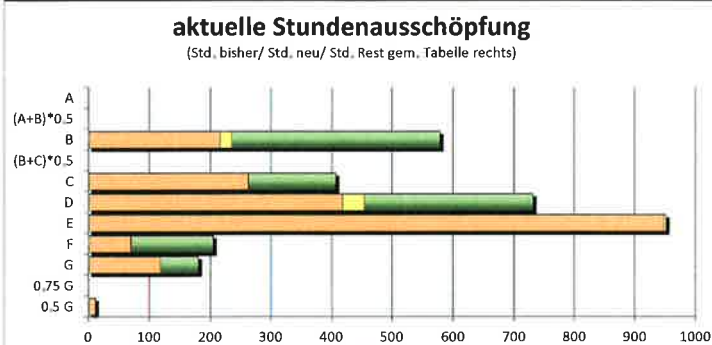

Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
(A+B)*0.5						
B	579	216.25	19.25	343.5		41%
(B+C)*0.5						
C	407	262.75	0.5	143.75		65%
D	731.5	418	36	277.5		62%
E	382.5	948.75	3.25		569.5	249%
F	205	70		135		34%
G	181	118.5		62.5		66%
0.75 G						
0.5 G		11.75			11.75	
Σ	2485	2046	59		2105	85%

Kategorie	Prozent
Selbsteinschätzung	78%
Kostenausschöpfung	76%
Stundenausschöpfung	85%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer		
	Selbsteinschätzung	78%
rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt, inkl. Rabatt)		
	Kostendach	SFr. 249'558.50
	Kosten Ist	SFr. 189'592.25
	Kostenausschöpfung	76%
	Stundenausschöpfung	85%

[illegible]

Kostenabrechnung															
Ansatz (soll: Mdr, hat: Hdr)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
SFr. 150.00	A														
SFr. 145.00	(A+B)*0.5														
SFr. 140.00	B	26'915	980	175	1'260	140	245	560	2'695						32'970
SFr. 129.00	(B+C)*0.5														
SFr. 118.00	C	28'792	502	502	1'210				59						31'064
SFr. 100.00	D	32'125	525	3'075	4'250	275	500	1'050	3'600						45'400
SFr. 75.00	E	61'238	1'875	1'875	5'456	638		75	244						71'400
SFr. 60.00	F	3'930			270										4'200
SFr. 35.00	G	4'148													4'148
SFr. 35.00	0.75 G														
SFr. 35.00	0.5 G			88				324							411
Total		157'147	3'882	5'714	12'446	1'053	745	2'009	6'508						SFr. 189'592

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.07.2020 bis 31.07.2020


Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09246	ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	100	ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen, Projektleitung	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	S. Roth / J + S AG
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	070017/000025

Mitarbeiter: Peter Beck

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
100	20.07.2020	Rückmeldung und Kommentar zu Konzept Befahrung Si-Ep, inkl Datenkatalog, -erfassung, -austausch	2.00
Subtotal			2.00


Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:


 6.8.20

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:


 5.8.20

Zuweisung Projektleitung Phase 41

TP1 (44%): 1.0
 TP2 (22%): 0.25
 TP3 (34%): 0.75
 Total: 2.00

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.07.2020 bis 31.07.2020

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09246	ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	100	ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen, Projektleitung	PLA Leiter	Lorenzo Falzone
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	S. Roth / J + S AG
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	070017/000025

Mitarbeiter: Lorenzo Falzone

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
100	06.07.2020	Arbeiten am Projekt, Erstellen von Projektunterlagen WTQ	10.25
100	07.07.2020	Arbeiten am Projekt, Erstellen von Projektunterlagen WTQ	5.75
100	08.07.2020	Arbeiten am Projekt, Erstellen von Projektunterlagen WTQ	1.00
100	09.07.2020	Arbeiten am Projekt, Erstellen von Projektunterlagen WTQ	4.00
100	13.07.2020	Arbeiten am Projekt, Erstellen von Projektunterlagen, Analyse PEP Phase 52	1.00
100	20.07.2020	Prüfung Konzept MLS-Aufnahmen	3.00
100	21.07.2020	Prüfung Konzept MLS-Aufnahmen	3.50
		Arbeiten an Submissionsauswertung	
		Arbeiten an Studie WTQ	
100	22.07.2020	Arbeiten an Submissionsauswertung	6.75
		Arbeiten an Studie WTQ	
100	23.07.2020	Arbeiten an Submissionsauswertung	7.75
		Preisanalysen	
100	24.07.2020	Arbeiten an Submissionsauswertung	6.50
100	27.07.2020	Arbeiten am Projekt, Auswertung Submission Baumeister	7.25
100	28.07.2020	Arbeiten am Projekt, Auswertung Submission Baumeister	1.00
100	29.07.2020	Arbeiten am Projekt, Auswertung Submission Baumeister	9.00
100	30.07.2020	Arbeiten am Projekt, Auswertung Submission Baumeister	7.00
100	31.07.2020	Arbeiten am Projekt, Auswertung Submission Baumeister	4.25
Subtotal			78.00

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:

5.8.20

Zuweisung Projektleitung Phase 41

TP1 (44%): 34.5

TP2 (22%): 17.0

TP3 (34%): 26.5

Total: 78.0

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.07.2020 bis 31.07.2020

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09246	ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	512	Akustik	PLA Leiter	Lionel Rey
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	S. Roth / J + S AG
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	070017/000025

Mitarbeiter: Lionel Rey

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
512	20.07.2020	N02 EP SiEp, Akustik, DP SSF: Koordination / Strategie weiteres Vorgehen DP SSF nach Besprechung mit Eigentümer der Liegenschaft Neuhaus 15 in Diegten	0.50
512	31.07.2020	N02 EP SiEp, Akustik, DP SSF: Planung weiteres Vorgehen für Vereinbarungen SSF beim Haus Bläumatt 14 und Neuhaus 15 in Diegten + diesbezügliche Korrespondenz mit Auftraggeber inkl. Vorgehensvorschlag	1.50
			Subtotal 2.00

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:

7.08.2020



Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

5.8.20




Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.07.2020 bis 31.07.2020


Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09246	ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	220	TP2, T-U, Submission	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	S. Roth / J + S AG
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	070017/000025

Mitarbeiter: Christian Fuchs

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
220	14.07.2020	Verkehrsführung für Erstellung Ausf.unterlagen sichten & grobprüfen	0.50
Subtotal			0.50

Unterschrift Mitarbeiter:



Datum:


 5.8.20

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

5.8.20

Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 701323.4002 Periode 01.07.2020 - 31.07.2020

Bezeichnung **N02 EP Sissach - Eptingen - Projektleitung
Phase 41**

Mitarbeiter Boeglin Chantal (cd) Kategorie: D375 Kaufm./Sekretariatspers.(D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
27.07.2020	Unterstützung Datenbaufbereitung für Bewertung	0.50
30.07.2020	Zusammenstellen Texte für Bewertung	1.00
Summe		1.50

C. Boeglin

Zuweisung Projektleitung Phase 41

TP1 (44%): 0.75

TP2 (22%): 0.25

TP3 (34%): 0.50

Total: 1.50

[Signature]


Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.07.2020 bis 31.07.2020

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09246	ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	512	Akustik	PLA Leiter	Lionel Rey
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	S. Roth / J + S AG
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	070017/000025


Mitarbeiter: Stefan Hagen

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
512	14.07.2020	Aufwandschätzung erstellt an RL abgegeben. Kurze Besprechung mit RL. Telefonat mit Eigentümer Neuhaus 15, Begehungstermin vereinbart. AKP Unterlagen bearbeitet.	3.00
512	16.07.2020	AKP SSF Aufnahmen Liegenschaft Neuhaus 15, Diegten. Ausführliches Gespräch mit dem Eigentümer. Fahrwege und Telefonat.	4.50
512	20.07.2020	Besprechung mit RL über Stand und das weitere Vorgehen. Telefonat.	1.00
Subtotal			8.50

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum: 6.8.2020 

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum: 5.8.20 

Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 701323.4002 Periode 01.07.2020 - 31.07.2020
Bezeichnung **N02 EP Sissach - Eptingen - Projektleitung Phase 41**

Mitarbeiter Malfatti Marco (mma) Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
16.07.2020	Erhalt physische Offerten Baumeister.	1.00
17.07.2020	Sichtung und Ablage Offerten. Interne Info an St. Roth und M. Palumbo.	3.50
20.07.2020	Vollständigkeitsprüfung und Durchsicht Offerten. Sichten diverse Infos und Vorlagen von J. Merian. Vorbereitung Ablage. Prüfung Vermessungskonzept.	6.00
21.07.2020	Prüfung Vermessungskonzept und Zusammentragen div. Punkte inkl. interner Abklärung. Durchsicht und Ablage Offerten. Vorbereitung Evaluationsablauf.	3.00
22.07.2020	Koord. Absage PS. INGE interne Zustellung der Offerten. Mitteilung mit Info zu Konzept Vermessungsaufnahmen. Vorbereitung Zuständigkeitsverteilung INGE-intern. Prüfung Termine und Abgleich mit Ausschreibungsplan.	3.75
23.07.2020	Einlesen Angebotespreise. Erstellung Vergleich je Heft. INGE-Koordination bzgl. Terminen und Zuständigkeiten inkl. Abgleich mit L. Falzone. Vorbereitung Dok. formelle Prüfung. Kenntnisnahme Auswertung Preisanalysen.	4.50
24.07.2020	Abklärung Termine und Vorgehen Evaluation mit J. Merian. Vorbereitung projektspezifische Evaluationstabelle zuhanden Inge. Info mit Terminen und Zuständigkeiten an Inge. Erstellung Übersicht Preisvergleiche für alle Hefte und Inge-interne Verteilung. Zustimmung Liste für Vermessung. Interne Abstimmung (St. Roth, M. Palumbo) für Evaluation.	7.50
26.07.2020	Prüfung Vollständigkeit und Eignungskriterien Offerten Baumeister. Bearbeitung Tabellen formelle Prüfungen. Erste Sichtung der Unterlagen. Zustellung Unterlagen PNP/Henz zur Evaluation. Info an Falzone mit Bemerkungen aus formeller Prüfung und Aufteilung Pendenzen. Verifizierung Budget mit Aufwandsschätzung Trasse Phase 51. Vorbereitung Arbeiten Phase 51.	8.50
27.07.2020	Abklärung und Angaben Perimeter Vermessung an Cantaluppi. Erhalt Infos Ph. Noordam zu ZK3.1 und Rückfrage. Abklärung Messerli ausgabe mit Th. Stocker. Erstellung Detailevaluationstabelle.	5.50
28.07.2020	Beauftragung A. Merz mit Zusammenzug Heft-Preise. Anfrage zu Inhalt TB an M. Palumbo. Evaluation technische Berichte. Überprüfung Annahmen Implenia (TB).	4.75
29.07.2020	Evaluation Offerten: TB und Bauprogramme. Einarbeitung Rückmeldung Ph. Noordam und Erstellung Tabelle zur Berechnung Dauer der Arbeiten. Abspache mit M. Palumbo.	5.50
30.07.2020	Bewertung Offerte. Evaluation Bauprogramme. Abklärung Details mit M. Palumbo. Einarbeitung Inputs AeBo.	7.50



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 701323.4002 Periode 01.07.2020 - 31.07.2020
Bezeichnung **N02 EP Sissach - Eptingen - Projektleitung Phase 41**

Mitarbeiter Malfatti Marco (mma) Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
	Instruktionen an A.Merz zur rechnerischen Kontrolle von Preisen (Summe aller Hefte). Abklärung zu Bauzeit mit St. Roth. Info zu Skala Evaluatoin an R. Henz.	
31.07.2020	Besprechung Stand Auswertung Offerten mit L. Falzone. Zusammenstellung Detailevaluation JS-AeBo. Detailevaluation und Überarbeitung Bauprogramme. Info an Jürg Merian mit Stand der Arbeiten (ZK2 und formelle Prüfung)	5.75
Summe		66.75



Zuweisung Projektleitung Phase 41

TP1 (44%): 29.50
TP2 (22%): 14.25
TP3 (34%): 22.75
Total: 66.75



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag:	701323.4002	Periode	01.07.2020 - 31.07.2020
Bezeichnung	N02 EP Sissach - Eptingen - Projektleitung Phase 41		
Mitarbeiter	Merz Andreas (mrz)	Kategorie:	D375 Kaufm.-/Sekretariatspers.(D)
Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden	
28.07.2020	Offerten A-D rechnerische Kontrolle aller Hefte Zuarbeit M. Malfatti	1.00	
30.07.2020	Offerten A-D rechnerische Kontrolle aller Hefte im MesserliBAUAD Zuarbeit M. Malfatti	0.75	
31.07.2020	Offertenkontrolle Bauprogramm Zuarbeit M. Malfatti	0.50	
Summe		2.25	



Zuweisung Projektleitung Phase 41

TP1 (44%):1.00.....
TP2 (22%):0.50.....
TP3 (34%):0.75.....
Total:2.25.....




Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag: 701323.2002 Periode 01.07.2020 - 31.07.2020

Bezeichnung **N02 EP Sissach - Eptingen TP2 Trasse / Umwelt
Phase 41**

Mitarbeiter Nyffenegger Christoph (nyc) Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
21.07.2020	Abgleich Massnahmen Signalisation mit M. Malfatti	0.50
27.07.2020	Abgleich Perimeter Vermessung mit M. Malfatti	1.00
Summe		1.50




Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.07.2020 bis 31.07.2020

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09246	ASTRA F3, N02, EP Sissach-Eptingen	Projektleiter	Lorenzo Falzone
PLA	220	TP2, T-U, Submission	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	S. Roth / J + S AG
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	070017/000025

Mitarbeiter: Anja Schaub


Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
220	13.07.2020	Verkehrsführung für Erstellung Ausf.unterlagen sichten & grobprüfen	6.50
220	14.07.2020	Verkehrsführung für Erstellung Ausf.unterlagen sichten & grobprüfen	4.50
Subtotal			11.00

Unterschrift Mitarbeiter:




Datum: 7.8.20

Unterschrift Vorgesetzter:



Datum: 7.8.20



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG


Auftrag: 701323.2002 Periode 01.07.2020 - 31.07.2020

Bezeichnung **N02 EP Sissach - Eptingen TP2 Trasse / Umwelt
Phase 41**

Mitarbeiter Mollet Samuel (smo) Kategorie: E164 Bauleiter;(E)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
23.07.2020	Angebotsvergleich Offerten Baumeister erstellen	2.50
Summe		2.50

S. Umm



Auftragsrapport JAUSLIN STEBLER AG

Auftrag:	701323.4002	Periode	01.07.2020 - 31.07.2020
Bezeichnung	N02 EP Sissach - Eptingen - Projektleitung Phase 41		
Mitarbeiter	Russer Elisabeth (eru)	Kategorie:	E376 Kaufm.-/Sekretariatspers.(E)
Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden	
24.07.2020	Angebotsordner für M. Malfatti/Palumbo zusammenstellen	3.50	
27.07.2020	Pläne für Abgabe Dossiers für M. Malfatti zusammenstellen	0.75	
Summe		4.25	



Zuweisung Projektleitung Phase 41

TP1 (44%):2.0.....
TP2 (22%):0.75.....
TP3 (34%):1.5.....
Total:4.25.....

