




Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt: **N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
Vertragnehmer: **INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG**
Vertrag Nr.: **000003**
Vertragsgegenstand: **PV Bau/BSA**
Projektnummer: **090069**
Aktuelles Beobachtungsjahr: **2022**
Beobachtungsmonat (Std. NEU): **Oktober**


Vertragsdatum: **14.11.2018**
Vertragslaufzeit: **31.12.2022**
Finanzierungskonto: **Unterhalt**
Inventarobjekt: **FUP.2**
Phasen, beauftragt: **MK, Phase 31**
Phasen, rapportiert: **MK, Phase 31**

Aktuelle Stundenausschöpfung

(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

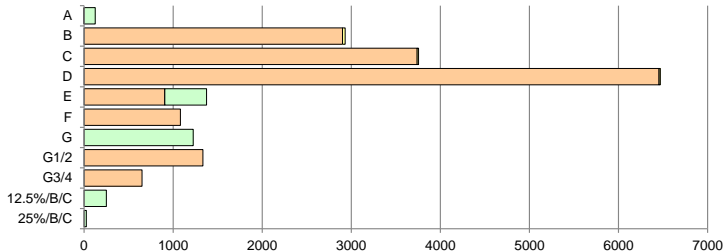

Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	125	1		124		1%
B	2250	2901	30		681	130%
C	3350	3739.5	15.5		405	112%
D	4375	6454.75	14.25		2094	148%
E	1375	906.25		468.75		66%
F	950	1081.25			131.25	114%
G	1225			1225		
G1/2		1334			1334	
G3/4		650.5			650.5	
12.5%/B/C	250			250		
25%/B/C	25			25		
Σ	13925	17068.25	59.75	2092.75	17128	123%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung **99%**

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach **CHF 1'133'743.75**

Kosten ist **CHF 1'390'275**

Kostenausschöpfung **122.63%**

Stundenausschöpfung **123%**

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B	1469.5	51.25	135	40.75	18	26.25	28.5	45	30.25	15.25	13			1872.75
	Kategorie	C	899.25	52	49.75	12.25	-12.25	1	8	10	3					1023
	Kategorie	D	2578	194.25	284.75	10.5	14.25	64.5	37	56.75	3.75		13.25			3257
	Kategorie	E	83.25													83.25
	Kategorie	F	896.25	104.25	20.75				7.5	7.25						1036
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2	1144.75						13							1157.75
Jauslin Stebler AG	Kategorie	G3/4	109.25									2.25				111.5
	Kategorie	A	1													1
	Kategorie	B	647.5	27	9.5		0.5			0.25			17			701.75
	Kategorie	C	2410.25	103	50.25	10.75	4	13	29.5	18.25	25.75	14	15.5			2694.25
	Kategorie	D	2781.25	43	63.5		2.5	3	24.25	38	5.5	3.5	1			2965.5
	Kategorie	E	769.75	19.5	19					12.5						820.75
	Kategorie	F	45.25													45.25
	Kategorie	G														
Leipert AG	Kategorie	G1/2	116.5	3.25	2				4.5	2.25						128.5
	Kategorie	G3/4	447.5	18.5	52				11	9		1				539
	Kategorie	B	278													278
	Kategorie	C	7													7
	Kategorie	D	192													192
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
Holinger AG	Kategorie	B	78.5													78.5
	Kategorie	C	30.75													30.75
	Kategorie	D	54.5													54.5
	Kategorie	E	2.25													2.25
	Kategorie	F														
	Kategorie	G1/2	47.75													47.75
	Kategorie															
	Kategorie															
Total			15090	616	686.5	74.25	27	107.75	163.25	199.25	68.25	36	59.75			17128

Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MwSt., inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A	145													145
CHF 122.00	B	301767	9547	17629	4972	2257	3203	3477	5521	3691	1861	3660			357582
CHF 95.00	C	317989	14725	9500	2185	-784	1330	3563	2684	2731	1330	1473			356725
CHF 86.00	D	482095	20404	29950	903	1441	5805	5268	8149	796	301	1226			556334
CHF 62.00	E	53026	1209	1178					775						56188
CHF 50.00	F	47075	5213	1038				375	363						54063
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2	5236	13	8				70	9						5336
CHF 6.00	G3/4	3341	111	312				66	54		20				3903
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		1210672.25	51220.50	59614.00	8059.50	2913.75	10337.50	12818.00	17553.25	7217.25	3511.00	6358.00			CHF 1'390'275.00

Aegerter & Bosshardt AG**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.10.2022 bis 31.10.2022****Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Projektleitung (MK)**

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
--	A	0	145	0.00
--	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Falzone Lorenzo	B	0	122	0.00
Fuchs Christian	B	9.25	122	1'128.50
Schädler Beat	B	0	122	0.00
Spieler Daniel	B	0	122	0.00
Total	B	9.25		1'128.50
Fischer Michel	D	1	86	86.00
Nef Regula	D	0	86	0.00
Martin Noëlle	D	0	86	0.00
Total	D	1		86.00
Gesamttotal		10.25		1'214.50

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.10.2022 bis 31.10.2022

Mandant Name	AeBo	1000		
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	100	Projektleitung	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9890 EP RF-BB

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Fuchs Christian	B	9.25	122.00	1'128.50
Fischer Michel	D	1.00	86.00	86.00
Total PLA 100.Projektleitung		10.25	118.49	1'214.50

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.10.2022 bis 31.10.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	100	Projektleitung	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc			

Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
Michel Fischer	100	18.10.2022	Bearbeitung Dokumentvorlagen INGE	1.00
Subtotal				1.00
Christian Fuchs	100	05.10.2022	Nachverfolgen Pendenz (Mails /Telefonate) btr. Stellungnahme/Rückmeldungen BSA und int. Spezialisten; Nachfrage btr. RDB ASTRA	0.75
	100	17.10.2022	Projektleitung, Prüfung Termine, ergänzende Terminumfrage MK/AP BSA; Telefonat mit P. Burch, Termineintrag Präsentation mit EP fixieren	0.75
	100	18.10.2022	Absprache Brodmann etc. zu Termin Präsentation SABA etc. mit EP; Foliensatz MK-Vorstellung (Vorlage) vorbesprechen bzw. beauftragen	1.25
	100	19.10.2022	Mailkorrespondenz Sni prüfen (btr. Sissle)	0.25
	100	20.10.2022	Präsentationsvorlage ergänzen und an TPL verteilen	1.00
	100	21.10.2022	Durchgehen & Anpassen Präsentation für Montag 24.10. mit Bup	0.50
	100	24.10.2022	Sitzungsteilnahme, Vor- und Nachbereitung Vorstellen Themen Entwässerung, SABA und FZRS an ASTRA EP	3.25
	100	26.10.2022	Anfrage an TPL für Präsentationen MK/AP, Versand von Grundlagen	0.25
	100	27.10.2022	Prüfen Anfrage BHU zu Faktenblatt Signalportale, Besprechen mit TP K	0.50
	100	31.10.2022	Terminabklärungen mit Grieder und Leipert, Telefonat Leipert zu Faktenblatt Signalportale	0.75
Subtotal				9.25

Mitarbeiter		Kat.	Stunden
FhM	Michel Fischer	D	1.00
FCh	Christian Fuchs	B	9.25

Aktivität	Stunden
100 Projektleitung	10.25
Total	10.25

Aegerter & Bosshardt AG

Datum: 09.11.2022

Visum:

C.F. 11

Aegerter & Bosshardt AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.10.2022 bis 31.10.2022

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Massnahmenkonzept

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
--	A	0	145	0.00
--	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Beck Peter	B	0	122	0.00
Falzone Lorenzo	B	0	122	0.00
Häner David	B	0	122	0.00
Fuchs Christian	B	0	122	0.00
Niedermeyer Friederike	B	0	122	0.00
Ruff Ute	B	0	122	0.00
Schädler Beat	B	0	122	0.00
Spieler Daniel	B	3.75	122	457.50
Weber Madeleine	B	0	122	0.00
Total	B	3.75		457.50
Brem Jakob	C	0	95	0.00
Chroust Steffi	C	0	95	0.00
Kern Etienne	C	0	95	0.00
Martin Dirk	C	0	95	0.00
Mendoza Maria	C	0	95	0.00
Yelman Mahir	C	0	95	0.00
Wieland Manuel	C	0	95	0.00
Total	C	0		0.00
Hardmeyer Christian	D	0	86	0.00
Delmas Marc	D	0	86	0.00
Beuret Agnès	D	0	86	0.00
Chrysopoulos Viktorria	D	0	86	0.00
Fischer Michel	D	0	86	0.00
Lüthi Tobias	D	12.25	86	1'053.50
Meier Lukas	D	0	86	0.00
Moser Tobias	D	0	86	0.00
Meyer Ramona	D	0	86	0.00
Nicolosi Lucia	D	0	86	0.00
Schaub Anja	D	0	86	0.00
Schneider Martin	D	0	86	0.00
Nef Regula	D	0	86	0.00
Martin (Weider) Noëlle	D	0	86	0.00
Total	D	12.25		1'053.50
Schär Cédric	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Boser Florian	F	0	50	0.00
Boschung Jan	F	0	50	0.00
Christ Florian	F	0	50	0.00
Karabasoglu Emre	F	0	50	0.00
Schär Raphaël	F	0	50	0.00
Schmidlin Julian	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Bätscher Basil	G 1/2	0	4	0.00
Rizzo Arianna	G 1/2	0	4	0.00
Wagner Mika	G 1/2	0	4	0.00
Honegger Mark	G 1/2	0	4	0.00
Zimmermann Alec	G 1/2	0	4	0.00
Total	G 1/2	0		0.00
Krenger Kyara	G 3/4	0	6	0.00
Wagner Mika	G 3/4	0	6	0.00
Weber Fabian	G 3/4	0	6	0.00
Davet Kilian	G 3/4	0	6	0.00
Manz Selena	G 3/4	0	6	0.00
Total	G 3/4	0		0.00
Gesamttotal		16		1'511.00

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.10.2022 bis 31.10.2022

Mandant Name	AeBo	1000		
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	310	MK, FB T-U	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9890 EP RF-BB

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Spieler Daniel	B	3.75	122.00	457.50
Total PLA 310.MK, FB T-U		3.75	122.00	457.50

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.10.2022 bis 31.10.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	310	MK, FB T-U	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc			

Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
Daniel Spieler	310	21.10.2022	Festlegung Schadenstellen Entwässerung MK und Zuteilung Pläne für Präsentation EP und NSNP vom 24.10. und 14.11.	1.00
	310	23.10.2022	Bearbeitung Präsentation vom 24.10. und 14.11 für das MK Entwässerung	0.75
	310	24.10.2022	Vorbereitung Präsentation MK, Präsentation MK (Entwässerung/FZRS) beim EP ASTRA in Zofingen	2.00
Subtotal				3.75

Mitarbeiter		Kat.	Stunden
SD	Daniel Spieler	B	3.75

Aktivität		Stunden
310	MK, FB T-U	3.75

Total 3.75

Aegerter & Bosshardt AG

Datum:

09.11.2022

Visum.

C.F.H.

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.10.2022 bis 31.10.2022

Mandant Name	AeBo	1000			
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt			
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs	
PLA	320	MK, FB K	PLA Leiter	Christian Fuchs	
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen			
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9890 EP RF-BB	

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Lüthi Tobias	D	12.25	86.00	1'053.50
Total PLA 320.MK, FB K		12.25	86.00	1'053.50

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.10.2022 bis 31.10.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	320	MK, FB K	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc			

Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
Tobias Lüthi	320	07.10.2022	Erstellen Präsentation zur Abgabe MK	3.00
	320	11.10.2022	Erstellung Präsentation Abgabe Dossier TP K	5.00
	320	13.10.2022	Anpassung Präsentation Abgabe Dossier TP K	3.50
	320	26.10.2022	Anpassung Präsentation Schlussabgabe	0.75
Subtotal				12.25

Mitarbeiter		Kat.	Stunden
LT	Tobias Lüthi	D	12.25

Aktivität		Stunden
320	MK, FB K	12.25
Total		12.25

Aegerter & Bosshardt AG

Datum:

09.11.2022

Visum:

C.F. 11

JAUSLIN STEBLER AG
Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.10.22 bis 31.10.22
Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Massnahmenkonzept

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Roth Stefan	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Forlin Sandro	B	17	122	2'074.00
Hartmann Peter	B	0	122	0.00
Mantinger Michael	B	0	122	0.00
Methner Raphael	B	0	122	0.00
Total	B	17		2'074.00
Brauchli Stefan	C	11.25	95	1'068.75
Grieder Fabio	C	4.25	95	403.75
Hunziker Livia	C	0	95	0.00
Stocker Thomas	C	0	95	0.00
Total	C	15.5		1'472.50
Abdelmogghi Ahmed	D	0	86	0.00
Deck Andreas	D	0	86	0.00
Dolder Silvio	D	0	86	0.00
Rothfuss Fabian	D	0	86	0.00
Haberthür Nicolas	D	0	86	0.00
Seebacher Andreas	D	1	86	86.00
Meyer Moritz	D	0	86	0.00
Nosdeo Maya	D	0	86	0.00
Nyffenegger Christoph	D	0	86	0.00
Brunner Andreas	D	0	86	0.00
Boeglin Chantal	D	0	86	0.00
Total	D	1		86.00
Müller Jan	E	0	62	0.00
Brüngger Marco	E	0	62	0.00
Ladner Roman	E	0	62	0.00
Russer Elisabeth	E	0	62	0.00
Wortelboer Alexander	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Dogan Esra	F	0	50	0.00
Köchli Pascal	F	0	50	0.00
Prescha Deliah	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Strittmatter Katja (Praktikantin)	G	0	8	0.00
Möri Anna	G	0	8	0.00
Total	G	0		0.00
Aston Tim	G3/4	0	6	0.00
Gloor Leoni	G3/4	0	6	0.00
Straub Vanessa	G3/4	0	6	0.00
Schreiber Severin	G3/4	0	6	0.00
Hegi Yannick	G3/4	0	6	0.00
Total	G	0		0.00
Schneider Anika	G1/2	0	4	0.00
Total	G	0		0.00
Gesamttotal		33.5		3'632.50

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.10.2022 - 31.10.2022

Projekt-Nr.:	702288.2160
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.2160_PH 31 T-G
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-G

Mitarbeiter	Forlin Sandro (SFo)	Kategorie:	B353	Leitender Ingenieur(B)
-------------	----------------------------	------------	------	------------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
25.10.2022	Wiederaufnahme Arbeiten, Dursicht Dossier MK, T/G und Beginn Vorbereitung Präsentation GE und ASTRA EP	8.50
27.10.2022	Erstellung / Vorbereitung Präsentation MK T/G	3.50
28.10.2022	Erstellung / Vorbereitung Präsentation MK T/G	5.00
Summe		17.00

Periode: 01.10.2022 - 31.10.2022

Projekt-Nr.:	702288.2160
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.2160_PH 31 T-G
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-G

Mitarbeiter	Brauchli Stefan (bsn)	Kategorie:	C354	Architekt, Ingenieur (C)
-------------	------------------------------	------------	------	--------------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
25.10.2022	Unterstützung Präsentation MK (Kurzabgleich mit S. Forlin)	0.50
26.10.2022	Wiederaufnahme Arbeiten, Unterstützung Präsentation MK (Zusammentragen Informationen aus MK-Dossier) Abklärungen zu Anker N3-350: Gefährdungspotential gemäss ASTRA RiLi 12005 / N3-351: Beurteilung Ankerzustand / N3-352: Ankerkraftentwicklung, zukünftige Reserven	6.50
27.10.2022	Unterstützung Präsentation MK (Ankerbeurteilung, Senkungsmulde Rheinfelden etc.)	4.25
Summe		11.25

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.10.2022 - 31.10.2022

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 PL
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) PL

Mitarbeiter	Grieder Fabio (fg)	Kategorie:	C253	Leitender Ingenieur
-------------	---------------------------	------------	------	---------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
03.10.2022	Zusammenstellen Unterlagen für WTK Möhlin (EW und BSA-Kataster) inkl. Info Projektbeteiligte	0.50
05.10.2022	PL-Abgleich und Bedarf PS Bau	1.50
18.10.2022	Kurzbesprechung mit C. Fuchs betreffend Präsentationen MK/AP an ASTRA EP und GE	1.00
Summe		3.00

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.10.2022 - 31.10.2022

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 T-U
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U

Mitarbeiter	Grieder Fabio (fg)	Kategorie:	C253	Leitender Ingenieur
-------------	---------------------------	------------	------	---------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
-------	-----------------------	---------

06.10.2022	Kurzabgleich mit BHU betreffend Anfrage FZRS (km 24.7), Grund: Verkehrsunfall	1.25
------------	--	------

Summe		1.25
--------------	--	------

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.10.2022 - 31.10.2022

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung: **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Auftrag-Nr.: 702288.0_PH 31 T-U
Bezeichnung: **EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U**

Mitarbeiter: **Seebacher Andreas (san)** Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
-------	-----------------------	---------

24.10.2022	Präsentation EP u. NSNW: vorbereiten Grundgerüst und abfüllen erste Kapitel	1.00
------------	---	------

Summe		1.00
--------------	--	-------------




Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt: **N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
Vertragnehmer: **INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG**
Vertrag Nr.: **000003**
Vertragsgegenstand: **PV Bau/BSA**
Projektnummer: **090069**
Aktuelles Beobachtungsjahr: **2022**
Beobachtungsmonat (Std. NEU): **Oktober**

Vertragsdatum: **14.11.2018**
Vertragslaufzeit: **31.12.2022**
Finanzierungskonto: **Unterhalt**
Inventarobjekt: **FUP.2**
Phasen, beauftragt: **Option SABA**
Phasen, rapportiert: **Option SABA**

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

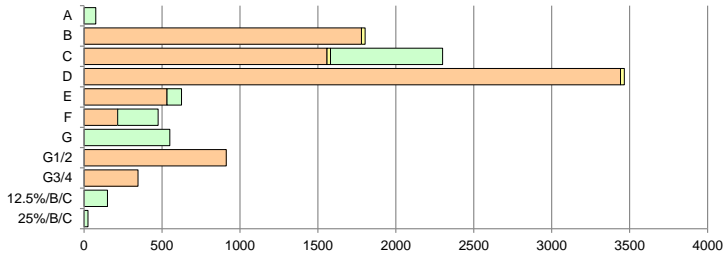

Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	75			75		
B	1525	1779.5	23.5		278	118%
C	2300	1558.5	22.25	719.25		69%
D	2400	3441.25	24.5		1065.75	144%
E	625	532		93		85%
F	475	215.5		259.5		45%
G	550			550		
G1/2		912			912	
G3/4		346			346	
12.5%/B/C	150			150		
25%/B/C	25			25		
Σ	8125	8784.75	70.25	1871.75	8855	109%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer
Selbsteinschätzung **95%**

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach	CHF 691'437.50
Kosten ist	CHF 717'675
Kostenausschöpfung	103.79%
Stundenausschöpfung	109%

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B	657.5	13.75	83.75	42.25	34.75	63	138.5	7	36	18.5	13.5			1108.5
	Kategorie	C	823.5	125.25	226.5	9.75	28	67.75	61.25	28	6	22.25				1398.25
	Kategorie	D	1231.75	303.75	231.25	39.75	26	119	264.25	50	48	2	17			2332.75
	Kategorie	E	39.25													39.25
	Kategorie	F	55	58.25	41.25	1	7.75	36.25	16							215.5
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2	514	154.75	46.5		26.25	19.75	51	29.5						841.75
	Kategorie	G3/4	93.25	7	61.75		34.25	91.75	54							342
Jauslin Stebler AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B														
	Kategorie	C	34.25	15.25	45	15.75	3	2.25	16.5	18.75	3					153.75
	Kategorie	D	21.25	17.75	59.5											98.5
	Kategorie	E			6.5											6.5
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2	7	13	12.5				5.5	4						42
	Kategorie	G3/4		4												4
Leipert AG	Kategorie	B	100	48.5	53	1		12	33	1.5	16	0.5	1.5			267
	Kategorie	C	8.5								3					11.5
	Kategorie	D		30	36				23.5	27.5	43.5					160.5
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
Holinger AG	Kategorie	B	259	17	33.5	18	23.75	16	39	4	4.75	4	8.5			427.5
	Kategorie	C	14.25	3												17.25
	Kategorie	D	506.5	79.25	74.75	10	43.75	29.25	85	24	14		7.5			874
	Kategorie	E	389.5	36.5	35.25				12	8.5	4.5					486.25
	Kategorie	F														
	Kategorie	G1/2	24.75			3.5										28.25
Total				4779.25	927	1047	141	227.5	457	799.5	202.75	178.75	25	70.25		8855

Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MwSt., inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A														
CHF 122.00	B	124'013	9'669	20'771	7'473	7'137	11'102	25'681	1'525	6'924	2'806	2'867			219'966
CHF 95.00	C	83'648	13'633	25'793	2'423	2'945	6'650	7'386	4'441	1'140		2'114			150'171
CHF 86.00	D	151'317	37'045	34'529	4'279	5'999	12'750	32'057	8'729	9'073	172	2'107			298'055
CHF 62.00	E	26'583	2'263	2'589				744	527	279					32'984
CHF 50.00	F	2'750	2'913	2'063	50	388	1'813	800							10'775
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2	2'183	671	236	14	105	79	226	134						3'648
CHF 6.00	G3/4	560	66	371		206	551	324							2'076
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		391'052.50	66'258.00	86'349.50	14'237.50	16'778.50	32'943.50	67'217.75	15'356.25	17'415.50	2'978.00	7'087.75			CHF 717'674.75

Aegerter & Bosshardt AG
Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.10.2022 bis 31.10.2022
Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP SABA inkl. SABA Mumpf

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
--	A	0	145	0.00
--	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Beck Peter	B	0	122	0.00
Falzone Lorenzo	B	0	122	0.00
Fuchs Christian	B	0	122	0.00
Niedermeyer Friederike	B	0	122	0.00
Jung Roman	B	0	122	0.00
Ruff Ute	B	0	122	0.00
Schädler Beat	B	0	122	0.00
Spieler Daniel	B	13.5	122	1'647.00
Total	B	13.5		1'647.00
Kern Etienne	C	0	95	0.00
Martin Dirk	C	22.25	95	2'113.75
Mendoza Maria	C	0	95	0.00
Nommay Emmanuelle	C	0	95	0.00
Total	C	22.25		2'113.75
Enderlen Francis	D	0	86	0.00
Di Maura Miriam	D	0	86	0.00
Di Maria Marcello	D	0	86	0.00
Hardmeyer Christian	D	0	86	0.00
Iten Vanessa	D	0	86	0.00
Meyer Ramona	D	17	86	1'462.00
Nicolosi Lucia	D	0	86	0.00
Breiter Michael	D	0	86	0.00
Schaub Anja	D	0	86	0.00
Wira Stephane	D	0	86	0.00
Total	D	17		1'462.00
Schär Cedric	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Boschung Jan	F	0	50	0.00
Christ Florian Michael	F	0	50	0.00
Redlich Moritz	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Bätscher Basil	G 1/2	0	4	0.00
Rizzo Arianna	G 1/2	0	4	0.00
Streiff Timon	G 1/2	0	4	0.00
Zimmermann Alec	G 1/2	0	4	0.00
Total	G 1/2	0		0.00
Wagner Mika	G 3/4	0	6	0.00
Total	G 3/4	0		0.00
Gesamttotal		52.75		5'222.75

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.10.2022 bis 31.10.2022

Mandant Name	AeBo	1000		
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9890 EP RF-BB

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Spieler Daniel	B	13.50	122.00	1'647.00
Martin Dirk	C	22.25	95.00	2'113.75
Meyer Ramona	D	17.00	86.00	1'462.00
Total PLA 420.AP SABA		52.75	99.01	5'222.75

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.10.2022 bis 31.10.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc			

Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
Dirk Martin	420	05.10.2022	Prüfen der Rückmeldungen NSNW+ und beantworten	3.50
	420	06.10.2022	Prüfen der Rückmeldungen NSNW+ und beantworten	1.75
	420	07.10.2022	Prüfen der Rückmeldungen NSNW+ und beantworten	1.00
	420	10.10.2022	Prüfen der Rückmeldungen NSNW+ und beantworten	1.50
	420	11.10.2022	Projektieren und Einarbeiten der Rückmeldungen NSNW+BSA inkl. Zeichnerinstruktion	2.75
	420	12.10.2022	Analysieren und beantworten der Rückmeldungen NSNW+BSA inkl. Versand an Leipert, Zeichnerinstruktion	2.00
	420	17.10.2022	Korrekturen aus Rückmeldungen NSNW+BSA in Projektierung einarbeiten inkl. Zeichnerinstruktion	0.50
	420	21.10.2022	Erarbeiten Präsentation Vorstellung Dossier EP ASTRA	6.25
	420	24.10.2022	Vorstellung Dossier EP ASTRA	3.00
Subtotal				22.25
Ramona Meyer	420	12.10.2022	Plan 9890-404: Anpassung Lage des neuen BSA-Schachtes. Plan 9890-580: Ergänzung proj. Rohrblock. Plan 9890-415: Anpassung best. Leitung in proj. BSA-Schacht anhängen. Plan 9890-572: Ergänzung Fläche Zufahrt (Weg) zu SABA Bahnhof Stein. Plan 9890-407: Ergänzung Fläche Zufahrt (Weg) zu SABA Bahnhof Stein. Plan 9890-406: Ergänzung Bemassung (L/B) von Parzellengrenze zu SABA. Plan 9890-426: Ergänzung Bemassung (L/B) von Parzellengrenze zu SABA. Besprechung weiteres Vorgehen. Div. Abklärungen	9.00
	420	13.10.2022	Abgleich Pumpwerke, Abgleich BSA-Schächte. Div. Abklärungen.	2.00
	420	17.10.2022	11	6.00
Subtotal				17.00
Daniel Spieler	420	10.10.2022	Bearbeitung Rückmeldung von M. Zurfluh und NSNW, Rücksprache mit Matthias Zurflüh, Ablage AP SABA neu auf ASTRA Plattform	2.00
	420	11.10.2022	Bearbeitung Rückmeldung von Matthias Zurflüh und E-Mail an Matthias	1.25
	420	13.10.2022	Bearbeitung 2. Rückmeldung AP SABA der BHU und Rücksprache mit Holinger	1.00
	420	20.10.2022	interne Besprechung zu Präsentation MK/AP für Paul Burch, Ablage von Dokumenten Holinger bei AeBo	0.50
	420	21.10.2022	Erstellen Präsentation MK/AP für EP und NSNP vom 24.10. und 14.11.	3.50
	420	23.10.2022	Bearbeitung Präsentation vom 24.10. und 14.11 für das AP Entwässerung	0.50
	420	24.10.2022	Vorbereitung Präsentation AP, Präsentation AP SABA beim EP ASTRA in Zofingen	2.75
	420	25.10.2022	Unterlagen AP SABA im Bereich Sissle für Hr. Kaufmann (Kt. Aargau, PL Wasserbau) im Auftrag von N. Schulz zusammengestellt, Bauliche Massnahmen beschrieben, Webtransfer erstellt und Versand per Email, AP SABA, Entwässerung und FZRS MK für EP zusammengestellt und Gut zum Druck an Repro	2.00
Subtotal				13.50

Mitarbeiter		Kat.	Stunden
MD	Dirk Martin	C	22.25
MeR	Ramona Meyer	D	17.00
SD	Daniel Spieler	B	13.50

Aktivität	Stunden
420 AP SABA	52,75

Total **52.75**

Aegerter & Bosshardt AG

Datum:

09.11.2022

Visum:

C.F.H.

Leipert AG**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.10.2022 bis 31.10.2022****Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP SABA**

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Name Vorname	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Leipert Markus	B	1.5	122	183.00
Herzog Stefan	B	0	122	0.00
Riderle Timo	B	0	122	0.00
Total	B	1.5		183.00
Mozzillo Sergio	C	0	95	0.00
Weisskopf Silvan	C	0	95	0.00
Hofer Michael	C	0	95	0.00
Lazzarato Roberto	C	0	95	0.00
Total	C	0		0.00
Gassmann Silvia	D	0	86	0.00
Hofer Michael	D	0	86	0.00
Total	D	0		0.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Gesamttotal		1.5		183.00

Tag	Stunden	Zuschlag	Zuschlag	Tätigkeitsbeschreibung
	100%	25%	50%	
1				
2				
3				
4				
5				
6	0.50			Abkl. betr. Ausstehender Stellungnahme
7				
8				
9				
10				
11				
12	0.50			Durchsicht / Rückmeldung zu Stellungnahme SABA
13	0.50			Durchsicht / Weiterleiten Rückmeldungstabelle
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
Total		1.50	0.00	0.00

Name:
Leipert

Vorname:
Markus

Monat:
Oktober

Jahr:
2022

Kategorie:
B

Kostenart:
1.3100

Auftraggeber:
INGE EP RF BB

Auftragsnummer:
327.1

Bezeichnung:
N03, EP Rheinfelden Frick, Phase AP SABA

Vertrag Nr.:

Auftragsnummer extern:



HOLINGER AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.10.2022 bis 31.10.2022

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP SABA inkl. SABA Mumpf

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Name Vorname	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Brodmann René	B	8.5	122	1'037.00
Name Vorname	B	0	122	0.00
Total	B	8.5		1'037.00
Wyrsch Vera	C	0	95	0.00
Heizmann Dominik	C	0	95	0.00
Pflugi Matthias	C	0	95	0.00
Schwab Alexander	C	0	95	0.00
Total	C	0		0.00
Wiss Lukas	D	0	86	0.00
Hof Fabian	D	7.5	86	645.00
Peier Reto	D	0	86	0.00
Schneider Tanja	D	0	86	0.00
Schill Jasmin	D	0	86	0.00
Total	D	7.5		645.00
Häfelfinger Sarah	E	0	62	0.00
Schlumpf Oliver	E	0	62	0.00
Gerber Joel	E	0	62	0.00
Ammann Carmen	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Poggioli Marisa	G1/2	0	4	0.00
Reimann Lea	G1/2	0	4	0.00
Trinh Cherry	G1/2	0	4	0.00
Total	G1/2	0		0.00
Gesamttotal		16		1'682.00

Detailrapport
L3612.001 Rheinfelden-Frick, N3 EP PV SABA
Beweg

HOLINGER AG


Datum	Mitarbeiter	Text	Anzahl Std.
12.10.2022		Teamsbespr D.Martin - Rückmeldung FU, Fachbespr HFA	1.50
13.10.2022		Teams D.Martin - Rückmeld. FU	1.00
18.10.2022		Tel Mail Ch Fuchs Terminkoord.	0.50
21.10.2022		Tel Spieler, Teams D. Martin	1.50
24.10.2022		Bespr Filiale Zofingen, IG, Burch, Schulz	3.50
26.10.2022		Tel Burch	0.50
	37. Brodmann René		8.50
13.10.2022		Abklärungen Stellungnahme BHU zu AP, Anpassungen R+I Schema	4.50
14.10.2022		Abklärungen Stellungnahme BHU zu AP, Anpassungen R+I Schema	1.00
19.10.2022		Anpassungen BHU + Zusammenstellung angepasste Unterlagen	1.00
20.10.2022		Kontrolle und Abgabe überarbeitete Unterlagen SABAs Mumpf	1.00
	10077. Hof Fabian		7.50
Total L3612.001 Rheinfelden-Frick, N3 EP PV SABA			16.00

Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt: N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
Vertragnehmer: INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau/BSA
Projektnummer: 090069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Oktober

Vertragsdatum: 14.11.2018
Vertragslaufzeit: 31.12.2022
Finanzierungskonto: Unterhalt
Inventarobjekt: FUP.2
Phasen, beauftragt: GHGW
Phasen, rapportiert: GHGW

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

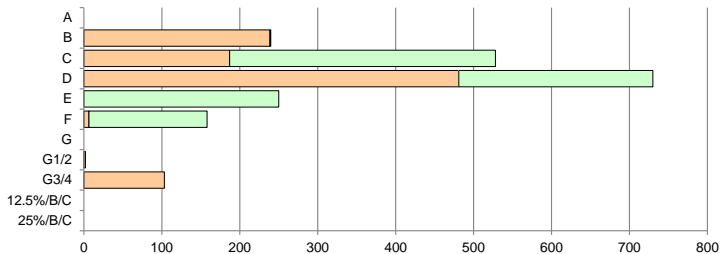

Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B	130	238.75	1		109.75	184%
C	528	187		341		35%
D	730	481		249		66%
E	250			250		
F	158	6.5		151.5		4%
G						
G1/2		2			2	
G3/4		103.25			103.25	
12.5%/B/C						
25%/B/C						
Σ	1796	1018.5	1	991.5	1019.5	57%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung 90%

rechnerische Auswertungen (exkl. MwSt.)

Kostendach CHF 152'200.00

Kosten ist CHF 89'333

Kostenausschöpfung 58.69%

Stundenausschöpfung 57%

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B	2													2
	Kategorie	C	7.25													7.25
	Kategorie	D	20	17.75												37.75
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Jauslin Stebler AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B	0.25													0.25
	Kategorie	C	124	8.75												132.75
	Kategorie	D	282.75	124.5	29.25											436.5
	Kategorie	E														
	Kategorie	F	6.5													6.5
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2			2											2
Leipert AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B	60	48.5	28		11	13.5	6.5	30.5	37.5	1	1			237.5
	Kategorie	C		4						23	6	14				47
	Kategorie	D			6.75											6.75
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Holinger AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B														
	Kategorie	C														
	Kategorie	D														
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Total				559.5	250	66	11	13.5	6.5	53.5	43.5	15	1			1019.5

Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MwSt., inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A														
CHF 122.00	B	7595	5917	3416		1342	1647	793	3721	4575	122	122			29'250
CHF 95.00	C	12'469	12'111						2'185	570	1'330				17'765
CHF 86.00	D	26'037	12'234	3'096											41'366
CHF 62.00	E														
CHF 50.00	F	325													325
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2			8											8
CHF 6.00	G3/4	341	279												620
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		46'765.25	19'640.75	6'520.00		1'342.00	1'647.00	793.00	5'906.00	5'145.00	1'452.00	122.00			CHF 89'333.00

Leipert AG**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.10.2022 bis 31.10.2022****Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, GHGW**

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Name Vorname	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Leipert Markus	B	1	122	122.00
Herzog Stefan	B	0	122	0.00
Riderle Timo	B	0	122	0.00
Total	B	1		122.00
Mozzillo Sergio	C	0	95	0.00
Weisskopf Silvan	C	0	95	0.00
Hofer Michael	C	0	95	0.00
Lazzarato Roberto	C	0	95	0.00
Total	C	0		0.00
Gassmann Silvia	D	0	86	0.00
Hofer Michael	D	0	86	0.00
Total	D	0		0.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Gesamttotal		1		122.00

Tag	Tätigkeitsbeschreibung		
	Stunden 100%	Zuschlag 25%	Zuschlag 50%
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27	1.00		
28			
29			
30			
31			
Total	1.00	0.00	0.00

Name: Leipert	Vorname: Markus	Monat: Oktober	Jahr: 2022	Kategorie: B	Kostenart: 1.3100
-------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------------

Auftraggeber: INGE EP RF BB	Vertrag Nr.: Auftragsnummer extern:
Auftragsnummer: 327.2	
Bezeichnung: N03, EP Rheinfelden Frick, GHGW (MK)	




Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt: N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
Vertragnehmer: INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau/BSA
Projektnummer: 090069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Oktober

Vertragsdatum: 14.11.2018
Vertragslaufzeit: 31.12.2022
Finanzierungskonto: Unterhalt
Inventarobjekt: FUP.2
Phasen, beauftragt: Option Lärm
Phasen, rapportiert: Option Lärm

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

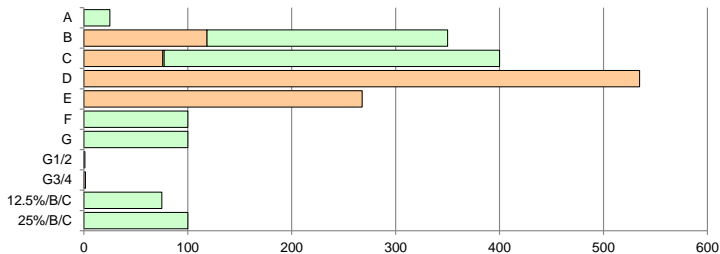

Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	25			25		
B	350	118.5		231.5		34%
C	400	75.75	1.5	322.75		19%
D	450	534.75			84.75	119%
E	125	267.75			142.75	214%
F	100			100		
G	100			100		
G1/2		1			1	
G3/4		1.5			1.5	
12.5%/B/C	75			75		
25%/B/C	100			100		
Σ	1725	999.25	1.5	954.25	1000.75	58%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung 91%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach CHF 140'304.69

Kosten ist CHF 84'398

Kostenausschöpfung 60.15%

Stundenausschöpfung 58%

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B														
	Kategorie	C														
	Kategorie	D														
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Jauslin Stebler AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B	110													118.5
	Kategorie	C	63						1	0.5	8		1.5			77.25
	Kategorie	D	504.75							1.5	10.25					534.75
	Kategorie	E	261.25							9.75	20.25					267.75
	Kategorie	F									6.5					
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2									1					1
Leipert AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B														
	Kategorie	C														
	Kategorie	D														
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Holinger AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B														
	Kategorie	C														
	Kategorie	D														
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Total				939					1	11.75	47.5		1.5			1000.75

Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MwSt., inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A														
CHF 122.00	B	13'420							61	976					14'457
CHF 95.00	C	5'985						95	143	974		143			7'339
CHF 86.00	D	43'409							839	1'742					45'989
CHF 62.00	E	16'198								403					16'601
CHF 50.00	F														
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2									4					4
CHF 6.00	G3/4									9					9
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		79'011.00						95.00	1'042.00	4'107.25		142.50			CHF 84'397.75

JAUSLIN STEBLER AG
Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.10.22 bis 31.10.22
Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP Lärm

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Roth Stefan	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Forlin Sandro	B	0	122	0.00
Hartmann Peter	B	0	122	0.00
Mantinger Michael	B	0	122	0.00
Methner Raphael	B	0	122	0.00
Total	B	0		0.00
Brauchli Stefan	C	0	95	0.00
Grieder Fabio	C	1.5	95	142.50
Hunziker Livia	C	0	95	0.00
Name Vorname	C	0	95	0.00
Total	C	1.5		142.50
Abdelmoghni Ahmed	D	0	86	0.00
Deck Andreas	D	0	86	0.00
Rothfuss Fabian	D	0	86	0.00
Seebacher Andreas	D	0	86	0.00
Meyer Moritz	D	0	86	0.00
Nyffenegger Christoph	D	0	86	0.00
Brunner Andreas	D	0	86	0.00
Boeglin Chantal	D	0	86	0.00
Total	D	0		0.00
Müller Jan	E	0	62	0.00
Brüngger Marco	E	0	62	0.00
Ladner Roman	E	0	62	0.00
Marsicovetere Liliana	E	0	62	0.00
Russer Elisabeth	E	0	62	0.00
Wortelboer Alexander	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Dogan Esra	F	0	50	0.00
Prescha Deliah	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Strittmatter Katja (Praktikantin)	G	0	8	0.00
Möri Anna	G	0	8	0.00
Total	G	0		0.00
Straub Vanessa	G3/4	0	6	0.00
Werten Lukas	G3/4	0	6	0.00
Hegi Yannick	G1/2	0	4	0.00
Schneider Anika	G1/2	0	4	0.00
Total	G	0		0.00
Gesamttotal		1.5		142.50

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.10.2022 - 31.10.2022

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 AP LSP
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (AP LSP)

Mitarbeiter	Grieder Fabio (fg)	Kategorie:	C253	Leitender Ingenieur
-------------	---------------------------	------------	------	---------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
-------	-----------------------	---------

11.10.2022	Koordination mit BHU und FU Lärm betreffend fehlender Sticks inkl. aufgleisen Versand zusätzlicher Exemplare	1.50
------------	--	------

Summe		1.50
--------------	--	------
