




Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt: N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
Vertragnehmer: INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau/BSA
Projektnummer: 090069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU): August


Vertragsdatum: 14.11.2018
Vertragslaufzeit: 31.12.2022
Finanzierungskonto: Unterhalt
Inventarobjekt: FUP.2
Phasen, beauftragt: Option SABA
Phasen, rapportiert: Option SABA

Aktuelle Stundenausschöpfung

(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

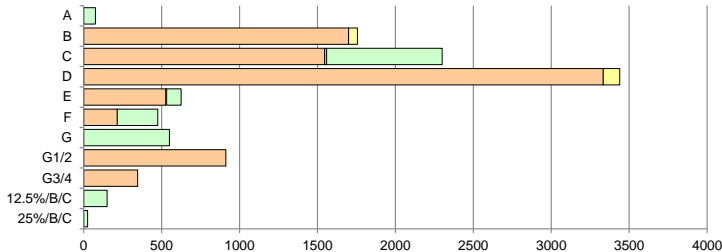

Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	75			75		
B	1525	1699.75	56.75		231.5	115%
C	2300	1546.5	12	741.5		68%
D	2400	3333.75	105.5		1039.25	143%
E	625	527.5	4.5	93		85%
F	475	215.5		259.5		45%
G	550			550		
G1/2		912			912	
G3/4		346			346	
12.5%/B/C	150			150		
25%/B/C	25			25		
Σ	8125	8581	178.75	1894	8759.75	108%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung 95%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach CHF 691'437.50

Kosten ist CHF 707'609

Kostenausschöpfung 102.34%

Stundenausschöpfung 108%

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B	657.5	13.75	83.75	42.25	34.75	63	138.5	7	36					1076.5
	Kategorie	C	823.5	125.25	226.5	9.75	28	67.75	61.25	28	6					1376
	Kategorie	D	1231.75	303.75	231.25	39.75	26	119	264.25	50	48					2313.75
	Kategorie	E	39.25													39.25
	Kategorie	F	55	58.25	41.25	1	7.75	36.25	16							215.5
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2	514	154.75	46.5		26.25	19.75	51	29.5						841.75
	Kategorie	G3/4	93.25	7	61.75		34.25	91.75	54							342
Jauslin Stebler AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B														
	Kategorie	C	34.25	15.25	45	15.75	3	2.25	16.5	18.75	3					153.75
	Kategorie	D	21.25	17.75	59.5											98.5
	Kategorie	E			6.5											6.5
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2	7	13	12.5				5.5	4						42
	Kategorie	G3/4		4												4
Leipert AG	Kategorie	B	100	48.5	53	1		12	33	1.5	16					265
	Kategorie	C	8.5								3					11.5
	Kategorie	D		30	36				23.5	27.5	43.5					160.5
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
Holinger AG	Kategorie	B	259	17	33.5	18	23.75	16	39	4	4.75					415
	Kategorie	C	14.25	3												17.25
	Kategorie	D	506.5	79.25	74.75	10	43.75	29.25	85	24	14					866.5
	Kategorie	E	389.5	36.5	35.25				12	8.5	4.5					486.25
	Kategorie	F														
	Kategorie	G1/2	24.75			3.5										28.25

Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MwSt., inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A														
CHF 122.00	B	124013	9669	20771	7473	7137	11'102	25681	1'525	6'924					214'293
CHF 95.00	C	83648	13633	25793	2423	2945	6650	7386	4'441	1'140					148'058
CHF 86.00	D	151'317	37'045	34'529	4'279	5'999	12'750	32'057	8'729	9'073					295'776
CHF 62.00	E	26583	2'263	2'589				744	527	279					32'984
CHF 50.00	F	2750	2'913	2'063	50	388	1'813	800							10'775
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2	2'183	671	236	14	105	79	226	134						3'648
CHF 6.00	G3/4	560	66	371		206	551	324							2'076
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		391'052.50	66'258.00	86'349.50	14'237.50	16'778.50	32'943.50	67'217.75	15'356.25	17'415.50					CHF 707'609.00

Aegerter & Bosshardt AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.08.2022 bis 31.08.2022

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP SABA inkl. SABA Mumpf

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
--	A	0	145	0.00
--	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Beck Peter	B	0	122	0.00
Falzone Lorenzo	B	0	122	0.00
Fuchs Christian	B	0	122	0.00
Niedermeyer Friederike	B	0	122	0.00
Jung Roman	B	0	122	0.00
Ruff Ute	B	0	122	0.00
Schädler Beat	B	0	122	0.00
Spieler Daniel	B	36	122	4'392.00
Total	B	36		4'392.00
Kern Etienne	C	0	95	0.00
Martin Dirk	C	6	95	570.00
Mendoza Maria	C	0	95	0.00
Nommay Emmanuelle	C	0	95	0.00
Total	C	6		570.00
Enderlen Francis	D	0	86	0.00
Di Maura Miriam	D	0	86	0.00
Di Maria Marcello	D	0	86	0.00
Hardmeyer Christian	D	48	86	4'128.00
Iten Vanessa	D	0	86	0.00
Meyer Ramona	D	0	86	0.00
Nicolosi Lucia	D	0	86	0.00
Breiter Michael	D	0	86	0.00
Schaub Anja	D	0	86	0.00
Wira Stephane	D	0	86	0.00
Total	D	48		4'128.00
Schär Cedric	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Boschung Jan	F	0	50	0.00
Christ Florian Michael	F	0	50	0.00
Redlich Moritz	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Bätscher Basil	G 1/2	0	4	0.00
Rizzo Arianna	G 1/2	0	4	0.00
Streiff Timon	G 1/2	0	4	0.00
Zimmermann Alec	G 1/2	0	4	0.00
Total	G 1/2	0		0.00
Wagner Mika	G 3/4	0	6	0.00
Total	G 3/4	0		0.00
Gesamttotal		90		9'090.00

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.08.2022 bis 31.08.2022

Mandant Name	AeBo	1000		
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9890 EP RF-BB

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Spieler Daniel	B	36.00	122.00	4'392.00
Martin Dirk	C	6.00	95.00	570.00
Hardmeyer Christian	D	48.00	86.00	4'128.00
Total PLA 420.AP SABA		90.00	101.00	9'090.00

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.08.2022 bis 31.08.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Christian Hardmeyer


Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
420	22.08.2022	Anpassen alle Titelblätter 1000er Dokument-Nr.	4.25
420	23.08.2022	Erstellen Titelblatt und Rücken für Sammelmappe/Schachtel. Div. Darstellungen 1000er Sit, Beschr. Pumpwerke ausschalten/Textfeld Instandsetzung.	9.00
420	24.08.2022	Sit 1000er, anpassen Zuleitungen (u.a. Saba Mumpf)	8.50
420	25.08.2022	Pläne Swissgrid/Axpo angepasst/Tibla, SABA Brugzelgli Mumpf, Schalung anpassen Mauerwerk, SABA Bhf. Stein, ergänzen Stahlterre.	8.75
420	29.08.2022	Rückmeldung: Plan /422 anpassen div. Schnitte, ergänzen Baugrubensicherung	4.00
420	30.08.2022	Rückmeldung: Plan /423, /429 und /430 anpassen Schnitte, Baugrubensicherung, ergänzen Einstiegsleiter	9.00
420	31.08.2022	Rückmeldung: Plan /431 und /432 anpassen Schnitte, Baugrubensicherung, ergänzen Einstiegsleiter Anpassen Tibla-Rückenschilder für Mappen.	4.50
Subtotal			48.00

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:


 08.09.2022

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.08.2022 bis 31.08.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Dirk Martin

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
420	15.08.2022	sichten/analysieren der Rückmeldungen ASTRA zu AP-Dossier	0.50
420	17.08.2022	Stellungnahme zu den Rückmeldungen ASTRA zu AP-Dossier	1.00
420	19.08.2022	IG-Bespr. zur Stellungnahme zu den Rückmeldungen ASTRA zu AP-Dossier	0.50
420	22.08.2022	IG-Bespr. Überarbeitung AP-Dossier	1.00
420	23.08.2022	Überarbeitung AP-Dossier	1.00
420	24.08.2022	Überarbeitung AP-Dossier	1.00
420	25.08.2022	Überarbeitung AP-Dossier	1.00
Subtotal			6.00

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:


 08.09.2022

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.08.2022 bis 31.08.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Daniel Spieler


Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
420	22.08.2022	Einlesen und Prüfung Stellungnahme BHU zum AP SABA, interne Besprechung zu Stellungnahme BHU und weiteres Vorgehen bis Abgabe, Bearbeitung Inhaltsverzeichnis und Pkt. Stellungnahme BHU, Prüfung Situationspläne mit Angabe der Baulinien mit Korrex an Zeichner, Bearbeitung Faktenblätter und TB Entwässerungskonzept	5.75
420	24.08.2022	Bearbeitung der Pkt. aus Stellungnahme BHU (Anpassungen FB 17 und TB Entwässerungskonzept), Kontrolle Situationspläne mit Angaben der Baulinien b1-1 bis b2-11, Korrex an Zeichner bei Situation Bereich SABAs Mumpf und GWS-Bereich Au und GWS-Zonen, Besprechung mit F. Hof (Holinger) Bearbeitung Inhaltsverzeichnis, Schlussprüfung der Pläne Hauptabmessungen der Kunstbauten SABAs Mumpf und letzte Angaben an Zeichner, Unterlagen für Druck und Plot zusammengestellt und hochgeladen	9.00
420	25.08.2022	Bearbeitung TB Entwässerungskonzept gemäss Stellungnahme der BHU Kontrolle Situationspläne mit Angaben der Baulinien b1-3 bis b4-6 mit Korrex an Zeichner, Schlussprüfung der m Berichte mit Korrex in den Titelblätter, Schlussprüfung der Umweltnotizen i2 bis i4, Unterlagen für Druck und Plot zusammengestellt und hochgeladen	8.00
420	29.08.2022	Schlusskontrolle Situationspläne mit Angaben der Baulinien, TB einschliesslich flankierende Massnahmen und Nutzungsvereinbarung inkl. Anpassungen, Rücksprache mit F. Hof Holinger betreff Beilagen zum TB Entwässerungskonzept, Titelblatt Beilagen erstellt, Pläne Hauptabmessung kontrolliert und Korrex für Zeichner SABAs Mumpf, Schlusskontrolle Enteignungspläne und Grunderwerbstabellen, Unterlagen für Druck und Plot bereitgestellt und hochgeladen	3.75
420	30.08.2022	Schlusskontrolle und Prüfung der Pläne f1-2 bis f1,4 (Rheinfelden), f4-1 bis f4-4 (Anlagen Frick) Hauptabmessungen der Kunstbauten und Korrex an Zeichner, Besprechung mit BSA S. Herzig (Leipert) der MK Dokumente BSA	4.75
420	31.08.2022	Schlusskontrolle und Prüfung der Pläne f3-2 bis f37-4 (Anlage Eiken) Hauptabmessungen der Kunstbauten und Korrex für Zeichner, Abklärung mit S. Herzig (Leipert) und zusammenstellen der Kosten für gBSA AP für Synthesebericht und Identitätskarte	4.75
Subtotal			36.00

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:


 08.09.2022

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.08.2022 bis 31.08.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter		Stunden
Har	Christian Hardmeyer	48.00
MD	Dirk Martin	6.00
SD	Daniel Spieler	36.00
Aktivität		Stunden
420	AP SABA	90.00
Total		90.00

JAUSLIN STEBLER AG
Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.08.22 bis 31.08.22
Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP SABA inkl. SABA Mumpf

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Roth Stefan	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Forlin Sandro	B	0	122	0.00
Hartmann Peter	B	0	122	0.00
Mantinger Michael	B	0	122	0.00
Methner Raphael	B	0	122	0.00
Total	B	0		0.00
Brauchli Stefan	C	0	95	0.00
Grieder Fabio	C	3	95	285.00
Hunziker Livia	C	0	95	0.00
Stocker Thomas	C	0	95	0.00
Total	C	3		285.00
Deck Andreas	D	0	86	0.00
Dolder Silvio	D	0	86	0.00
Rothfuss Fabian	D	0	86	0.00
Haberthür Nicolas	D	0	86	0.00
Seebacher Andreas	D	0	86	0.00
Meyer Moritz	D	0	86	0.00
Nyffenegger Christoph	D	0	86	0.00
Brunner Andreas	D	0	86	0.00
Boeglin Chantal	D	0	86	0.00
Total	D	0		0.00
Müller Jan	E	0	62	0.00
Brüngger Marco	E	0	62	0.00
Ladner Roman	E	0	62	0.00
Russer Elisabeth	E	0	62	0.00
Wortelboer Alexander	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Dogan Esra	F	0	50	0.00
Prescha Deliah	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Strittmatter Katja (Praktikantin)	G	0	8	0.00
Möri Anna	G	0	8	0.00
Total	G	0		0.00
Aston Tim	G3/4	0	6	0.00
Gloor Leoni	G3/4	0	6	0.00
Straub Vanessa	G3/4	0	6	0.00
Schreiber Severin	G3/4	0	6	0.00
Hegi Yannick	G3/4	0	6	0.00
Total	G	0		0.00
Schneider Anika	G1/2	0	4	0.00
Total	G	0		0.00
Gesamttotal		3		285.00

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.08.2022 - 31.08.2022

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP SABA
Bezeichnung	AP SABA

Mitarbeiter	Grieder Fabio (fg)	Kategorie:	C253	Leitender Ingenieur
-------------	---------------------------	------------	------	---------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
12.08.2022	Sichtung Stellungnahme aus Vorprüfung 02 inkl. Weiterleitung INGE-intern	1.00
25.08.2022	Sichtung Anmerkungen D. Spieler betreffend Enteignungsplänen SABA inkl. Bereinigung	2.00

Summe		3.00
--------------	--	------

Leipert AG**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.08.2022 bis 31.08.2022****Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP SABA**

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Name Vorname	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Leipert Markus	B	16	122	1'952.00
Herzog Stefan	B	0	122	0.00
Riderle Timo	B	0	122	0.00
Total	B	16		1'952.00
Mozzillo Sergio	C	3	95	285.00
Weisskopf Silvan	C	0	95	0.00
Hofer Michael	C	0	95	0.00
Lazzarato Roberto	C	0	95	0.00
Total	C	3		285.00
Gassmann Silvia	D	0	86	0.00
Hofer Michael	D	43.5	86	3'741.00
Total	D	43.5		3'741.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Gesamttotal		62.5		5'978.00

Tag	Stunden 100%	Zuschlag 25%	Zuschlag 50%	Tätigkeitsbeschreibung
1				
2	11.00			Überarbeitung (Prinzip-)Pläne Rev. B: A-4.1.1 bis 4.1.9 Energieversorgungsabschnitte V0.9 (9 Stück)
3	10.00			Überarbeitung (Prinzip-)Pläne Rev. B: Pläne vom Vortag + Signalisation, Komm. Divers, Perlenkette, Erdung V0.9 (5 Stück)
4	10.50			Erstellen (Prinzip-)Pläne: Ausrüstung Lichtwellenleiter RHE-Ost bis Frick (6 Stück) / Dispositionen Elektrokabinen SABA, QSK, PW, PW mit Messung (4 Stück)
5	12.00			Anpassung und Kontrolle Synoptikpläne gem. allen Plänen Rev. A und Rev. B / Schlusskontrolle und Korrektur aller Pläne und aufarbeiten für Abgabe
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
Total	43.50	0.00	0.00	

Name:
Hofer

Vorname:
Michael

Monat:
August

Jahr:
2022

Kategorie:
D

Kostenart:
1.3100


Auftraggeber:
INGE EP RF BB

Auftragsnummer:
327.1

Bezeichnung:
N03, EP Rheinfelden Frick, Phase AP SABA

Vertrag Nr.:

Auftragsnummer extern:



Tag	Stunden	Zuschlag	Zuschlag	Tätigkeitsbeschreibung
	100%	25%	50%	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31	3.00			Besprechung AP und MK bei AeBo (Herr Spieler), Anpassungen der Unterlagen mit Anmerkung "VORABZUG"
Total	3.00	0.00	0.00	

Name: **Mozzillo**

Vorname: **Sergio**

Monat: **August**

Jahr: **2022**

Kategorie: **C**

Kostenart: **1.3100**

Auftraggeber: **INGE EP RF BB**

Auftragsnummer: **327.1**

Bezeichnung: **N03, EP Rheinfelden Frick, Phase AP SABA**

Vertrag Nr.: 

Auftragsnummer extern:

Tag	Stunden 100%	Zuschlag 25%	Zuschlag 50%	Tätigkeitsbeschreibung
1				
2	2.50			Durchsicht bereinigte Unterlagen SABA / PW für Ergänzungen MK / AP
3				
4				
5				
6	6.00			Anpassen AP aufgrund überarbeitetem MK
7	7.50			Ergänzungen AP Kosten, Beilage, Rückmeldungen, Hochladen Unterlagen
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
Total	16.00	0.00	0.00	

Name:
Leipert

Vorname:
Markus

Monat:
August

Jahr:
2022

Kategorie:
B

Kostenart:
1.3100

Auftraggeber:
INGE EP RF BB

Auftragsnummer:
327.1

Bezeichnung:
N03, EP Rheinfelden Frick, Phase AP SABA

Vertrag Nr.:

Auftragsnummer extern:



HOLINGER AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.08.2022 bis 31.08.2022

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP SABA inkl. SABA Mumpf

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Name Vorname	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Brodmann René	B	4.75	122	579.50
Name Vorname	B	0	122	0.00
Total	B	4.75		579.50
Wyrsh Vera	C	0	95	0.00
Heizmann Dominik	C	0	95	0.00
Pflugi Matthias	C	0	95	0.00
Schwab Alexander	C	0	95	0.00
Total	C	0		0.00
Wiss Lukas	D	0	86	0.00
Hof Fabian	D	14	86	1'204.00
Peier Reto	D	0	86	0.00
Schneider Tanja	D	0	86	0.00
Schill Jasmin	D	0	86	0.00
Total	D	14		1'204.00
Häfelfinger Sarah	E	0	62	0.00
Schlumpf Oliver	E	0	62	0.00
Gerber Joel	E	4.5	62	279.00
Ammann Carmen	E	0	62	0.00
Total	E	4.5		279.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Poggioli Marisa	G1/2	0	4	0.00
Reimann Lea	G1/2	0	4	0.00
Trinh Cherry	G1/2	0	4	0.00
Total	G1/2	0		0.00
Gesamttotal		23.25		2'062.50

Datum	Mitarbeiter	Text	Anzahl Std.
02.08.2022		Tel D Martin, Kanaldichtigkeiten in den Schutzzonen	1.00
16.08.2022		Tabelle Feedback BHU - Feedback an IG	1.50
18.08.2022		Feedback AeBo zu BHU, Mail, Koord.	0.75
25.08.2022		Fachbespr HFA, Kontrolle der Ergänzungen	1.50
	37. Brodmann René		4.75
09.08.2022		Auskunft F.Grieder KV AP SABA	0.50
15.08.2022		Projektbesprechung D.Martin	0.50
16.08.2022		Rückmeldungen Stellungnahme BHU	0.50
23.08.2022		Korrex Pläne	0.50
24.08.2022		Besprechung Pendenzen	0.50
24.08.2022		Anpassung Kosten+Berichte, Plankontrolle,	4.50
25.08.2022		Anpassungen Berichte	2.50
26.08.2022		Zusammenstellung Unterlagen für Abgabe	2.50
29.08.2022		Beilagen Entwässerungskonzept überarbeiten	2.00
	10077. Hof Fabian		14.00
24.08.2022		Plan-Anpassungen SABA Eiken und Rheinfelden	4.50
	11590. Gerber Joel		4.50
Total L3612.001 Rheinfelden-Frick, N3 EP PV SABA			23.25
