




Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt: N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
Vertragnehmer: INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau/BSA
Projektnummer: 090069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU): September


Vertragsdatum: 14.11.2018
Vertragslaufzeit: 31.12.2022
Finanzierungskonto: Unterhalt
Inventarobjekt: FUP.2
Phasen, beauftragt: MK, Phase 31
Phasen, rapportiert: MK, Phase 31

Aktuelle Stundenausschöpfung

(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

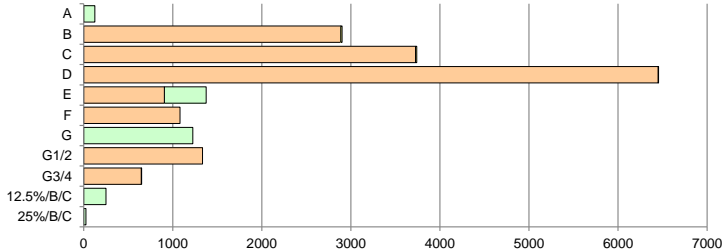

Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	125	1		124		1%
B	2250	2885.75	15.25		651	129%
C	3350	3725.5	14		389.5	112%
D	4375	6451.25	3.5		2079.75	148%
E	1375	906.25		468.75		66%
F	950	1081.25			131.25	114%
G	1225			1225		
G1/2		1334			1334	
G3/4		647.25	3.25		650.5	
12.5%/B/C	250			250		
25%/B/C	25			25		
Σ	13925	17032.25	36	2092.75	17068.25	123%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung 99%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach CHF 1'133'743.75

Kosten ist CHF 1'383'917

Kostenausschöpfung 122.07%

Stundenausschöpfung 123%

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B	1469.5	51.25	135	40.75	18	26.25	28.5	45	30.25	15.25				1859.75
	Kategorie	C	899.25	52	49.75	12.25	-12.25	1	8	10	3					1023
	Kategorie	D	2578	194.25	284.75	10.5	14.25	64.5	37	56.75	3.75					3243.75
	Kategorie	E	83.25													83.25
	Kategorie	F	896.25	104.25	20.75				7.5	7.25						1036
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2	1144.75							13						1157.75
	Kategorie	G3/4	109.25									2.25				111.5
Jauslin Stebler AG	Kategorie	A	1													1
	Kategorie	B	647.5	27	9.5		0.5			0.25						684.75
	Kategorie	C	2410.25	103	50.25	10.75	4	13	29.5	18.25	25.75	14				2678.75
	Kategorie	D	2781.25	43	63.5		2.5	3	24.25	38	5.5	3.5				2964.5
	Kategorie	E	769.75	19.5	19					12.5						820.75
	Kategorie	F	45.25													45.25
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2	116.5	3.25	2				4.5	2.25						128.5
	Kategorie	G3/4	447.5	18.5	52				11	9		1				539
Leipert AG	Kategorie	B	278													278
	Kategorie	C	7													7
	Kategorie	D	192													192
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
Holinger AG	Kategorie	B	78.5													78.5
	Kategorie	C	30.75													30.75
	Kategorie	D	54.5													54.5
	Kategorie	E	2.25													2.25
	Kategorie	F														
	Kategorie	G1/2	47.75													47.75

Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MwSt., inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A	145													145
CHF 122.00	B	301767	9547	17629	4972	2257	3203	3477	5521	3691	1861				353922
CHF 95.00	C	317989	14725	9500	2185	-784	1330	3563	2684	2731	1330				355253
CHF 86.00	D	482095	20404	29950	903	1441	5805	5268	8149	796	301				555109
CHF 62.00	E	53026	1209	1178					775						56188
CHF 50.00	F	47075	5213	1038				375	363						54063
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2	5236	13	8				70	9						5336
CHF 6.00	G3/4	3341	111	312				66	54		20				3903
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		1210672.25	51220.50	59614.00	8059.50	2913.75	10337.50	12818.00	17553.25	7217.25	3511.00				CHF 1'383'917.00

Aegerter & Bosshardt AG**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.09.2022 bis 30.09.2022****Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Projektleitung (MK)**

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
--	A	0	145	0.00
--	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Falzone Lorenzo	B	0	122	0.00
Fuchs Christian	B	4	122	488.00
Schädler Beat	B	0	122	0.00
Spieler Daniel	B	0	122	0.00
Total	B	4		488.00
Nef Regula	D	0	86	0.00
Martin Noëlle	D	0	86	0.00
Total	D	0		0.00
Gesamttotal		4		488.00

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.09.2022 bis 30.09.2022

Mandant Name	AeBo	1000		
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	100	Projektleitung	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9890 EP RF-BB

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Fuchs Christian	B	4.00	122.00	488.00
Total PLA 100.Projektleitung		4.00	122.00	488.00

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.09.2022 bis 30.09.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	100	Projektleitung	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc			

Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
Christian Fuchs	100	01.09.2022	Mail an AKP, => Aufnahme aktualisierter Berichte in Dossier, Prüfen mit SD	0.50
	100	05.09.2022	Abgabe Dossiers MK/AP, INGE- interne Abstimmung	0.50
	100	07.09.2022	Interne Prüfung Stand der Arbeiten (mit F. Grieder); Themen/Traktanden f. allf. Sitzung prüfen	0.50
	100	08.09.2022	Rückmeldung an BHU (Absage)	0.25
	100	15.09.2022	Mails (von Sni) prüfen	0.25
	100	16.09.2022	Durchgehen Ergänzungen für MK-/AP-Dossiers in INGE (mit F. Grieder und D. Spieler), Prüfen der Hinweise Sni und entspr. Anpassungen vorsehen / beauftragen	1.50
	100	19.09.2022	Nochmalige Rücksprache zu Anpassungen der Berichte mit D. Spieler	0.50
Subtotal				4.00

Mitarbeiter	Kat.	Stunden
FCh Christian Fuchs	B	4.00

Aktivität	Stunden
100 Projektleitung	4.00
Total	4.00

Aegerter & Bosshardt AG

Datum: 07.10.2022

Visum PL:

CFH

Aegerter & Bosshardt AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.09.2022 bis 30.09.2022

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Massnahmenkonzept

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
--	A	0	145	0.00
--	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Beck Peter	B	0	122	0.00
Falzone Lorenzo	B	0	122	0.00
Häner David	B	0	122	0.00
Fuchs Christian	B	0	122	0.00
Niedermeyer Friederike	B	0	122	0.00
Ruff Ute	B	0	122	0.00
Schädler Beat	B	0	122	0.00
Spieler Daniel	B	11.25	122	1'372.50
Weber Madeleine	B	0	122	0.00
Total	B	11.25		1'372.50
Brem Jakob	C	0	95	0.00
Chroust Steffi	C	0	95	0.00
Kern Etienne	C	0	95	0.00
Martin Dirk	C	0	95	0.00
Mendoza Maria	C	0	95	0.00
Yelman Mahir	C	0	95	0.00
Wieland Manuel	C	0	95	0.00
Total	C	0		0.00
Hardmeyer Christian	D	0	86	0.00
Delmas Marc	D	0	86	0.00
Beuret Agnès	D	0	86	0.00
Chrysopoulos Viktorria	D	0	86	0.00
Fischer Michel	D	0	86	0.00
Lüthi Tobias	D	0	86	0.00
Meier Lukas	D	0	86	0.00
Moser Tobias	D	0	86	0.00
Meyer Ramona	D	0	86	0.00
Nicolosi Lucia	D	0	86	0.00
Schaub Anja	D	0	86	0.00
Schneider Martin	D	0	86	0.00
Nef Regula	D	0	86	0.00
Martin (Weider) Noëlle	D	0	86	0.00
Total	D	0		0.00
Schär Cédric	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Boser Florian	F	0	50	0.00
Boschung Jan	F	0	50	0.00
Christ Florian	F	0	50	0.00
Karabasoglu Emre	F	0	50	0.00
Schär Raphaël	F	0	50	0.00
Schmidlin Julian	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Bätscher Basil	G 1/2	0	4	0.00
Rizzo Arianna	G 1/2	0	4	0.00
Wagner Mika	G 1/2	0	4	0.00
Honegger Mark	G 1/2	0	4	0.00
Zimmermann Alec	G 1/2	0	4	0.00
Total	G 1/2	0		0.00
Krenger Kyara	G 3/4	0	6	0.00
Wagner Mika	G 3/4	2.25	6	13.50
Weber Fabian	G 3/4	0	6	0.00
Davet Kilian	G 3/4	0	6	0.00
Manz Selena	G 3/4	0	6	0.00
Total	G 3/4	2.25		13.50
Gesamttotal		13.5		1'386.00

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.09.2022 bis 30.09.2022

Mandant Name	AeBo	1000		
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	310	MK, FB T-U	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9890 EP RF-BB

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Spieler Daniel	B	11.25	122.00	1'372.50
Wagner Mika	G3/4	2.25	6.00	13.50
Total PLA 310.MK, FB T-U		13.50	102.67	1'386.00

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.09.2022 bis 30.09.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	310	MK, FB T-U	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc			

Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
Daniel Spieler	310	01.09.2022	Prüfen und zusammenstelle aller Kosten der MK -Dossiers für Synthesebericht und Rücksprache mit den PVs der einzelnen MKs, Fertigstellung Synthesebericht, Vollständigkeitsprüfung der Pläne und Berichte für digitale Abgabe bei allen MK-Dossier	3.75
	310	02.09.2022	Fertigstellung er Inhaltsverzeichnisse für die definitive Anzahl Dossier-Boxen für alle MKs, Schlusskontrolle der Dossiers auf Vollständigkeit, speichern der Sticks	2.75
	310	05.09.2022	Abklärungen Unterlagen MK BSA mit M. Leipert, neue Abgabe erfolgt direkt durch Fa. Leipert, Anpassung LS, Bereitstelle der MK/AP für Versand, Bearbeitung Zugriff zu Videobefahrung 3dvideo.astra (ohne Erfolg) weitere Abklärungen mit iNovitas Support	1.75
	310	07.09.2022	Bearbeitung Zutritt 3D-Videobefahrung ASTRA und Versand neues Passwort an IG und BHU	0.50
	310	19.09.2022	Bearbeitung Synthesebericht mit Ergänzungen Detailkosten MK und und Lesbarkeit Grobterminplan bearbeitet, Bericht zusammengestellt	1.75
	310	23.09.2022	Erstellen der Dossiers AP und MK und hochladen auf SharePoint ASTRA	0.75
			Subtotal	11.25
Mika Wagner	310	05.09.2022	Unterlagen nach Zofingen bringen	2.25
			Subtotal	2.25

Mitarbeiter		Kat.	Stunden
SD	Daniel Spieler	B	11.25
Wmi	Mika Wagner	G3/4	2.25

Aktivität		Stunden
310	MK, FB T-U	13.50
Total		13.50

Aegerter & Bosshardt AG

Datum: 07.10.2022 Visum PL: C.F.H.

JAUSLIN STEBLER AG
Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.09.22 bis 30.09.22
Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Massnahmenkonzept

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Roth Stefan	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Forlin Sandro	B	0	122	0.00
Hartmann Peter	B	0	122	0.00
Mantinger Michael	B	0	122	0.00
Methner Raphael	B	0	122	0.00
Total	B	0		0.00
Brauchli Stefan	C	1.25	95	118.75
Grieder Fabio	C	12.75	95	1'211.25
Hunziker Livia	C	0	95	0.00
Stocker Thomas	C	0	95	0.00
Total	C	14		1'330.00
Abdelmoghni Ahmed	D	0	86	0.00
Deck Andreas	D	0	86	0.00
Dolder Silvio	D	0	86	0.00
Rothfuss Fabian	D	0	86	0.00
Haberthür Nicolas	D	0	86	0.00
Seebacher Andreas	D	0	86	0.00
Meyer Moritz	D	0	86	0.00
Nosdeo Maya	D	3.5	86	301.00
Nyffenegger Christoph	D	0	86	0.00
Brunner Andreas	D	0	86	0.00
Boeglin Chantal	D	0	86	0.00
Total	D	3.5		301.00
Müller Jan	E	0	62	0.00
Brüngger Marco	E	0	62	0.00
Ladner Roman	E	0	62	0.00
Russer Elisabeth	E	0	62	0.00
Wortelboer Alexander	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Dogan Esra	F	0	50	0.00
Köchli Pascal	F	0	50	0.00
Prescha Deliah	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Strittmatter Katja (Praktikantin)	G	0	8	0.00
Möri Anna	G	0	8	0.00
Total	G	0		0.00
Aston Tim	G3/4	0	6	0.00
Gloor Leoni	G3/4	0	6	0.00
Straub Vanessa	G3/4	0	6	0.00
Schreiber Severin	G3/4	0	6	0.00
Hegi Yannick	G3/4	1	6	6.00
Total	G	1		6.00
Schneider Anika	G1/2	0	4	0.00
Total	G	0		0.00
Gesamttotal		18.5		1'637.00

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.09.2022 - 30.09.2022

Projekt-Nr.:	702288.2160
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.2160_PH 31 T-G
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-G

Mitarbeiter	Brauchli Stefan (bsn)	Kategorie:	C354	Architekt, Ingenieur (C)
-------------	------------------------------	------------	------	--------------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
-------	-----------------------	---------

01.09.2022	Schlusskontrolle Abgabedossier T/G, Veranlassung Versand an INGE-Partner	1.25
------------	--------------------------------------------------------------------------	------

Summe		1.25
--------------	--	------

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.09.2022 - 30.09.2022

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung: **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Auftrag-Nr.: 702288.0_PH 31 PL
Bezeichnung: **EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) PL**

Mitarbeiter: **Grieder Fabio (fg)** Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
02.09.2022	Aktualisierung Gesamt-KV (MK-Dossier) inkl. Abgleich mit D. Spieler	2.50
16.09.2022	Koordination mit GPL, BHU und innerhalb IG betreffend div. Abgabedetails (Gesamt-KV im Synthesedossier, relevanten Gemeinden für APs)	2.00
22.09.2022	Koordination mit BHU betreffend KoSi WTK Möhlin inkl. Erstellung Zusammenfassung VF	2.50
23.09.2022	Vorbereitung mit BHU betreffend KoSi WTK Möhlin (Durchsicht Präsentation und Überlegungen betreffend Integration in Bauablauf); Div. kleine Anpassungen gem. Absprache mit O. Drengemann	2.50
28.09.2022	KoSi mit WTK inkl. Vor- und Nachbereitung; Info C. Fuchs nach KoSi	3.25
Summe		12.75

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.09.2022 - 30.09.2022

Projekt-Nr.:	702288.2160
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.2160_PH 31 T-G
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-G

Mitarbeiter	Nosdeo Maya (mn)	Kategorie:	D375	Kaufm.- /Sekretariatspers.(D)
-------------	-------------------------	------------	------	----------------------------------

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
01.09.2022	Erstellen Papierdossier für Abgabe Vorabzug an FU	3.50

Summe		3.50
--------------	--	------

ARBEITSRAPPORT





Periode: 01.09.2022 - 30.09.2022

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 T-U
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U

Mitarbeiter	Hegi Yannick (yh)	Kategorie:	H	Lehrling (3. + 4. Lj)
-------------	--------------------------	------------	---	-----------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
30.09.2022	Leitungskataster Entwässerung und BSA auf Bereich WTK Möhlin zu schneiden (für Übergabe an PV WTK Möhlin)	1.00
Summe		1.00

Vertragsdatum:	14.11.2018
Vertragslaufzeit:	31.12.2022
Finanzierungskonto:	Unterhalt
Inventarobjekt:	FUP.2
Phasen, beauftragte:	Option SABA
Phasen, rapportiert:	Option SABA

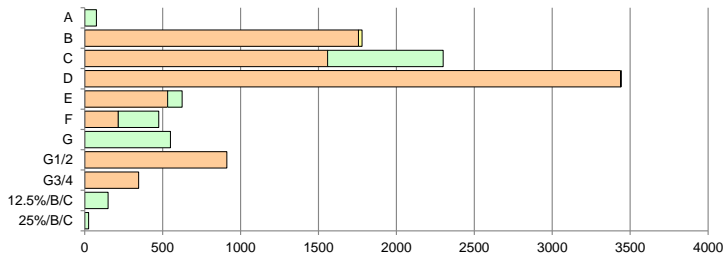

Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	75			75		
B	1525	1756.5	23		254.5	117%
C	2300	1558.5		741.5		68%
D	2400	3439.25	2		1041.25	143%
E	625	532		93		85%
F	475	215.5		259.5		45%
G	550			550		
G1/2		912			912	
G3/4		346			346	
12.5%/B/C	150			150		
25%/B/C	25			25		
Σ	8125	8759.75	25	1894	8784.75	108%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer	
Selbsteinschätzung	95%
rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)	
Kostendach	CHF 691'437.50
Kosten ist	CHF 710'587
Kostenausschöpfung	102.77%
Stundenausschöpfung	108%

[illegible]

Kostenabrechnung															
Ansatz (exkl. MwSt., inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A														
CHF 122.00	B	124013	9'669	20771	7473	7'137	11'102	25681	1'525	6'924	2806				217099
CHF 95.00	C	83648	13'633	25793	2423	2945	6'650	7'386	4'441	1'140					148'058
CHF 86.00	D	151317	37'045	34529	4'279	5999	12750	32'057	8'729	9'073	172				295'948
CHF 62.00	E	26583	2'263	2'589				744	527	279					32'984
CHF 50.00	F	2750	2'913	2'063	50	388	1'813	800							10775
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2	2'183	671	236	14	105	79	226	134						3'648
CHF 6.00	G3/4	560	66	371		206	551	324							2'076
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		391'052.50	66'258.00	86'349.50	14'237.50	16'778.50	32'943.50	67'217.75	15'356.25	17'415.50	2'978.00				CHF 710'587.00

Aegerter & Bosshardt AG
Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.09.2022 bis 30.09.2022
Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP SABA inkl. SABA Mumpf

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
--	A	0	145	0.00
--	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Beck Peter	B	0	122	0.00
Falzone Lorenzo	B	0	122	0.00
Fuchs Christian	B	0	122	0.00
Niedermeyer Friederike	B	0	122	0.00
Jung Roman	B	0	122	0.00
Ruff Ute	B	0	122	0.00
Schädler Beat	B	0	122	0.00
Spieler Daniel	B	18.5	122	2'257.00
Total	B	18.5		2'257.00
Kern Etienne	C	0	95	0.00
Martin Dirk	C	0	95	0.00
Mendoza Maria	C	0	95	0.00
Nommay Emmanuelle	C	0	95	0.00
Total	C	0		0.00
Enderlen Francis	D	0	86	0.00
Di Maura Miriam	D	0	86	0.00
Di Maria Marcello	D	0	86	0.00
Hardmeyer Christian	D	2	86	172.00
Iten Vanessa	D	0	86	0.00
Meyer Ramona	D	0	86	0.00
Nicolosi Lucia	D	0	86	0.00
Breiter Michael	D	0	86	0.00
Schaub Anja	D	0	86	0.00
Wira Stephane	D	0	86	0.00
Total	D	2		172.00
Schär Cedric	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Boschung Jan	F	0	50	0.00
Christ Florian Michael	F	0	50	0.00
Redlich Moritz	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Bätscher Basil	G 1/2	0	4	0.00
Rizzo Arianna	G 1/2	0	4	0.00
Streiff Timon	G 1/2	0	4	0.00
Zimmermann Alec	G 1/2	0	4	0.00
Total	G 1/2	0		0.00
Wagner Mika	G 3/4	0	6	0.00
Total	G 3/4	0		0.00
Gesamttotal		20.5		2'429.00

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.09.2022 bis 30.09.2022

Mandant Name	AeBo	1000		
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9890 EP RF-BB

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Spieler Daniel	B	18.50	122.00	2'257.00
Hardmeyer Christian	D	2.00	86.00	172.00
Total PLA 420.AP SABA		20.50	118.49	2'429.00

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.09.2022 bis 30.09.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc			

Mitarbeiter	Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
Christian Hardmeyer	420	01.09.2022	Ergänzen Titelblätter und Rückenschilder für Planmappen	2.00
			Subtotal	2.00
Daniel Spieler	420	01.09.2022	Zusammenstelle der Kosten der AP-Dossiers für Synthesebericht, Vollständigkeitsprüfung der Pläne und Berichte für die digitale Abgabe bei allen APs,	4.00
	420	02.09.2022	Fertigstellung der Inhaltsverzeichnisse für alle APs für die definitive Anzahl Dossier-Boxen Bearbeiten Dokument Vollständigkeitsprüfung für die APs, Schlusskontrolle der Dossiers auf Vollständigkeit, Fertigstellung Dossier für FU Landerwerb, speichern der Sticks und Schreiben für ASTRA erstellt	3.50
	420	19.09.2022	Besprechung mit C. Fuchs und Abklärungen mit R. Brodmann (Holinger) betreff neues Dokument KV SABA und einlesen in Unterlagen und Festlegung neue Darstellung	1.00
	420	20.09.2022	Bearbeitung neues Dokument j KV SABA und Rücksprache mit R. Brodmann (Holinger) Vorbemerkungen (Ausgangslage und Randbedingungen) zu KV geschrieben, Überarbeitung neues Titelblatt	6.00
	420	21.09.2022	Bearbeitung neues Dokument j Angaben über die Kosten (ein Dokument), Zusammenstellung der Kosten und Versand per E-Mail zur Durchsicht an N. Schulz	3.25
	420	22.09.2022	Schlusskontrolle der Papierdokument, neue Sticks für Synthesedossier und AP SABA erstellt, Lieferschein und Versand per Post an N. Schulz	0.75
			Subtotal	18.50

Mitarbeiter		Kat.	Stunden
Har	Christian Hardmeyer	D	2.00
SD	Daniel Spieler	B	18.50

Aktivität		Stunden
420	AP SABA	20.50
Total		20.50

Aegerter & Bosshardt AG

Datum: 07.10.2022

Visum PL: C.F.H.

Leipert AG**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.09.2022 bis 30.09.2022****Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP SABA**

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Name Vorname	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Leipert Markus	B	0.5	122	61.00
Herzog Stefan	B	0	122	0.00
Riderle Timo	B	0	122	0.00
Total	B	0.5		61.00
Mozzillo Sergio	C	0	95	0.00
Weisskopf Silvan	C	0	95	0.00
Hofer Michael	C	0	95	0.00
Lazzarato Roberto	C	0	95	0.00
Total	C	0		0.00
Gassmann Silvia	D	0	86	0.00
Hofer Michael	D	0	86	0.00
Total	D	0		0.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Gesamttotal		0.5		61.00

Tag	Stunden 100%	Zuschlag 25%	Zuschlag 50%	Tätigkeitsbeschreibung
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28	0.50			Mail betr. Bemerkungen zu AP studiert betr. Hinweise zu g BSA
29				
30				
Total	0.50	0.00	0.00	

Name:
Leipert

Vorname:
Markus

Monat:
September

Jahr:
2022

Kategorie:
B

Kostenart:
1.3100

Auftraggeber:
INGE EP RF BB

Vertrag Nr.:
327.1

Auftragsnummer:
N03, EP Rheinfelden Frick, Phase AP SABA

Auftragsnummer extern:


HOLINGER AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.09.2022 bis 30.09.2022

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP SABA inkl. SABA Mumpf

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Name Vorname	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Brodmann René	B	4	122	488.00
Name Vorname	B	0	122	0.00
Total	B	4		488.00
Wyrsh Vera	C	0	95	0.00
Heizmann Dominik	C	0	95	0.00
Pflugi Matthias	C	0	95	0.00
Schwab Alexander	C	0	95	0.00
Total	C	0		0.00
Wiss Lukas	D	0	86	0.00
Hof Fabian	D	0	86	0.00
Peier Reto	D	0	86	0.00
Schneider Tanja	D	0	86	0.00
Schill Jasmin	D	0	86	0.00
Total	D	0		0.00
Häfelfinger Sarah	E	0	62	0.00
Schlumpf Oliver	E	0	62	0.00
Gerber Joel	E	0	62	0.00
Ammann Carmen	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Poggioli Marisa	G1/2	0	4	0.00
Reimann Lea	G1/2	0	4	0.00
Trinh Cherry	G1/2	0	4	0.00
Total	G1/2	0		0.00
Gesamttotal		4		488.00


Datum	Mitarbeiter	Text	Anzahl Std.
19.09.2022		Tel Mail Spieler, Anpassen Zusammenfassen aller Kosten SABA	1.50
20.09.2022		Tel + Mail Spieler für Zusammenfassen aller Kosten SABA	1.50
21.09.2022		Tel + Mail Spieler Schlusskontrolle Kosten SABA	1.00
	37. Brodmann René		4.00
Total L3612.001 Rheinfelden-Frick, N3 EP PV SABA			4.00

Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt: N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
Vertragnehmer: INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau/BSA
Projektnummer: 090069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU): September

Vertragsdatum: 14.11.2018
Vertragslaufzeit: 31.12.2022
Finanzierungskonto: Unterhalt
Inventarobjekt: FUP.2
Phasen, beauftragt: GHGW
Phasen, rapportiert: GHGW

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

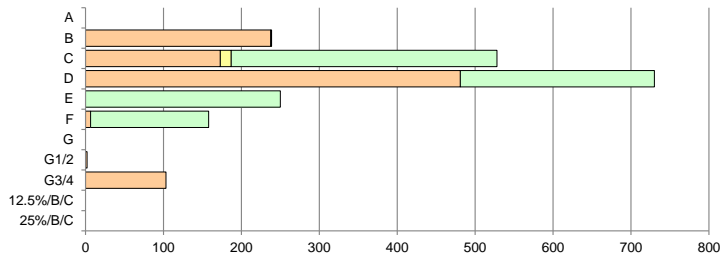

Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B	130	237.75	1		108.75	184%
C	528	173	14	341		35%
D	730	481		249		66%
E	250			250		
F	158	6.5		151.5		4%
G						
G1/2		2			2	
G3/4		103.25			103.25	
12.5%/B/C						
25%/B/C						
Σ	1796	1003.5	15	991.5	1018.5	57%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer
Selbsteinschätzung 90%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach	CHF 152'200.00
Kosten ist	CHF 89'211
Kostenausschöpfung	58.61%
Stundenausschöpfung	57%

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG																
	Kategorie	A														
	Kategorie	B	2													2
	Kategorie	C	7.25													7.25
	Kategorie	D	20	17.75												37.75
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
	Kategorie	G3/4														
Jauslin Stebler AG																
	Kategorie	A														
	Kategorie	B	0.25													0.25
	Kategorie	C	124	8.75												132.75
	Kategorie	D	282.75	124.5	29.25											436.5
	Kategorie	E														
	Kategorie	F	6.5													6.5
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2			2											2
	Kategorie	G3/4	56.75	46.5												103.25
Leipert AG																
	Kategorie	B	60	48.5	28		11	13.5	6.5	30.5	37.5	1				236.5
	Kategorie	C		4						23	6	14				47
	Kategorie	D			6.75											6.75
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
Holinger AG																
	Kategorie	B														
	Kategorie	C														
	Kategorie	D														
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G1/2														
Total																
			559.5	250	66		11	13.5	6.5	53.5	43.5	15				1018.5

Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MwSt., inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A														
CHF 122.00	B	7595	5917	3416		1342	1647	793	3721	4575	122				29'128
CHF 95.00	C	12469	1211						2185	570	1330				17'765
CHF 86.00	D	26'037	12'234	3'096											41'366
CHF 62.00	E														
CHF 50.00	F	325													325
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2			8											8
CHF 6.00	G3/4	341	279												620
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		46'765.25	19'640.75	6'520.00		1'342.00	1'647.00	793.00	5'906.00	5'145.00	1'452.00				CHF 89'211.00

Leipert AG**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.09.2022 bis 30.09.2022****Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, GHGW**

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Name Vorname	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Leipert Markus	B	1	122	122.00
Herzog Stefan	B	0	122	0.00
Riderle Timo	B	0	122	0.00
Total	B	1		122.00
Mozzillo Sergio	C	14	95	1'330.00
Weisskopf Silvan	C	0	95	0.00
Hofer Michael	C	0	95	0.00
Lazzarato Roberto	C	0	95	0.00
Total	C	14		1'330.00
Gassmann Silvia	D	0	86	0.00
Hofer Michael	D	0	86	0.00
Total	D	0		0.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Gesamttotal		15		1'452.00

Tag	Stunden	Zuschlag	Zuschlag	Tätigkeitsbeschreibung
	100%	25%	50%	
1				
2				
3				
4				
5	6.50			Vorbereiten der div. Unterlagen für die Abgabe MK & AP
6	1.00			Vorbereiten der div. Unterlagen für die Abgabe MK & AP
7	6.50			Zusammenstellung MK & AP, Abgabe an ASTRA
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
Total		14.00	0.00	0.00

Name:

Mozzillo

Vorname:

Sergio

Monat:

September

Jahr:

2022

Kategorie:

C

Kostenart:

1.3100

Auftraggeber:

INGE EP RF BB

Auftragsnummer:


327.2

Bezeichnung:

N03, EP Rheinfelden Frick, GHGW (MK)

Vertrag Nr.:

Auftragsnummer extern:



Tag	Stunden	Zuschlag	Zuschlag	Tätigkeitsbeschreibung
	100%	25%	50%	
1				
2				
3				
4				
5	1.00			div. Abkl. zu Abgabe MK, Inhaltsverzeichnis erstellt
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
Total	1.00	0.00	0.00	

Name: Leipert	Vorname: Markus	Monat: September	Jahr: 2022	Kategorie: B	Kostenart: 1.3100
-------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------------

Auftraggeber: INGE EP RF BB	Vertrag Nr.: 
Auftragsnummer: 327.2	Auftragsnummer extern:
Bezeichnung: N03, EP Rheinfelden Frick, GHGW (MK)	
