




## Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt: N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen  
Vertragnehmer: INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG  
Vertrag Nr.: 000003  
Vertragsgegenstand: PV Bau/BSA  
Projektnummer: 090069  
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2022  
Beobachtungsmonat (Std. NEU): September


Vertragsdatum: 14.11.2018  
Vertragslaufzeit: 31.12.2022  
Finanzierungskonto: Unterhalt  
Inventarobjekt: FUP.2  
Phasen, beauftragt: GHGW  
Phasen, rapportiert: GHGW

### Aktuelle Stundenausschöpfung

(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

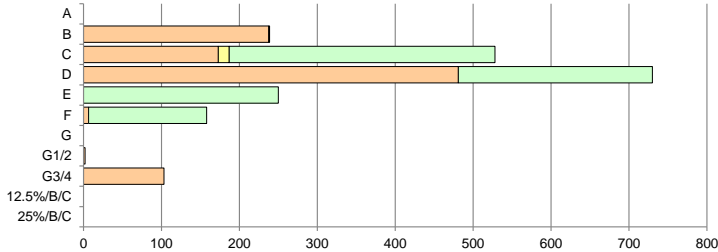

### Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B	130	237.75	1		108.75	184%
C	528	173	14	341		35%
D	730	481		249		66%
E	250			250		
F	158	6.5		151.5		4%
G						
G1/2		2			2	
G3/4		103.25			103.25	
12.5%/B/C						
25%/B/C						
Σ	1796	1003.5	15	991.5	1018.5	57%

### quantitative Selbstschätzung seitens Auftragnehmer

Selbstschätzung 90%

### rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach CHF 152'200.00

Kosten ist CHF 89'211

Kostenausschöpfung 58.61%

Stundenausschöpfung 57%

### Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B	2													2
	Kategorie	C	7.25													7.25
	Kategorie	D	20	17.75												37.75
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Jauslin Stebler AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B	0.25													0.25
	Kategorie	C	124	8.75												132.75
	Kategorie	D	282.75	124.5	29.25											436.5
	Kategorie	E														
	Kategorie	F	6.5													6.5
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2			2											2
Leipert AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B	60	48.5	28		11	13.5	6.5	30.5	37.5	1				236.5
	Kategorie	C		4						23	6	14				47
	Kategorie	D			6.75											6.75
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Holinger AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B														
	Kategorie	C														
	Kategorie	D														
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Total			559.5	250	66		11	13.5	6.5	53.5	43.5	15				1018.5

### Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MwSt., inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A														
CHF 122.00	B	7595	5917	3416		1342	1647	793	3721	4575	122				29'128
CHF 95.00	C	12469	1211						2185	570	1330				17765
CHF 86.00	D	26'037	12'234	3'096											41'366
CHF 62.00	E														
CHF 50.00	F	325													325
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2			8											8
CHF 6.00	G3/4	341	279												620
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		46'765.25	19'640.75	6'520.00		1'342.00	1'647.00	793.00	5'906.00	5'145.00	1'452.00				CHF 89'211.00

**Leipert AG****Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.09.2022 bis 30.09.2022****Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, GHGW**

<b>Mitarbeiter</b>	<b>Kat.</b>	<b>Stunden</b>	<b>Kostensatz</b>	<b>Betrag</b>
Name Vorname	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
<b>Total</b>	<b>A</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>
Leipert Markus	B	1	122	122.00
Herzog Stefan	B	0	122	0.00
Riderle Timo	B	0	122	0.00
<b>Total</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>122.00</b>
Mozzillo Sergio	C	14	95	1'330.00
Weisskopf Silvan	C	0	95	0.00
Hofer Michael	C	0	95	0.00
Lazzarato Roberto	C	0	95	0.00
<b>Total</b>	<b>C</b>	<b>14</b>		<b>1'330.00</b>
Gassmann Silvia	D	0	86	0.00
Hofer Michael	D	0	86	0.00
<b>Total</b>	<b>D</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>
Name Vorname	E	0	62	0.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
<b>Total</b>	<b>E</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>
Name Vorname	F	0	50	0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
<b>Total</b>	<b>F</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>
<b>Gesamttotal</b>		<b>15</b>		<b>1'452.00</b>

Tag	Stunden	Zuschlag	Zuschlag	Tätigkeitsbeschreibung
	100%	25%	50%	
1				
2				
3				
4				
5	6.50			Vorbereiten der div. Unterlagen für die Abgabe MK & AP
6	1.00			Vorbereiten der div. Unterlagen für die Abgabe MK & AP
7	6.50			Zusammenstellung MK & AP, Abgabe an ASTRA
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
Total		14.00	0.00	0.00

Name: **Mozzillo**

Vorname: **Sergio**

Monat: **September**

Jahr: **2022**

Kategorie: **C**

Kostenart: **1.3100**


Auftraggeber: **INGE EP RF BB**

Auftragsnummer: **327.2**

Bezeichnung: **N03, EP Rheinfelden Frick, GHGW (MK)**

Vertrag Nr.:

Auftragsnummer extern:





Leipert AG

ELEKTROPLANUNG-BAULEITUNG

Tag	Stunden	Zuschlag	Zuschlag	Tätigkeitsbeschreibung
	100%	25%	50%	
1				
2				
3				
4				
5	1.00			div. Abkl. zu Abgabe MK, Inhaltsverzeichnis erstellt
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
Total	1.00	0.00	0.00	

Name: <b>Leipert</b>	Vorname: <b>Markus</b>	Monat: <b>September</b>	Jahr: <b>2022</b>	Kategorie: <b>B</b>	Kostenart: <b>1.3100</b>
-------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------------

Auftraggeber: <b>INGE EP RF BB</b>	Vertrag Nr.: <b>327.2</b>	
Auftragsnummer: <b>N03, EP Rheinfelden Frick, GHGW (MK)</b>	Auftragsnummer extern:	
