



Projekt:	N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
Vertragnehmer:	INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.:	000003
Vertragsgegenstand:	PV Bau/BSA
Projektnummer:	090069
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2021
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Dezember

Vertragsdatum:	14.11.2018
Vertragslaufzeit:	31.12.2022
Finanzierungskonto:	Unterhalt
Inventarobjekt:	FUP.2
Phasen, beauftragt:	AP Bypass
Phasen, rapportiert:	AP Bypass

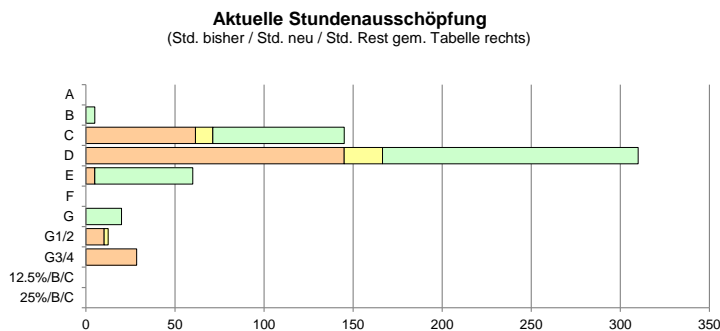

### Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B	5			5		
C	145	61.5	9.75	73.75		49%
D	310	145	21.5	143.5		54%
E	60	5		55		8%
F						
G	20			20		
G1/2		10.25	2.25		12.5	
G3/4		28.5			28.5	
12.5%/B/C						
25%/B/C						
Σ	540	250.25	33.5	297.25	283.75	53%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer		
Selbsteinschätzung		90%
rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)		
Kostendach		CHF 44'925.00
Kosten Ist		CHF 21'619
Kostenausschöpfung		48.12%
Stundenausschöpfung		53%

[illegible]

Kostenabrechnung															
Ansatz (excl. MwSt., inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A														
CHF 122.00	B														
CHF 95.00	C								428	594	1'425	1'900	1'496	926	6'769
CHF 86.00	D								1'763	301	1'032	4'838	4'537	1'849	14'319
CHF 62.00	E											310			310
CHF 50.00	F														
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2											24	17	9	50
CHF 6.00	G3/4										42	117	12		171
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total									2'190.50	894.75	2'499.00	7'188.50	6'061.75	2'784.25	CHF 21'618.75
