

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Muttenz 1 03.03.2023
Projektleiter Grieder Fabio
Ihre Referenz Christian Fuchs

Unsere Referenz 702288.0
MwSt.-Nr. CHE-459.227.258 MWST

N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069

Rechnung Nr. 70025571

Periode 01.02.2023 - 28.02.2023

Leistungsbeschreibung:
Rechnung 15, Bypass

Eigene Leistungen 2'722.50

MWST 7.70 % von 2'722.50 209.63

Total Gesamtbetrag inkl. MWST 2'932.13

Alle Beträge in CHF
Zahlbar innert 30 Tage netto
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:
- Einzahlungsschein
- Rapporte

Detailbeleg Auftrag 702288.0_PH 31_AP BYPASS Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV
Bau/BSA

Projektkurzbezeichnung: EP RhFr

Projektnummer: 090069

AP Bypass

Eigene Leistungen


Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202302	Grieder Fabio	6.00	95.00	570.00
202302	Mantinger Michael	0.25	122.00	30.50
Stundenleistung	B353 Leitender Ingenieur(B)	6.25		600.50
202302	Abdelmoghni Ahmed	13.75	86.00	1'182.50
202302	Dolder Silvio	7.25	86.00	623.50
202302	Seebacher Andreas	3.50	86.00	301.00
Stundenleistung	D154 Ingenieur (D)	24.50		2'107.00
202302	Hegi Yannick	2.50	6.00	15.00
Stundenleistung	H Lehrling (3. + 4. LJ)	2.50		15.00
Total eigene Leistungen				2'722.50

Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer: INGE EP RF-BB
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau und BSA
Projektnummer: 90069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2023
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Feb

Projektleiter Bauherr: Nicole Schulz
Vertragsdatum: 22.10.2018
Vertragslaufzeit: 01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:
Inventarobjekt:
Phasen, beauftragt: EK/GP - AP/MK
Phasen, rapportiert: AP Bypass

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem., Tabelle rechts)

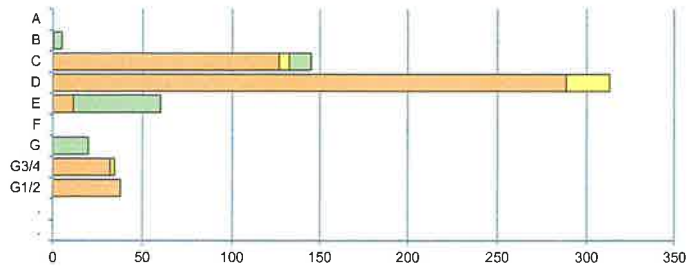

Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B	5.00		0.25	4.75		5%
C	145.00	126.5	6	12.5		91%
D	310.00	288.5	24.5		3	101%
E	60.00	11.5		48.5		19%
F						
G	20.00			20		
G3/4		32	2.5		34.5	
G1/2		37.75			37.75	
Σ	540	496.25	33.25	85.75	75.25	98%

quantitative Selbstanschätzung seitens Auftragnehmer

Selbstanschätzung 91%

rechnerische Auswertungen (exkl. MwSt.)

Kostendach CHF 44'925
Kosten ist CHF 40'607
Kostenausschöpfung 90.39%
Stundenausschöpfung 98%

Stundenabrechnung																
Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Zusammenfassung		D	2													2
		E	9													9
Mantinger	Michael	B			0.25											0.25
Grieder	Fabio	C	101.5	3.5	6											111
Hunziker	Livia	C	20	1.5												21.5
Abdelmoghni	Ahmed	D	111.75	0.25	13.75											125.75
Deck	Andreas	D	70													70
Dolder	Sivio	D	101	3	7.25											111.25
Seebacher	Andreas	D	0.5		3.5											4
Meier	Vera	E	2.5													2.5
Aston	Tim	G3/4	3.5													3.5
Hegi	Yannick	G3/4	28.5		2.5											31
Schneider	Anika	G1/2	37.75													37.75
Total			488	8.25	33.25											529.5

Kostenabrechnung															
Ansatz (inkl. MwSt. beim Rohst.)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
145.00	A														
122.00	B			31											30.50
95.00	C	11'543	475	570											12'587.50
86.00	D	24'532	280	2'107											26'918.00
62.00	E	713													713.00
50.00	F														
6.00	G														
6.00	G3/4	192		15											207.00
4.00	G1/2	151													151.00
Total Monat		37'130.00	754.50	2'722.50											40'607.00

Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.0		
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069		
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS		
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass		
Mitarbeiter	Mantinger Michael (mim)	Kategorie: B353	Leitender Ingenieur(B)
Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden	
23.02.2023	Zuabeit neuer KV	0.25	
Summe		0.25	

Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass

Mitarbeiter	Grieder Fabio (fg)	Kategorie:	B353	Leitender Ingenieur(B)
-------------	---------------------------	------------	------	------------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
01.02.2023	Vorbereiten Beispiel für Präsentation PFS T/U 16	0.50
02.02.2023	Zusammentragen Informationen für PFS T/U 16	0.75
03.02.2023	Ergänzung Präsentation PFS T/U 16	1.00
09.02.2023	Vorbereiten Präsentation PFS LV inkl. Koreferat Traktandenvorschlag und Rückmeldung an BHU	1.75
24.02.2023	KoSi AP Bypass inkl. Vorbereitung	2.00
Summe		6.00

Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass

Mitarbeiter	Abdelmoghni Ahmed (aha)	Kategorie:	D154	Ingenieur (D)
-------------	--------------------------------	------------	------	---------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
10.02.2023	Bearbeitung Tech. Bericht Bypass Frick gemäss Rückmeldung FU.	3.00
13.02.2023	Vorbereitung Titelblatt-Vorgaben und interne Koordination betreffend Abgabe 13.03.2023. Aktualisierung Inhaltsverzeichnis	1.50
14.02.2023	Ersellung Dossierberschriftungen.	0.50
23.02.2023	Interne Besprechung JS und Bearbeitung Tech. Bericht. Bearbietung KV gemäss neuer Vorlage. Vorgaben Radweg gemäss ASTRa und Kanton Aargau sichten und Korrespondent.	2.75
24.02.2023	Bespechung Langsamverkehr JS Intern. Bearbeitung und Ablage Beilage m1 für Abgabe 13.03	1.25
27.02.2023	Prüfung Radweg Bereich Kreisel West. Prüfung bestehende Breiten und Abmessungen NP gemäss ASTRa RL, VSS, Kanton Aargau. Erstellung erster Entwurf und korrespondent.	4.75
Summe		13.75

Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.0		
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069		
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS		
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass		
Mitarbeiter	Dolder Silvio (sdo)	Kategorie: D154	Ingenieur (D)
Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden	
14.02.2023	Überarbeitung Enteignungsplan und Querprofil gem. Rückmeldung FU	1.25	
20.02.2023	Ändern neue Parzellengrenze im Enteignungsplan, Übertragen der neuen Parzellengrenze in die Querprofile, Kontrolle der Titelblätter der Dokumente für die UMW und Versand der Dokumente an PV Umwelt	3.50	
24.02.2023	Ändern Titelblätter der Dokumente für die Abgabe, Anpassen Pläne mit Verweis auf das MK oder Protokolle	2.50	
Summe		7.25	

Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass

Mitarbeiter	Seebacher Andreas (san)	Kategorie:	D154	Ingenieur (D)
-------------	--------------------------------	------------	------	---------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
23.02.2023	Sitzung intern aktueller Stand und Sitzung Langsamverkehr mit S. Dolder u. A. Abdelmoghni; Langsamverkehr sichten Unterlagen; KV anpassen nach neuen Kontenplan in Absprache mit BHU	1.50
24.02.2023	KV: Bericht (Textbausteine) anpassen gemäss aktuellen Kontenplan; KoSi: Langsamverkehr inkl. vorbereiten und nachbereiten	2.00
Summe		3.50

Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.0		
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069		
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS		
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass		
Mitarbeiter	Hegi Yannick (yh)	Kategorie: H	Lehrling (3. + 4. LJ)
Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden	
15.02.2023	Beginn mit Pläne abgabefertig machen sowie Korrekturen von S.Dolder in Landerwerbsplan einarbeiten	1.50	
17.02.2023	Pläne abgabefertig machen (Titelnblätter anpassen)	1.00	
Summe		2.50	

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH11 0076 9401 1371 0200 1
JAUSLIN STEBLER AG
Gartenstrasse 15
4132 Muttenz

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF

Annahmestelle

Zahlteil



Konto / Zahlbar an
CH11 0076 9401 1371 0200 1
JAUSLIN STEBLER AG
Gartenstrasse 15
4132 Muttenz

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF
