




Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt: **N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
Vertragnehmer: **INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG**
Vertrag Nr.: **000003**
Vertragsgegenstand: **PV Bau/BSA**
Projektnummer: **090069**
Aktuelles Beobachtungsjahr: **2023**
Beobachtungsmonat (Std. NEU): **Januar**

Vertragsdatum: **14.11.2018**
Vertragslaufzeit: **31.12.2022**
Finanzierungskonto: **Unterhalt**
Inventarobjekt: **FUP.2**
Phasen, beauftragt: **AP Installationen**
Phasen, rapportiert: **AP Installationen**

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

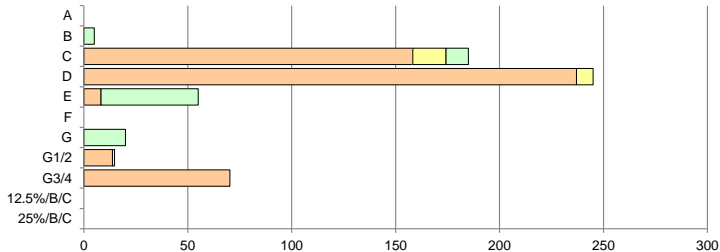

Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B	5			5		
C	185	158.25	16	10.75		94%
D	155	237	8		90	158%
E	55	8.25		46.75		15%
F						
G	20			20		
G1/2		13.75	1		14.75	
G3/4		70.25			70.25	
12.5%/B/C						
25%/B/C						
Σ	420	487.5	25	82.5	512.5	122%

quantitative Selbststeinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung **98%**

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach CHF 35'085.00

Kosten ist CHF 38'616

Kostenausschöpfung **110.06%**

Stundenausschöpfung **122%**

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B														
	Kategorie	C														
	Kategorie	D														
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Jauslin Stebler AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B														
	Kategorie	C	158.25	16												174.25
	Kategorie	D	237	8												245
	Kategorie	E	8.25													8.25
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2	13.75	1												14.75
Leipert AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B														
	Kategorie	C														
	Kategorie	D														
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Holinger AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B														
	Kategorie	C														
	Kategorie	D														
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
Total			487.5	25												512.5

Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MwSt., inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A														
CHF 122.00	B														
CHF 95.00	C	15'034	1'520												16'554
CHF 86.00	D	20'382	688												21'070
CHF 62.00	E	512													512
CHF 50.00	F														
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2	55	4												59
CHF 6.00	G3/4	422													422
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		36'403.75	2'212.00												CHF 38'615.75

JAUSLIN STEBLER AG
Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.01.23 bis 31.01.23
Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Installationen

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Roth Stefan	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Forlin Sandro	B	0	122	0.00
Hartmann Peter	B	0	122	0.00
Mantinger Michael	B	0	122	0.00
Methner Raphael	B	0	122	0.00
Total	B	0		0.00
Brauchli Stefan	C	0	95	0.00
Grieder Fabio	C	6.25	95	593.75
Hunziker Livia	C	9.75	95	926.25
Stocker Thomas	C	0	95	0.00
Total	C	16		1'520.00
Abdelmoghni Ahmed	D	3	86	258.00
Deck Andreas	D	0	86	0.00
Dolder Silvio	D	5	86	430.00
Rothfuss Fabian	D	0	86	0.00
Haberthür Nicolas	D	0	86	0.00
Seebacher Andreas	D	0	86	0.00
Meyer Moritz	D	0	86	0.00
Nyffenegger Christoph	D	0	86	0.00
Brunner Andreas	D	0	86	0.00
Boeglin Chantal	D	0	86	0.00
Total	D	8		688.00
Müller Jan	E	0	62	0.00
Brüngger Marco	E	0	62	0.00
Ladner Roman	E	0	62	0.00
Russer Elisabeth	E	0	62	0.00
Wortelboer Alexander	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Dogan Esra	F	0	50	0.00
Prescha Deliah	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Strittmatter Katja (Praktikantin)	G	0	8	0.00
Möri Anna	G	0	8	0.00
Total	G	0		0.00
Schneider Anika	G1/2	1	4	4.00
Aston Tim	G3/4	0	6	0.00
Gloor Leoni	G3/4	0	6	0.00
Straub Vanessa	G3/4	0	6	0.00
Schreiber Severin	G3/4	0	6	0.00
Hegi Yannick	G3/4	0	6	0.00
Total	G	1		4.00
Gesamttotal		25		2'212.00

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.01.2023 - 31.01.2023

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung: **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung: **Installationensflächen und Landerwerb**

Mitarbeiter: **Grieder Fabio (fg)** Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
04.01.2023	Sichtung Stellungnahme FU und erste Vorsortierung (Fachmandate oder IG)	0.75
06.01.2023	Abgleich im Projektteam betreffend weiterem Vorgehen und Aufbereitung Stellungnahme FU	0.75
10.01.2023	Koordination mit M. Leipert betreffend Anmerkungen zu m-Dossiers	0.75
17.01.2023	PS BSA inkl. Vor- und Nachbereitung (Anmerkungen Hog zu m-Dossiers); Besprechung mit A. Abdelmoghni betreffend Umsetzungsvorschlägen Anmerkungen Hog	1.50
20.01.2023	Kurzabgleich mit L. Hunziker betreffend Klärung Flächen Biodiversität, Zufahrten Installationsflächen (Eigentümer), weitere Abklärungen mit RDL	1.00
24.01.2023	Kurzabgleich im Projektteam zum Stand der Arbeiten und aufbereiten Tabelle Stellungnahme für PFS T/U	0.50
25.01.2023	Vorbereitung Tabelle Stellungnahme BSA (m-Dossiers) für PFS BSA 03	1.00
Summe		6.25

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.01.2023 - 31.01.2023

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung: **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung: **Installationensflächen und Landerwerb**

Mitarbeiter: **Hunziker Livia (Lgr)** Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
03.01.2023	Div. Abklärungen mit dem Grundbuchamt betreffend ASTRA Parzellen, Grunderwerbstabelle anpassen. Grundbuchauszüge überprüfen ob Dienstbarkeiten betroffen sind, erneute Bestellung der GB Auszüge beim Grundbuchamt	2.50
16.01.2023	Grunderwerbstabelle anpassen mit neuer Adressen ASTRA, inkl. E-Mail an F. Grieder betreffend aktuellem Stand	0.50
17.01.2023	Abklärung betreffend falscher Flächenangabe IF Nr. 18, Telefonat mit B. Morgenthaler betreffend korrekter Eigentumsverhältnissen ASTRA Parzellen	0.75
20.01.2023	Zufahrtswege über Privatareale prüfen, E-Mail an PV Umwelt betreffend Biodiversitätsfläche, Pläne prüfen und Rückmeldung erstellen	3.00
27.01.2023	Pläne und Grunderwerbstabelle anpassen, Stellungnahme Tabellen anpassen, Projektabsprache mit S. Dolder und weiterem Vorgehen	3.00
Summe		9.75

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.01.2023 - 31.01.2023

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung: **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung: **Installationensflächen und Landerwerb**

Mitarbeiter: **Abdelmoghni Ahmed (aha)** Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
06.01.2023	Rückmeldung FU betreffend Beilage m1 & m2. Abgleich mit eingereichten MK & AP IF + LE Pläne / Dokumente	3.00
Summe		3.00

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.01.2023 - 31.01.2023

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung: **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung: **Installationensflächen und Landerwerb**

Mitarbeiter: **Dolder Silvio (sdo)** Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
04.01.2023	Kontrolle der Enteignungspläne 1-11 und Überarbeitung Layout	1.50
06.01.2023	Besprechung der Stellungnahme der FU zu dem AP IF+LE	1.00
09.01.2023	Bearbeitung Punkte 3 und 4 der Stellungnahme zum Vorabzug	0.50
23.01.2023	Anpassungen Grundeigentümer, Layout und Titelblatt vom Rodungsplan gem. Rückmeldung FU	0.75
24.01.2023	Interne Besprechung zum weiteren Vorgehen für die Bearbeitung der Rückmeldung von der FU	0.25
25.01.2023	Anpassen Kapitel 4.4 GB Oeschgen Parzelle 690 und Kapitel 8 Zusatzbewilligungen im Technischen Bericht aus Stellungnahme FU	1.00
Summe		5.00

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.01.2023 - 31.01.2023

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung: **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung: **Installationensflächen und Landerwerb**

Mitarbeiter: **Schneider Anika (sca)** Kategorie: I Lehrling (1. + 2. LJ)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
03.01.2023	Enteignungsplan: Anpassungen an den Enteignungskästchen und neuen Kataster einlesen	1.00
Summe		1.00
