

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Muttenz 1 05.06.2023
Projektleiter Grieder Fabio
Ihre Referenz Christian Fuchs

Unsere Referenz 702288.0
MwSt.-Nr. CHE-459.227.258 MWST

N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069

Rechnung Nr. 70026779

Periode 01.05.2023 - 31.05.2023

Leistungsbeschreibung:
Rechnung 31, AP/MK

Eigene Leistungen 380.00

MWST 7.70 % von 380.00 29.26

Total Gesamtbetrag inkl. MWST 409.26

Alle Beträge in CHF
Zahlbar innert 30 Tage netto
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:
- Einzahlungsschein
- Rapporte

Detailbeleg Auftrag 702288.0_PH 31 PL EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) PL

Eigene Leistungen

Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202305	Grieder Fabio	4.00	95.00	380.00
Stundenleistung	C253 Leitender Ingenieur	4.00		380.00
Total eigene Leistungen				380.00




Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer: INGE EP RF-BB
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau und BSA
Projektnummer: 90069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2023
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Mai

Projektleiter Bauherr: Nicole Schulz
Vertragsdatum: 22.10.2018
Vertragslaufzeit: 01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:
Inventarobjekt:
Phasen, beauftragt: EK/GP - AP/MK
Phasen, rapportiert: AP/MK

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

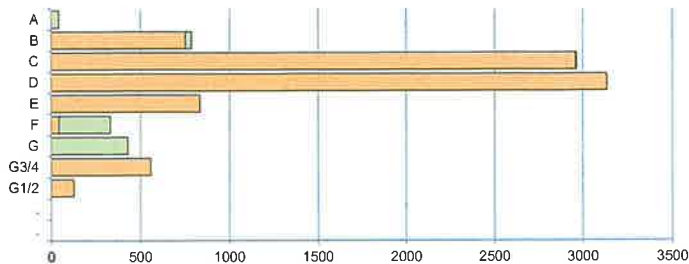

Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	43.75	1		42.75		2%
B	787.5	752.75		34.75		96%
C	1172.5	2961.25	4		1792.75	253%
D	1531.25	3136.25			1605	205%
E	481.25	833			351.75	173%
F	332.5	45.25		287.25		14%
G	428.75			428.75		
G3/4		557			557	
G1/2		128.5			128.5	
-						
-						
Σ	4777.5	6415	4	793.5	4435	176%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung 90%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWST.)

Kostendach CHF 395'386
Kosten ist CHF 701'161
Kostenausschöpfung 177.34%
Stundenausschöpfung 176%

Stundenabrechnung																
Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Zusammenzug Std.			G3/4	518.5												518.5
		G1/2	114													114
		D	201.75													201.75
		E	106													106
Roth	Stefan	A	1													1
Forlin	Sandro	B	522.25	19.5	3.5											545.25
Mantinger	Michael	B	2													2
Methner	Raphael	B	182.5	23												205.5
Brauchli	Stefan	C	1695	84.5	45.5	7										1832
Gneder	Fabio	C	969.25	44	24.75	6	1.5	4								1049.5
Hunziker	Livia	C	32.75													32.75
Stocker	Thomas	C	51													51
Abdelmoghni	Ahmed	D	437.75	7.25	12											457
Boeglin	Chantal	D	1													1
Brunner	Andreas	D	3													3
Challandes	Cesarina	D	7.5													7.5
Deck	Andreas	D	406													406
Dolder	Silvio	D	2.5													2.5
Haberthür	Nicolas	D	228.5		4.5											233
Hasler	Ramona	D		5.75												5.75
Nosdeo	Maya	D	5													5
Nyffenegger	Christoph	D														
Rothfuss	Fabian	D	1057.5	46	49	2.5										1155
Seebacher	Andreas	D	630	8.5	13.25	5										656.75
Tudisco	Romina	D														
Weber	Anita	D			2											
Brüngger	Marco	E	631	1.5	10.75											643.25
Ladner	Roman	E	83.75													83.75
Köchli	Pascal	F	45.25													45.25
Hegi	Yannick	G3/4	20.5		18											38.5
Schneider	Anika	G1/2	14.5													14.5
Total				7969.75	240	183.25	20.5	1.5	4							8419

Kostenabrechnung															
Ansatz (exkl. MwSt. kein Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
145.00	A	145													145.00
122.00	B	86'224	5'185	427											91'835.50
95.00	C	261'050	12'208	6'674	1'235	143	380								281'698.75
86.00	D	256'323	5'805	6'945	645										269'717.50
62.00	E	50'887	93	667											51'646.00
50.00	F	2'263													2'262.50
8.00	G														
6.00	G3/4	3'234		108											3'342.00
4.00	G1/2	514													514.00

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.05.2023 - 31.05.2023

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung: **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH 31 PL
Bezeichnung: **EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) PL**

Mitarbeiter: **Grieder Fabio (fg)** Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
05.05.2023	Organisation aktuelle Tabellen Stellungnahmen MK/AP inkl. Durchsicht	1.50
08.05.2023	Aktualisierung Tabellen Umsetzungsvorschläge MK und zusammenführen mehrerer Tabellen für Abgabe an FU	2.50
Summe		4.00
