

Rechnungsdeckblatt und Kostenmatrix Dienstleistungen

ASTRA Projekt-Nr.	090069	ASTRA Vertrags-Nr.	090069/2000003	ASTRA Beleg-Nr.	
Kurzbezeichnung	EP RHE FRI	Vertragsbeginn	01.07.2018	Vertragsende	31.12.2022
Projektbezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen	Vertragsgegenstand	PV Bau/BSA	Rechnungsdatum	07.04.2022
Teilprojekt / Auftrag	FUP.2	Ansprechperson	Christian Fuchs	Rechnungsnummer	41
Projektleiterin	Nicole Schulz	Telefon	061 365 22 22	Leistungszeitraum von	01.01.2022 bis 31.01.2022
		E-Mail	c.fuchs@aebo.ch	Abrechnungsart	Teilrechnung Nr. 41
				Rechnungsart	Honorar usw.
				Zahlungsfrist (ab korrektem Eingang bei erster Prüfstelle):	45 Tage
ASTRA-Filiale	Bundesamt für Strassen (ASTRA) Filiale Zofingen Brühlstrasse 3 4800 Zofingen	Auftragnehmer	INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG Hochstrasse 48 4002 Basel	Eingangsstempel und -datum:	
		MWST/UID-Nr.	CHE-164.869.840 MWST		
				Stempel Erste Prüfstelle	Stempel ASTRA

RECHNUNGSBETRÄGE - GEGLIEDERT NACH PROJEKTSTRUKTUR TDCOST (KOSTENMATRIX)

Kostenmatrix					Rechnungsbeträge									
Inventarobjekt-Nr.	IO-Bezeichnung	Finanzierungs-konto	Kostenart	Prozentuale-Aufteilung	Leistungen (Brutto)	Nebenkosten (mit Rabatt)	Bruttobetrag	./. Rabatt	Nebenkosten (ohne Rabatt)	Zwischentotal	./. Skonto	Nettobetrag exkl. MWSt	MWSt	Nettobetrag inkl. MWSt
								0.0%			0.0%		7.7%	
19.03.48.311.01	U_Unterhalt	U	1.3100	-	149'928.50	0.00	149'928.50	0.00		149'928.50	0.00	149'928.50	11'544.49	161'472.99
		0	0			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesamttotal					149'928.50	0.00	149'928.50	0.00	0.00	149'928.50	0.00	149'928.50	11'544.49	161'472.99
													Rundungsdifferenz	0.01
													Rechnungsbetrag gerundet	161'473.00
													Netto inkl. MWST ohne Skontoabzug	161'472.99

Bemerkungen:

LAUFWEG RECHNUNGSFREIGABE

Rechnungsfreigabe für den Betrag von: **Fr. 161'473.00**

1	BHU	-
Techdata AG Ohmstrasse 14, 8050 Zürich Prüfperson:	Firma Adresse Prüfperson: Name E-Mail		
Stempel	Stempel		
Datum (Materielle und rechnerische Prüfung)	Unterschrift	Datum (Materielle und rechnerische Prüfung)	Unterschrift

2	ASTRA ICR	3	ASTRA Projektleiter	4	ASTRA Bereichsleiter
Prüfperson:		Prüfperson:	Sni	Prüfperson:	Klt
Datum (Formelle Prüfung)	Visum	Datum (Materielle und rechnerische Prüfung)	Visum	Datum (Genehmigung)	Visum

Beilagen: Rechnung Auftragnehmer mit Einzahlungsschein, Arbeitsrapporte mit Original-Unterschrift der betroffenen Person und ihres Vorgesetzten, Detail-/Drittbelege für Nebenkosten

Rechnungsdeckblatt und Kostenmatrix Dienstleistungen

Kostenübersicht

ASTRA Projekt-Nr.	090069	ASTRA Vertrags-Nr.	090069/2000003	Rechnungsdatum	07.04.2022
Projektbezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen	Auftragnehmer	INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG	Rechnungsnummer	41
			0	Abrechnungsart	Teilrechnung 41

VERTRAGSÜBERSICHT

Vertragstyp	Vertragsdatum	ASTRA Vertrags-Nr.	Datum letzter Nachtrag	Anzahl Nachträge	Vertragssumme		
					Nettobetrag exkl. MWSt	MWSt	Nettobetrag inkl. MWSt
Vertrag	14.11.2018	090069/2000003			3'509'517.75	7.7%	3'779'750.65
Summe aller Nachträge mit MWSt A			23.11.2020	3	413'536.35	7.7%	445'378.65
Summe aller Nachträge mit MWSt B							
Vertrag + Nachtragssumme					3'923'054.10		4'225'129.30

RECHNUNGSÜBERSICHT

Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Abrechnungsart		Leistungszeitraum		ASTRA Rechnungsart	Rechnungssumme		
		Art	Nr.	von	bis		Nettobetrag exkl. MWSt	MWSt	Nettobetrag inkl. MWSt
01 - 02	diverse	Teilrechnung	01-02	01.09.2018	31.12.2018	Honorar usw.	53'622.25	7.7%	57'751.15
03 - 14	23.04.2019	Teilrechnung	03-14	01.01.2019	31.12.2019	Honorar usw.	734'770.25	7.7%	791'347.59
15-17, 19-27	23.03.2020	Teilrechnung	15-17,19-27	01.01.2020	31.12.2020	Honorar usw.	992'946.50	7.7%	1'069'403.34
18	30.04.2020	Teilrechnung	18	01.01.2019	31.12.2019	Teuerung	2'889.40	7.7%	3'111.90
28	26.04.2021	Teilrechnung	28	01.01.2021	31.01.2021	Honorar usw.	90'520.25	7.7%	97'490.30
29	03.05.2021	Teilrechnung	29	01.02.2021	28.02.2021	Honorar usw.	91'222.00	7.7%	98'246.10
30	19.08.2021	Teilrechnung	30	01.03.2021	31.03.2021	Honorar usw.	131'284.00	7.7%	141'392.85
31	26.08.2021	Teilrechnung	31	01.04.2021	30.04.2021	Honorar usw.	130'449.50	7.7%	140'494.10
32	26.08.2021	Teilrechnung	32	01.05.2021	31.05.2021	Honorar usw.	118'420.00	7.7%	127'538.35
33	30.08.2021	Teilrechnung	33	01.06.2021	30.06.2021	Honorar usw.	190'483.75	7.7%	205'151.00
34	02.09.2021	Teilrechnung	34	01.07.2021	31.07.2021	Honorar usw.	208'993.00	7.7%	225'085.45
35	06.09.2021	Teilrechnung	35	01.01.2020	31.12.2020	Teuerung	9'017.05	7.7%	9'711.35
36	09.11.2021	Teilrechnung	36	01.08.2021	31.08.2021	Honorar usw.	87'286.75	7.7%	94'007.85
37	10.11.2021	Teilrechnung	37	01.09.2021	30.09.2021	Honorar usw.	74'581.25	7.7%	80'324.00
38	15.11.2021	Teilrechnung	38	01.10.2021	31.10.2021	Honorar usw.	77'431.75	7.7%	83'394.00
39	17.01.2022	Teilrechnung	39	01.11.2021	30.11.2021	Honorar usw.	105'570.75	7.7%	113'699.70
40	15.02.2022	Teilrechnung	40	01.12.2021	31.12.2021	Honorar usw.	88'878.25	7.7%	95'721.90
41	07.04.2022	Teilrechnung	41	01.01.2022	31.01.2022	Honorar usw.	149'928.50	7.7%	161'473.00
Rechnungssumme ohne Teuerung							3'326'388.75		3'582'520.68
Rechnungssumme mit Teuerung							3'338'295.20		3'595'343.94
Aufteilung der Rechnungen nach Rechnungsart:									
							Anteil HON Honorar usw.		3'582'520.68
							Anteil NK Nebenkosten		0.00
							Anteil TEU Teuerung		12'823.26

REST VERTRAG

	Nettobetrag exkl. MWSt	Nettobetrag inkl. MWSt
Vertrag + Nachtragssumme	3'923'054.10	4'225'129.30
Rechnungssumme ohne Teuerung	3'326'388.75	3'582'520.68
Rest Vertrag	596'665.35	642'608.62
Ausschöpfung Vertrag in %	84.79%	84.79%

SCHLUSSRECHNUNG

Schlussrechnung	Bringt der Auftragnehmer keinen schriftlichen Vorbehalt an, so erklärt er mit der Einreichung der Schlussrechnung, dass er keine weiteren Rechnungen stellen wird und auf jeden weiteren Vergütungsanspruch für Leistungen verzichtet, die er bis dahin nicht in Rechnung gestellt hat.
Verzicht auf Nachforderung	

Bundesamt für Strassen (ASTRA)
 Filiale Zofingen
 Brühlstr. 3
 4800 Zofingen

CHE-164.869.840 MWST
 Auftrag Nr. 9890 / FCh / MNo

RECHNUNG Nr. 41

Basel, 7. April 2022

N3 EP Rheinfelden - Frick**EP RHE FRI, 090069, FUP_EP Rheinfelden, N. Schulz****Vertragsnummer: 090069/000003 vom 14.11.2018**

	CHF	CHF
Erbrachte Leistungen vom Januar 2022 gemäss beiliegenden Arbeitsrapporten		
<u>Massnahmenkonzept</u>		
Aegerter & Bosshardt AG	31'219.50	
Jauslin Stebler AG	18'110.00	
Leipert AG	0.00	
Holinger AG	0.00	
	49'329.50	
<u>Projektleitung</u>		
Aegerter & Bosshardt AG	1'891.00	
	1'891.00	
<u>AP SABA</u>		
Aegerter & Bosshardt AG	43'272.25	
Jauslin Stebler AG	3'051.25	
Leipert AG	8'497.00	
Holinger AG	11'437.50	
	66'258.00	
<u>AP Bypass</u>		
Jauslin Stebler AG	5'562.00	
	5'562.00	
<u>AP Installationen</u>		
Jauslin Stebler AG	7'247.25	
	7'247.25	
<u>GHGW</u>		
Aegerter & Bosshardt AG	1'526.50	
Jauslin Stebler AG	11'817.25	
Leipert AG	6'297.00	
	19'640.75	149'928.50
<u>Nebenkosten</u>	0.00	
	0.00	
	149'928.50	149'928.50
MwSt.	7.7%	11'544.50
Rechnungstotal		<u>161'473.00</u>
Bitte überweisen Sie den Betrag innert 45 Tagen auf unser Konto bei der Basler Kantonalbank, Basel, IBAN CH50 0077 0254 2872 1200 1 Besten Dank.		


Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt: **N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
Vertragnehmer: **INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG**
Vertrag Nr.: **000003**
Vertragsgegenstand: **PV Bau/BSA**
Projektnummer: **090069**
Aktuelles Beobachtungsjahr: **2022**
Beobachtungsmonat (Std. NEU): **Januar**


Vertragsdatum: **14.11.2018**
Vertragslaufzeit: **31.12.2022**
Finanzierungskonto: **Unterhalt**
Inventarobjekt: **FUP.2**
Phasen, beauftragt: **MK, Phase 31**
Phasen, rapportiert: **MK, Phase 31**

Aktuelle Stundenausschöpfung

(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

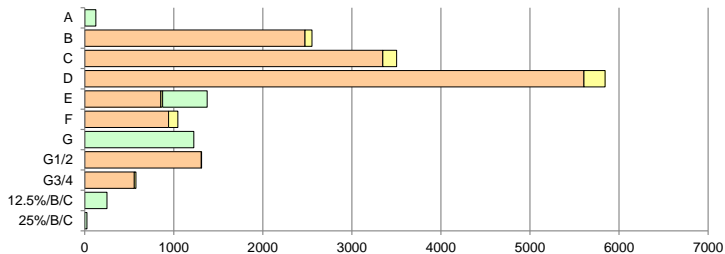

Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	125	1		124		1%
B	2250	2473.5	78.25		301.75	113%
C	3350	3347.25	155		152.25	105%
D	4375	5605.75	237.25		1468	134%
E	1375	855.25	19.5	500.25		64%
F	950	941.5	104.25		95.75	110%
G	1225			1225		
G1/2		1309	3.25		1312.25	
G3/4		556.75	18.5		575.25	
12.5%/B/C	250			250		
25%/B/C	25			25		
Σ	13925	15090	616	2124.25	15706	113%

quantitative Selbstschätzung seitens Auftragnehmer

Selbstschätzung 98%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach CHF 1'133'743.75

Kosten ist CHF 1'261'893

Kostenausschöpfung 111.30%

Stundenausschöpfung 113%

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG																
	Kategorie	A														
	Kategorie	B	1469.5	51.25												1520.75
	Kategorie	C	899.25	52												951.25
	Kategorie	D	2578	194.25												2772.25
	Kategorie	E	83.25													83.25
	Kategorie	F	896.25	104.25												1000.5
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2	1144.75													1144.75
	Kategorie	G3/4	109.25													109.25
Jauslin Stebler AG																
	Kategorie	A	1													1
	Kategorie	B	647.5	27												674.5
	Kategorie	C	2410.25	103												2513.25
	Kategorie	D	2781.25	43												2824.25
	Kategorie	E	769.75	19.5												789.25
	Kategorie	F	45.25													45.25
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2	116.5	3.25												119.75
	Kategorie	G3/4	447.5	18.5												466
Leipert AG																
	Kategorie	B	278													278
	Kategorie	C	7													7
	Kategorie	D	192													192
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
Holinger AG																
	Kategorie	B	78.5													78.5
	Kategorie	C	30.75													30.75
	Kategorie	D	54.5													54.5
	Kategorie	E	2.25													2.25
	Kategorie	F														
	Kategorie	G1/2	47.75													47.75
Total																
			15090	616												15706

Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MwSt., inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A	145													145
CHF 122.00	B	301767	9547												311'314
CHF 95.00	C	317989	14725												332'714
CHF 86.00	D	482095	20'404												502'498
CHF 62.00	E	53026	1'209												54'235
CHF 50.00	F	47075	5'213												52'288
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2	5'236	13												5'249
CHF 6.00	G3/4	3'341	111												3'452
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		1'210'672.25	51'220.50												CHF 1'261'892.75

Aegerter & Bosshardt AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.01.2022 bis 31.01.2022

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Massnahmenkonzept

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
--	A	0	145	0.00
--	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Beck Peter	B	0	122	0.00
Falzone Lorenzo	B	0	122	0.00
Häner David	B	0	122	0.00
Fuchs Christian	B	0	122	0.00
Niedermeyer Friederike	B	0	122	0.00
Ruff Ute	B	18.5	122	2'257.00
Schädler Beat	B	0	122	0.00
Spieler Daniel	B	17.25	122	2'104.50
Weber Madeleine	B	0	122	0.00
Total	B	35.75		4'361.50
Brem Jakob	C	0	95	0.00
Chroust Steffi	C	0	95	0.00
Martin Dirk	C	45.25	95	4'298.75
Mendoza Maria	C	6.75	95	641.25
Yelman Mahir	C	0	95	0.00
Wieland Manuel	C	0	95	0.00
Total	C	52		4'940.00
Hardmeyer Christian	D	25.75	86	2'214.50
Delmas Marc	D	0	86	0.00
Beuret Agnès	D	0	86	0.00
Chrysopoulos Viktorria	D	0	86	0.00
Fischer Michel	D	0	86	0.00
Lüthi Tobias	D	4.5	86	387.00
Suter Sarah	D	0	86	0.00
Meier Lukas	D	0	86	0.00
Meister Christine	D	0	86	0.00
Moser Tobias	D	0	86	0.00
Meyer Ramona	D	115.25	86	9'911.50
Nicolosi Lucia	D	48	86	4'128.00
Schaub Anja	D	0	86	0.00
Schneider Martin	D	0	86	0.00
Nef Regula	D	0.75	86	64.50
Weider Noëlle	D	0	86	0.00
Total	D	194.25		16'705.50
Schär Cédric	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Boser Florian	F	0	50	0.00
Boschung Jan	F	104.25	50	5'212.50
Christ Florian	F	0	50	0.00
Karabasoglu Emre	F	0	50	0.00
Schär Raphaël	F	0	50	0.00
Schmidlin Julian	F	0	50	0.00
Total	F	104.25		5'212.50
Bätscher Basil	G 1/2	0	4	0.00
Wagner Mika	G 1/2	0	4	0.00
Honegger Mark	G 1/2	0	4	0.00
Zimmermann Alec	G 1/2	0	4	0.00
Total	G 1/2	0		0.00
Krenger Kyara	G 3/4	0	6	0.00
Weber Fabian	G 3/4	0	6	0.00
Davet Kilian	G 3/4	0	6	0.00
Manz Selena	G 3/4	0	6	0.00
Total	G 3/4	0		0.00
Gesamttotal		386.25		31'219.50

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 12.01.2022 bis 12.01.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	310	MK, FB T-U	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Regula Nef

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
310	12.01.2022	Unterstützung PL, Bericht MK prüfen und Bezeichnungen korrigieren	0.75
Subtotal			0.75

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

C.F.

Datum:

Datum:


05.04.2022

Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt: **N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
Vertragnehmer: **INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG**
Vertrag Nr.: **000003**
Vertragsgegenstand: **PV Bau/BSA**
Projektnummer: **090069**
Aktuelles Beobachtungsjahr: **2022**
Beobachtungsmonat (Std. NEU): **Januar**

Vertragsdatum: **14.11.2018**
Vertragslaufzeit: **31.12.2022**
Finanzierungskonto: **Unterhalt**
Inventarobjekt: **FUP.2**
Phasen, beauftragt: **Option SABA**
Phasen, rapportiert: **Option SABA**

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

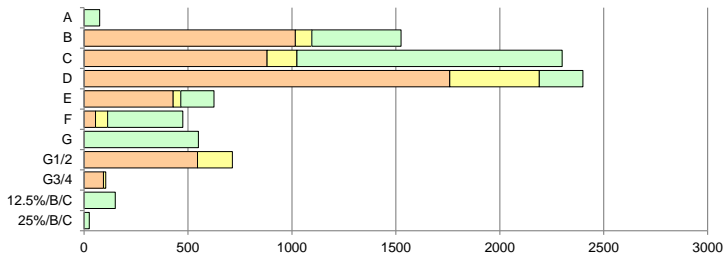

Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	75			75		
B	1525	1016.5	79.25	429.25		72%
C	2300	880.5	143.5	1276		45%
D	2400	1759.5	430.75	209.75		91%
E	625	428.75	36.5	159.75		74%
F	475	55	58.25	361.75		24%
G	550			550		
G1/2		545.75	167.75		713.5	
G3/4		93.25	11		104.25	
12.5%/B/C	150			150		
25%/B/C	25			25		
Σ	8125	4779.25	927	3236.5	5706.25	70%

quantitative Selbstschätzung seitens Auftragnehmer
Selbstschätzung **70%**

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)	
Kostendach	CHF 691'437.50
Kosten ist	CHF 457'311
Kostenausschöpfung	66.14%
Stundenausschöpfung	70%

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B	657.5	13.75												671.25
	Kategorie	C	823.5	125.25												948.75
	Kategorie	D	1231.75	303.75												1535.5
	Kategorie	E	39.25													39.25
	Kategorie	F	55	58.25												113.25
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2	514	154.75												668.75
Jauslin Stebler AG	Kategorie	G3/4	93.25	7												100.25
	Kategorie	A														
	Kategorie	B														
	Kategorie	C	34.25	15.25												49.5
	Kategorie	D	21.25	17.75												39
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
Leipert AG	Kategorie	G1/2	7	13												20
	Kategorie	G3/4		4												4
	Kategorie	B	100	48.5												148.5
	Kategorie	C	8.5													8.5
	Kategorie	D		30												30
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
Holinger AG	Kategorie	G1/2	24.75													24.75
	Kategorie	B	259	17												276
	Kategorie	C	14.25	3												17.25
	Kategorie	D	506.5	79.25												585.75
	Kategorie	E	389.5	36.5												426
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2	24.75													24.75
Total			4779.25	927												5706.25

Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MwSt., inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A														
CHF 122.00	B	124'013	9'669												133'682
CHF 95.00	C	83'648	13'633												97'280
CHF 86.00	D	151'317	37'045												188'362
CHF 62.00	E	26'583	2'263												28'846
CHF 50.00	F	2'750	2'913												5'663
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2	2'183	671												2'854
CHF 6.00	G3/4	560	66												626
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		391'052.50	66'258.00												CHF 457'310.50

Aegerter & Bosshardt AG
Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.01.2022 bis 31.01.2022
Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP SABA

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
--	A	0	145	0.00
--	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Beck Peter	B	0	122	0.00
Falzone Lorenzo	B	0	122	0.00
Fuchs Christian	B	0	122	0.00
Niedermeyer Friederike	B	0	122	0.00
Ruff Ute	B	0	122	0.00
Schädler Beat	B	0	122	0.00
Spieler Daniel	B	13.75	122	1'677.50
Total	B	13.75		1'677.50
Kern Etienne	C	1	95	95.00
Martin Dirk	C	65.75	95	6'246.25
Mendoza Maria	C	58.5	95	5'557.50
Total	C	125.25		11'898.75
Enderlen Francis	D	0	86	0.00
Di Maria Marcello	D	0	86	0.00
Hardmeyer Christian	D	57.5	86	4'945.00
Iten Vanessa	D	151.25	86	13'007.50
Meyer Ramona	D	59.5	86	5'117.00
Nicolosi Lucia	D	0	86	0.00
Schaub Anja	D	35.5	86	3'053.00
Total	D	303.75		26'122.50
Schär Cedric	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Boschung Jan	F	2.25	50	112.50
Christ Florian Michael	F	56	50	2'800.00
Total	F	58.25		2'912.50
Bätscher Basil	G 1/2	0	4	0.00
Rizzo Arianna	G 1/2	47	4	188.00
Streff Timon	G 1/2	107.75	4	431.00
Zimmermann Alec	G 1/2	0	4	0.00
Total	G 1/2	154.75		619.00
Wagner Mika	G 3/4	7	6	42.00
Total	G 3/4	7		42.00
Gesamttotal		662.75		43'272.25

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.01.2022 bis 31.01.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Anja Schaub

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
420	17.01.2022	Zusammenstellen Terrainkoten und Erstellen Geländelängenprofil, Bearbeitung Entwässerungsdaten für Ableitung SABA Rheinfelden	8.50
420	18.01.2022	Erstellen Längenprofil Ableitung Entwässerung für SABA Rheinfelden (SABA Rheinfelden - N03 - best. Haltung)	6.00
420	24.01.2022	Erstellen Längenprofil Ableitung Entwässerung für SABA Rheinfelden (SABA Rheinfelden - N03 - best. Haltung)	10.00
420	25.01.2022	Erstellen Längenprofil Ableitung Entwässerung für SABA Rheinfelden (SABA Rheinfelden - N03 - best. Haltung)	5.50
420	31.01.2022	Erstellen Längenprofil Ableitung Entwässerung für SABA Rheinfelden (SABA Rheinfelden - N03 - best. Haltung)	5.50
Subtotal			35.50

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

C.F. 11.04.2022
