

INGE EP RF-BB  
c/o Aegerter & Bosshardt AG  
Hochstrasse 48  
4002 Basel

Bundesamt für Strassen ASTRA  
Filiale Zofingen  
Brühlstrasse 3  
4800 Zofingen

Muttenz  
Projektleiter  
Ihre Referenz

16.02.2023  
Grieder Fabio  
Beat Schädler

Unsere Referenz  
MWST - Nr.

702288  
CHE-459.227.258 MWST

**Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**  
**Projektkurzbezeichnung: EP RhFr**  
**Projektnummer: 090069**

**Rechnung 70025424**

Periode 01.01.2023 - 31.01.2023

Eigene Leistungen

23'290.50

MWST 7.70 % von 23'290.50

1'793.37

**Total Gesamtbetrag inkl. MWST**

**25'083.87**

Alle Beträge in CHF  
Zahlbar innert 30 Tage netto  
Basellandschaftliche Kantonalbank  
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:

## Detailbeleg 702288

### Eigene Leistungen

Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202301	Forlin Sandro	19.50	122.00	2'379.00
202301	Methner Raphael	23.00	122.00	2'806.00
Stundenleistung	B353 Leitender Ingenieur(B)	42.50	122.00	5'185.00
202301	Grieder Fabio	44.00	95.00	4'180.00
Stundenleistung	C253 Leitender Ingenieur	44.00	95.00	4'180.00
202301	Brauchli Stefan	84.50	95.00	8'027.50
Stundenleistung	C354 Architekt, Ingenieur (C)	84.50	95.00	8'027.50
202301	Abdelmoghni Ahmed	7.25	86.00	623.50
202301	Hasler Ramona	5.75	86.00	494.50
202301	Rothfuss Fabian	46.00	86.00	3'956.00
202301	Seebacher Andreas	8.50	86.00	731.00
Stundenleistung	D154 Ingenieur (D)	67.50	86.00	5'805.00
202301	Brüngger Marco	1.50	62.00	93.00
Stundenleistung	E356 Zeichner(E)	1.50	62.00	93.00
Total eigene Leistungen				23'290.50

### Eigene Nebenkosten


Datum	Text	Menge	Preis	Total
202301	Farbkopien A3	3.00	2.00	6.00
202301	Farbkopien A4	71.00	1.00	71.00
202301	Kopien A4	53.00	0.20	10.60
Total eigene Nebenkosten				87.60

## Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA  
Vertragnehmer: INGE EP RF-BB  
Vertrag Nr.: 000003  
Vertragsgegenstand: PV Bau und BSA  
Projektnummer: 90069  
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2023  
Beobachtungsmontat (Std. NEU): Jan

Projektleiter Bauherr: Nicole Schulz  
Vertragsdatum: 22.10.2018  
Vertragslaufzeit: 01.07.18-31.01.22  
Finanzierungskonto:  
Inventarobjekt:  
Phasen, beauftragt: EK/GP - AP/MK  
Phasen, rapportiert: AP/MK

Aktuelle Stundenausschöpfung  
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

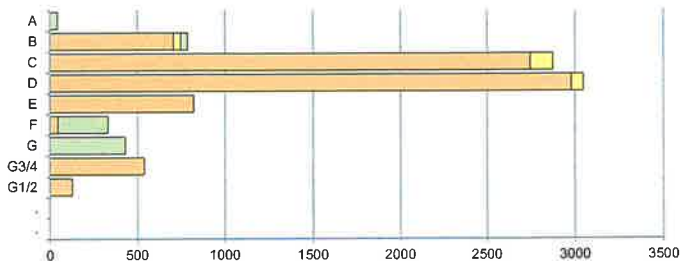

Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	43.75	1		42.75		2%
B	787.5	706.75	42.5	38.25		95%
C	1172.5	2748	128.5		1704	245%
D	1531.25	2980.5	67.5		1516.75	199%
E	481.25	820.75	1.5		341	171%
F	332.5	45.25		287.25		14%
G	428.75			428.75		
G3/4		539			539	
G1/2		128.5			128.5	
Σ	4777.5	7969.75	240	797	4229.25	172%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung 90%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWST.)

Kostendach	CHF 395'386
Kosten ist	CHF 683'939
Kostenausschöpfung	172.98%
Stundenausschöpfung	172%

Stundenabrechnung																
Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Zusammenzug Std.			G3/4	518.5												518.5
			G1/2	114												114
			D	201.75												201.75
			E	106												106
Roth	Stefan	A	1													1
Fortin	Sandro	B	522.25	19.5												541.75
Mantinger	Michael	B	2													2
Methner	Raphael	B	182.5	23												205.5
Brauchli	Stefan	C	1695	84.5												1779.5
Grieder	Fabio	C	969.25	44												1013.25
Hunziker	Livia	C	32.75													32.75
Stocker	Thomas	C	51													51
Abdelmoghni	Ahmed	D	437.75	7.25												445
Boeglin	Chantal	D	1													1
Brunner	Andreas	D	3													3
Challandes	Cesarina	D	7.5													7.5
Deck	Andreas	D	406													406
Dolder	Silvio	D	2.5													2.5
Haberthur	Nicolas	D	228.5													228.5
Hasler	Ramona	D		5.75												5.75
Nosdeo	Maya	D	5													5
Nyffenegger	Christoph	D														
Rothfuss	Fabian	D	1057.5	46												1103.5
Seebacher	Andreas	D	630	8.5												638.5
Tudisco	Romina	D														
Brüngger	Marco	E	831	1.5												832.5
Ladner	Roman	E	83.75													83.75
Köchli	Pascal	F	45.25													45.25
Hegi	Yannick	G3/4	20.5													20.5
Schneider	Anika	G1/2	14.5													14.5
Total				7969.75	240											8209.75

Kostenabrechnung																
Ansatz (exkl. MwSt., kein Rabatt!)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total	
145.00	A	145													145.00	
122.00	B	86'224	5'185												91'408.50	
95.00	C	261'060	12'208												273'267.50	
86.00	D	256'323	5'805												262'128.00	
62.00	E	50'887	93												50'979.50	
50.00	F	2'263													2'262.50	
8.00	G															
6.00	G3/4	3'234													3'234.00	
4.00	G1/2	514													514.00	
Total Monat		660'648.50	23'290.50												683'939.00	

# ARBEITSRAPPORT



**Periode: 01.01.2023 - 31.01.2023**

Projekt-Nr.: 702288.2160  
Bezeichnung **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**  
**ASTRA-Bestellnummer: 1357043803**  
**ASTRA-Projektnummer: MP-090069**  
Auftrag-Nr.: 702288.2160\_PH 31 T-G  
Bezeichnung **EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-G**

Mitarbeiter **Forlin Sandro (SFo)** Kategorie: B353 Leitender Ingenieur(B)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
05.01.2023	Studium und Vorschlag (inkl. interne Besprechung) Umsetzung Stellungnahme FU inkl. diverser Abklärungen betreffen der Setzungsmulde; Interne Besprechung (IG-Sitzung) koordination Überarbeitung MK-Dossier;	5.00
12.01.2023	Ergänzung Umsetzung Stellungnahme FU	1.50
13.01.2023	Projektleitung: Vorbereitung PFS T/G	1.00
19.01.2023	Vorbereitung PFS; Abklärung Höhe Freileitung bei Senkungsmulde	5.00
20.01.2023	PFS T/G 10 inkl. Vor.- und Nachbearbeitung	3.00
25.01.2023	Diverse Rückfragen betreffen Massnahmen Senkungsmulden, verifizierung Protokolle, Anfragen an FU, Besprechung mit FU	4.00
<b>Summe</b>		<b>19.50</b>

**Periode: 01.01.2023 - 31.01.2023**

Projekt-Nr.:	702288.2160
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b> <b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b> <b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.2160_PH 31 K
Bezeichnung	<b>EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) K</b>

Mitarbeiter	<b>Methner Raphael</b> (met)	Kategorie:	B353	Leitender Ingenieur(B)
-------------	------------------------------	------------	------	------------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
13.01.2023	Besprechung Rückmeldung FU Genehmigung KUBA	1.00
26.01.2023	Ergänzung Ermüdungsnachweise N3-315: Eingabe Lastmodell, Überlagerung u. Auswertung Sofistik	8.00
27.01.2023	Ergänzung Ermüdungsnachweise N3-315: Nachweise, kleinere Optimierungen am FE-Modell; Doku PB und Statik	8.00
30.01.2023	Beurteilung Erdbebbensicherheit in Absprache FU für N3-405 u. N3-303	6.00
<b>Summe</b>		<b>23.00</b>

# ARBEITSRAPPORT



**Periode: 01.01.2023 - 31.01.2023**

Projekt-Nr.: 702288.2160  
Bezeichnung: **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**  
**ASTRA-Bestellnummer: 1357043803**  
**ASTRA-Projektnummer: MP-090069**  
Auftrag-Nr.: 702288.2160\_PH 31 T-G  
Bezeichnung: **EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-G**

Mitarbeiter: **Brauchli Stefan (bsn)** Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
05.01.2023	Durchsicht Rückmeldung FU auf MK0.9, Besprechung mit TPL, Abklärungen/Umsetzung	8.00
06.01.2023	Überarbeitung Nutzungsvereinbarung (Reihenfolge der Grundlage gem. Hierarchie ASTRA); Abklärung Entscheide zu nicht bearbeiteten Objekten; Abklärung und Umsetzung zu Abdichtung der Betonplatte Senkungsmulde (PB und Plan)	8.75
09.01.2023	Abklärung zur Schwächung der StM durch Ankerbohrungen (Reserven gem. Statik); Abklärung zu Thematik Logarine oder vorbetonierte Wand an StM N3-450; Diskussion Thematik Ankerersatz mit TPL	9.25
10.01.2023	Absprache mit FM Geologie zur Umsetzung der Stellungnahme FU bezüglich Senkungsmulde, Überarbeitung/Ergänzung Kostenschätzung für Abdichtung Betonplatte Senkungsmulde	7.75
11.01.2023	INGE Sitzung	1.00
11.01.2023	Vorgezogene Versuchsanker (N3-360/450): Abklärung theoretische Möglichkeit abseits Bauwerk, Ergänzung der Kostenschätzung	7.75
12.01.2023	Ergänzungen TB gem Rückmeldung FU auf Vorabzug; Erstellung Traktandenliste zur PFS T/G, Fertigstellen Rückmeldung auf Stellungnahme FU => Versand an BHU	5.75
17.01.2023	Überarbeitung KV auf neue Baukostenarten	1.00
18.01.2023	INGE Sitzung	1.00
19.01.2023	Vorbesprechung und Vorbereitung auf PFS T/G 10/23 vom Freitag	2.00
20.01.2023	PFS T/G 10/23	1.25
20.01.2023	Erstellung Protokoll der PFS T/G	7.25
23.01.2023	Fertigstellen Protokoll PFS T/G zum internen Koreferat, Abfüllen der Abmachungen in Umsetzungstabelle; Ergänzungen gem. Stellungnahme FU in Überprüfungsbericht (Beschreibung / Definition Massnahmenklasse, Ergänzung offene Überprüfungen für Phase MP)	7.75
24.01.2023	Besprechung und Ergänzung Protokoll und Umsetzungstabelle, Zusammenstellung Grundlagen zur Senkungsmulde für Besprechung	2.25

Mitarbeiter **Brauchli Stefan** (bsn) Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
	mit R. Caron	
25.01.2023	INGE-Sitzung	1.25
25.01.2023	Ergänzung Statikbericht zu N3-360 mit durchtrennten Bewehrungsseisen (Versenkte Ankerköpfe für Verstärkung), ergänzende Beschreibung der Ausführbarkeit von Jettingsäulen im Bereich der UEF	7.50
27.01.2023	Fertigstellen, Versand Protokoll der PFS T/G 10/23	1.50
31.01.2023	Zusammenstellung Arbeiten mit Wasser und gewässerkritische Bauprozesse für PV Umwelt	3.50
<b>Summe</b>		<b>84.50</b>

# ARBEITSRAPPORT



**Periode: 01.01.2023 - 31.01.2023**

Projekt-Nr.: 702288.0  
Bezeichnung: **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**  
**ASTRA-Bestellnummer: 1357043803**  
**ASTRA-Projektnummer: MP-090069**  
Auftrag-Nr.: 702288.0\_PH 31 PL  
Bezeichnung: **EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) PL**

Mitarbeiter: **Grieder Fabio (fg)** Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
05.01.2023	IG-Sitzung (Start Überarbeitung Dossier und Planung bis def. Abgabe) inkl. Vorbereitung mit C. Fuchs	2.00
06.01.2023	Rückmeldung an Th. Fuchs betreffend Anfrage zum Nachbarprojekt WTK Möhlin (Verlauf und Lage KRB)	0.50
10.01.2023	Aufgleisen Erstellung Sharepoint für Überarbeitung Dossier T/U und APs inkl. Info Projektteam	2.25
11.01.2023	IG-Sitzung zum Stand Aufbereitung Dossiers und Vorbereitung PFS	1.00
17.01.2023	Info Projektbeteiligte betreffend aktualisierte KV-Vorlage und Umsetzungsvorschlag	0.50
19.01.2023	Koordination betreffend Umsetzung neue KV-Vorlage	1.00
23.01.2023	Veränderungen KV-Vorlage übergeordnete Kosten inkl. Abgleich mit BHU	0.50
24.01.2023	Koordination mit C. Fuchs betreffend aktueller Stand der Arbeiten, vorbereiten IG-Sitzung	1.00
25.01.2023	IG-Besprechung zum Stand der Arbeiten und weiteres Vorgehen; Koordination mit M. Leipert betreffend Einladung PFS BSA 03	1.75
31.01.2023	Abgleich mit Projekt Rhf Ost betreffend Installationsplatz (Dauer, Kosten, Layout) im Hinblick Mini-PS Bau	0.75
<b>Summe</b>		<b>11.25</b>



**Periode: 01.01.2023 - 31.01.2023**

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b> <b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b> <b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 T-U
Bezeichnung	<b>EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U</b>

Mitarbeiter	<b>Grieder Fabio (fg)</b>	Kategorie:	C253	Leitender Ingenieur
-------------	---------------------------	------------	------	---------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
04.01.2023	Sichtung Stellungnahme FU und erste Vorsortierung (Fachmandate oder IG) inkl. Kuzabgleich mit C. Fuchs	1.00
05.01.2023	Abgleich mit PV Akustik, Beginn Formulierung Umsetzungsvorschläge	2.50
06.01.2023	Tabelle Stellungnahme Dossier MK T/U kommentieren und mit Projektteam besprechen	2.00
09.01.2023	IG-interner Abgleich zum weiteren Vorgehen betreffend Bearbeitung Tabelle Stellungnahme FU; Zusammenfassung Punkte Akustik und Info GPL resp. BHU	2.00
10.01.2023	Terminkoordination betreffend Vorbesprechung Teil Lärm inkl. Einladung; Zusammenstellung relevanter Punkte in Stellungnahme FU und Besprechung innerhalb T/U-Team	2.00
11.01.2023	Ergänzung Umsetzungsvorschläge T/U inkl. Akustik, vorbereiten Tabelle für ersten Abgleich mit Abf	2.25
12.01.2023	Tabellen Stellungnahmen aufbereiten für Einladung PFS T/U Akustik inkl. Abgleich mit PV Umwelt betr. SABA	1.50
16.01.2023	Div. Abgleiche betreffend PFS T/U Akustik vom 20.01.23 und PS BSA	1.00
17.01.2023	Durchsicht Umsetzungsvorschläge T/U inkl. Besprechung mit A. Seebacher (IG-Sitzung)	1.50
18.01.2023	Abgleich mit A. Seebacher im Hinblick auf IG-Sitzung (Stand Dossierüberarbeitung und wichtige Punkte); Ergänzung Tabelle Stellungnahme T/U	2.00
20.01.2023	PFS T/U Akustik (Anmerkungen Abf) inkl. Vorbereitung	2.00
23.01.2023	Verfassen Protokoll PFS T/U Akustik 07 inkl. Abgleich im Projektteam	3.50
25.01.2023	Letzte Anpassungen im Protokoll PFS T/U Akustik 07 inkl. Upload und Versand	0.75
26.01.2023	Ergänzung Tabelle Stellungnahme T/U inkl. Abklärung betreffend Verlängerung BeS AS Eiken; Koordination mit C. Fuchs zum Stand AP SABA; Korrespondenz im Projektteam betreffend Belagstyp auf	2.00

Mitarbeiter **Grieder Fabio (fg)** Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
	Brücken	
27.01.2023	Vorbereiten Tabellen Stellungnahmen für PFS T/U; Abgleich mit BHU betreffend Traktanden Einladung und offene Abklärungen	1.50
28.01.2023	Durchsicht kommentierte Stellungnahme T/U und Anfrage betreffend Kommentar SIA 431 an PV Umwelt; Rückmeldung an PV Akustik betreffend Zusammenstellung Belagstyp auf Brücken	2.00
30.01.2023	Endbereinigung Tabelle Stellungnahme FU für Einladung PFS T/U 16	1.25
31.01.2023	Abgleich mit C. Fuchs betreffend offenen Punkten in Tabelle Stellungnahme; Koreferat Stand Präsentation PFS T/U 16; Arbeitsauftrag an IG betreffend Angaben PV Umwelt für Konzept SIA 431	2.00
<b>Summe</b>		<b>32.75</b>

**Periode: 01.01.2023 - 31.01.2023**

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b> <b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b> <b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 T-U
Bezeichnung	<b>EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U</b>

Mitarbeiter      **Abdelmoghni Ahmed (aha)**      Kategorie:    D154    Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
05.01.2023	Sichtung Rückmeldung FU zum Dossier MK ud Bypass Frick	1.50
06.01.2023	Besprechung JS Intern und Bearbeitung Tabelle T/U (bedingte Formatierung, Kommentar)	1.50
10.01.2023	Besprechung Rückmeldung FU JS intern.	1.00
17.01.2023	Besprechung Rückmeldung und Beilage m1 mit F.Grieder.	1.25
24.01.2023	Interne Besprechung Weiteres Vorgehen zu Rückmeldung FU	0.75
26.01.2023	Telefonat mit AXPO AG betreffend Umbauprojekte und Abgleich mit F.Grieder. Korrespondet betreffend Umbauprojekte und Rückmeldung FU.	1.25
<b>Summe</b>		<b>7.25</b>

**Periode: 01.01.2023 - 31.01.2023**

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b> <b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b> <b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 T-U
Bezeichnung	<b>EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U</b>

Mitarbeiter	<b>Hasler Ramona (rha)</b>	Kategorie:	D154	Ingenieur (D)
-------------	----------------------------	------------	------	---------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
05.01.2023	Filterung der Stellungnahmen FU betreffend Lärm für MK, AP SABA, AP IF+LE, AP Bypass Frick	3.00
10.01.2023	Erstellen von Ordner auf Sharepoint und hochladen der aktuellen Stellungnahmen von MK und APs inkl. Kommentaren; Zusammenführen von kommentierten Stellungnahmen des AP SABA; Vorbereiten Powerpointpräsentation Traktandum 5 für PFS T/U 16 vom 07.02.2023; Erstellung PDF von kommentierter Stellungnahme Lärm	2.75
<b>Summe</b>		<b>5.75</b>

**Periode: 01.01.2023 - 31.01.2023**

Projekt-Nr.: 702288.2160  
 Bezeichnung: **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**  
**ASTRA-Bestellnummer: 1357043803**  
**ASTRA-Projektnummer: MP-090069**  
 Auftrag-Nr.: 702288.2160\_PH 31 K  
 Bezeichnung: **EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) K**

Mitarbeiter: **Rothfuss Fabian (rfa)** Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
09.01.2023	Sichtung & Abarbeiten Rückmeldungen FU K, Abklärung Zuständigkeiten und weiteres Vorgehen	6.00
10.01.2023	Einarbeiten Rückmeldungen FU K; Hinterfragen Massnahmenbedarf N3-407, Sichtung PB und StUe Objekte N3-205, N3-301, N3-303, N3-405 und N3-407 zu Beurteilung Anprall an Überberbauten, Abklärungen Ermüdungsnachweise Objekt N3-314 und N3-315, Prüfen Auswirkungen Anmerkungen FU auf PB und StUe von Objekt N3-202 und N3-301	7.50
11.01.2023	Einarbeiten Rückmeldungen FU K: Abklärungen Erdbebenachweise Objekt N3-303, N3-405 und N3-407, interne Besprechung Statiker und INGE-Partner zu weiterem Vorgehen	4.00
16.01.2023	Einarbeiten Rückmeldungen FU, Vorbereitung PFS K: Interne Vorbesprechung / Sitzungsvorbereitung, Vorgehenskonzept Überbauanprall (12 Objekte)	8.00
17.01.2023	Teilnahme PFS K 07/2023	1.50
17.01.2023	Vorbereitung PFS K, Vorbesprechung TPL K bzgl. Ergebnisse Prüfung Überbauanprall, Anpassen Rückmeldung Stellungnahme FU, Erstellen Protokoll PFS K 07/2023	6.50
18.01.2023	Erstellen Protokoll PFS K 07/2023, Einarbeiten Ergebnisse in Rückmeldung Stellungnahme FU	6.00
19.01.2023	Fertigstellen Protokoll PFS K 07/2023, Abklären Pendenzenliste, Versand für Korreferat TPL K	1.50
20.01.2023	Präsesierungen Protokoll PFS K 07/2023 gem. Rückmeldung TPL K, Versand & Ablage Sharepoint	1.50
26.01.2023	INGE Besprechung bzgl. Dokumentenhandling und Zusändigkeiten Einarbeiten Rückmeldungen FU, Abklärungen Stand Thematik lärmindernder Belag auf Brücken aus dem AP Lärm	1.50
30.01.2023	Interne Besprechung Ergebnisse und weiteres Vorgehen konstruktive Erdbebenüberprüfung N3-303 und N3-405	1.50
31.01.2023	Rücksprache TPL K bzgl. weiteres Vorgehen Erdbebenüberprüfungen N3-303 und N3-405	0.50

Mitarbeiter      **Rothfuss Fabian** (rfa)

Kategorie:   D154   Ingenieur (D)

Datum      Leistungsbeschrieb

Stunden

---

**Summe**

46.00

**Periode: 01.01.2023 - 31.01.2023**

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b> <b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b> <b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 T-U
Bezeichnung	<b>EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U</b>

Mitarbeiter	<b>Seebacher Andreas</b> (san)	Kategorie:	D154	Ingenieur (D)
-------------	--------------------------------	------------	------	---------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
09.01.2023	Sichten Stellungnahme MK T-U FU	0.50
10.01.2023	Abgleich mit F. Grieder u. A Abdelmoghni zu Stellungnahme FU inkl. vorbereiten und nachbereiten	1.50
16.01.2023	St. FU: Kommentieren Anmerkungen; Schlitzrinne: Abgleichen Pläne Sit Str. mit Sit EW und QPs, notieren Lage Schlitzrinne	1.75
17.01.2023	Abgleich mit fg zu IG Sitzung Rückmeldung FUs	0.50
18.01.2023	IG Sitzung inkl. vorbereiten und nachbereiten	1.25
19.01.2023	Kurzabgleich mit IG Partner zu EW Lage Schlitzrinne	0.75
24.01.2023	Abgleich mit INGE Partner zu EW Schlitzrinne	0.75
31.01.2023	PPP PFS: Erarbeiten Folien zu Kosten, Zeitfenster und MSÜ; Überprüfen Darstellung Br. Zeinigen in VF Plänen mit Masspl K	1.50
<b>Summe</b>		<b>8.50</b>

# ARBEITSRAPPORT



**Periode: 01.01.2023 - 31.01.2023**

---

Projekt-Nr.:	702288.2160
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b> <b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b> <b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.2160_PH 31 T-G
Bezeichnung	<b>EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-G</b>

Mitarbeiter	<b>Brüngger Marco (mbr)</b>	Kategorie: E356	Zeichner(E)
-------------	-----------------------------	-----------------	-------------

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
19.01.2023	Im Bereich der Senkungsmulde, Höhe der Freileitung über der Autobahn anhand Vermessungsdaten bestimmen, einige Schnitte generieren	1.50
<b>Summe</b>		1.50



Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an  
CH11 0076 9401 1371 0200 1  
JAUSLIN STEBLER AG  
Gartenstrasse 15  
4132 Muttenz

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF

Annahmestelle

Zahlteil



Konto / Zahlbar an  
CH11 0076 9401 1371 0200 1  
JAUSLIN STEBLER AG  
Gartenstrasse 15  
4132 Muttenz

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF
