

INGE EP RF-BB  
c/o Aegerter & Bosshardt AG  
Hochstrasse 48  
4002 Basel

Muttenz 1                      04.09.2023  
Projektleiter                Grieder Fabio  
Ihre Referenz                Christian Fuchs

Unsere Referenz            702288.0  
MwSt.-Nr.                    CHE-459.227.258 MWST

**N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**  
**ASTRA-Bestellnummer: 1357043803**  
**ASTRA-Projektnummer: MP-090069**

**Rechnung Nr. 70028068**

Periode 01.08.2023 - 31.08.2023

Leistungsbeschreibung:  
Rechnung 34 AP/MK

Eigene Leistungen	807.50
MWST 7.70 % von 807.50	<u>62.18</u>
<b>Total Gesamtbetrag inkl. MWST</b>	<b><u>869.68</u></b>

Alle Beträge in CHF  
Zahlbar innert 30 Tage netto  
Basellandschaftliche Kantonalbank  
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:  
- Einzahlungsschein  
- Rapporte

Detailbeleg Auftrag 702288.0\_PH 31 PL EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) PL

**Eigene Leistungen**

Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202308	Grieder Fabio	8.50	95.00	807.50
Stundenleistung	C253 Leitender Ingenieur	8.50		807.50
Total eigene Leistungen				807.50




## Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA  
Vertragnehmer: INGE EP RF-BB  
Vertrag Nr.: 000003  
Vertragsgegenstand: PV Bau und BSA  
Projektnummer: 90069  
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2023  
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Aug

Projektleiter Bauherr: Nicole Schulz  
Vertragsdatum: 22.10.2018  
Vertragslaufzeit: 01.07.18-31.01.22  
Finanzierungskonto:  
Inventarobjekt:  
Phasen, beauftragt: EK/GP - AP/MK  
Phasen, rapportiert: AP/MK

**Aktuelle Stundenausschöpfung**  
(Std, bisher / Std, neu / Std, Rest gem, Tabelle rechts)

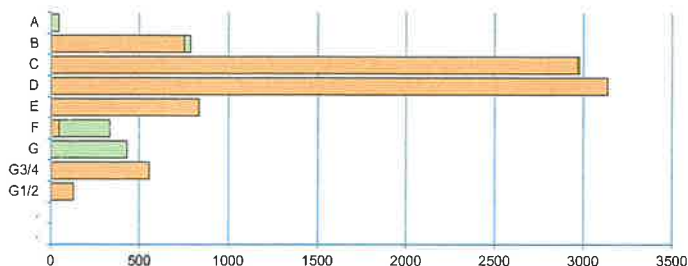

**Gesamtübersicht in %**



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	43.75	1		42.75		2%
B	787.5	752.75		34.75		96%
C	1172.5	2968	8.5		1804	254%
D	1531.25	3136.25			1605	205%
E	481.25	833			351.75	173%
F	332.5	45.25		287.25		14%
G	428.75			428.75		
G3/4		557			557	
G1/2		128.5			128.5	
Σ	4777.5	8421.75	8.5	793.5	4448.25	176%

### quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung 90%

### rechnerische Auswertungen (exkl. MWST.)

Kostendach	CHF 395'386
Kosten ist	CHF 702'230
Kostenausschöpfung	177.61%
Stundenausschöpfung	176%

### Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Zusammenzug Std.		G3/4	518.5													518.5
		G1/2	114													114
		D	201.75													201.75
		E	106													106
Roth	Stefan	A	1													1
Forlin	Sandro	B	522.25	19.5	3.5											545.25
Mantinger	Michael	B	2													2
Methner	Raphael	B	182.5	23												205.5
Brauchi	Stefan	C	1695	84.5	45.5	7										1832
Grieder	Fabio	C	969.25	44	24.75	6	1.5	4	1.25	1.5	8.5					1060.75
Hunziker	Livia	C	32.75													32.75
Stocker	Thomas	C	51													51
Abdelmoghni	Ahmed	D	437.75	7.25	12											457
Boeglin	Chantal	D	1													1
Brunner	Andreas	D	3													3
Challandes	Cesarina	D	7.5													7.5
Deck	Andreas	D	406													406
Dolder	Silvio	D	2.5													2.5
Haberthür	Nicolas	D	228.5		4.5											233
Hasler	Ramona	D		5.75												5.75
Nosdeo	Maya	D	5													5
Nyffenegger	Christoph	D														
Rothfuss	Fabian	D	1057.5	46	49	2.5										1155
Seebacher	Andreas	D	630	8.5	13.25	5										656.75
Tudisco	Romina	D														
Weber	Anita	D			2											
Brüngger	Marco	E	631	1.5	10.75											643.25
Ladner	Roman	E	83.75													83.75
Köchli	Pascal	F	45.25													45.25
Hegi	Yannick	G3/4	20.5		18											38.5
Schneider	Anika	G1/2	14.5													14.5
Total			7969.75	240	183.25	20.5	1.5	4	1.25	1.5	8.5					8430.25

### Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MWST. kein Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
145.00	A	145													145.00
122.00	B	86'224	5'185	427											91'835.50
95.00	C	261'060	12'208	6'674	1'235	143	380	119	143	808					282'767.50
86.00	D	256'323	5'805	6'945	645										269'717.50
62.00	E	50'887	93	667											51'646.00
50.00	F	2'263													2'262.50
8.00	G														
6.00	G3/4	3'234		108											3'342.00
4.00	G1/2	514													514.00
Total Monat		660'648.50	23'290.50	14'819.75	1'880.00	142.50	380.00	118.75	142.50	807.50					702'230.00

# ARBEITSRAPPORT



**Periode: 01.08.2023 - 31.08.2023**

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b> <b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b> <b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 PL
Bezeichnung	<b>EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) PL</b>

Mitarbeiter	<b>Grieder Fabio</b> (fg)	Kategorie:	C253	Leitender Ingenieur
-------------	---------------------------	------------	------	---------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
28.08.2023	Faktenblatt Realisierung ohne AP Lärm und Bypass Frick	3.25
29.08.2023	Faktenblatt Realisierung ohne AP Lärm und Bypass Frick inkl. Kurzabgleich mit P. Hartmann und BHU (Thema Lärm)	2.00
31.08.2023	Erstellung Terminprogramm sequenzielle Abfolge UH-Abschnitte und Ergänzung Kapitel im Faktenblatt; Kurzabgleich mit Ch. Fuchs	3.25

**Summe**

8.50

Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an  
CH11 0076 9401 1371 0200 1  
JAUSLIN STEBLER AG  
Gartenstrasse 15  
4132 MuttENZ

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF

Annahmestelle

Zahlteil



Konto / Zahlbar an  
CH11 0076 9401 1371 0200 1  
JAUSLIN STEBLER AG  
Gartenstrasse 15  
4132 MuttENZ

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF
