




### Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt:	N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen	Vertragsdatum:	14.11.2018
Vertragnehmer:	INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG	Vertragslaufzeit:	31.12.2022
Vertrag Nr.:	000003	Finanzierungskonto:	Unterhalt
Vertragsgegenstand:	PV Bau/BSA	Inventarobjekt:	FUP.2
Projektnummer:	090069	Phasen, beauftragt:	MK, Phase 31
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2023	Phasen, rapportiert:	MK, Phase 31
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Februar		

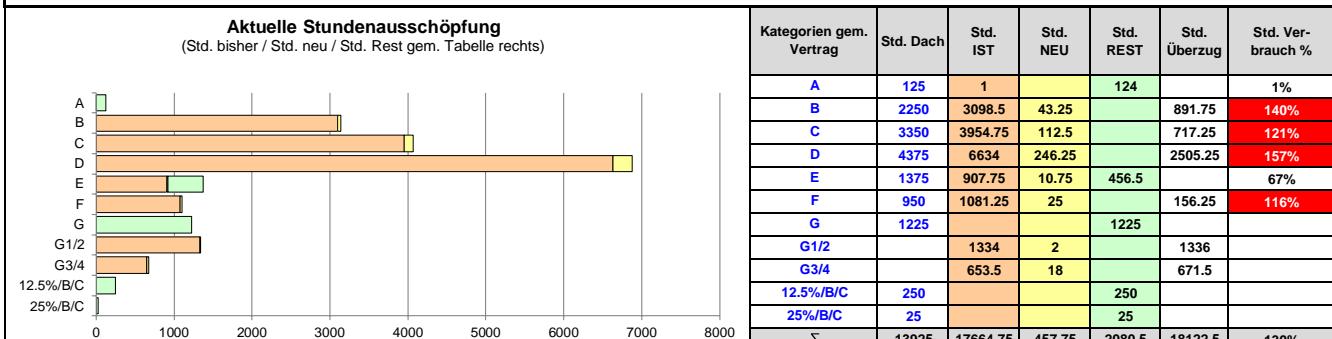

Stundenabrechnung																
Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG		Kategorie														
		A														
		B	1937.25	55.5	39.75										2032.5	
		C	1041.75	22	42.25										1106	
		D	3265	73.5	165.5										3504	
		E	83.25												83.25	
		F	1036		25										1061	
		G														
		G1/2	1157.75		2										1159.75	
		G3/4	114.5												114.5	
Jauslin Stebler AG		Kategorie														
		A	1												1	
		B	706.75	42.5	3.5										752.75	
		C	2724.75	128.5	70.25										2923.5	
		D	2981.5	67.5	80.75										3129.75	
		E	820.75	1.5	10.75										833	
		F	45.25												45.25	
		G														
		G1/2	128.5												128.5	
		G3/4	539		18										557	
Leipert AG		Kategorie														
		B	278												278	
		C	7												7	
		D	192												192	
		E														
		F														
Holinger AG		Kategorie														
		B	78.5												78.5	
		C	30.75												30.75	
		D	54.5												54.5	
		E	2.25												2.25	
		F														
		G1/2	47.75												47.75	
Total			17273.75	391	457.75										18122.5	

Kostenabrechnung															
Ansatz (exkl. MwSt. inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A	145													145
CHF 122.00	B	366'061	11'956	5'277											383'294
CHF 95.00	C	36'1404	14'298	10'688											386'389
CHF 86.00	D	558'398	12'126	21'178											591'702
CHF 62.00	E	56'188	93	667											56'947
CHF 50.00	F	54'063		1'250											55'313
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2	5'336		8											5'344
CHF 6.00	G3/4	3'921		108											4'029
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		1405'514.75	38'472.50	39'174.00											CHF 1'483'161.25

**Aegerter & Bosshardt AG****Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.02.2023 bis 28.02.2023****Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Projektleitung (MK)**

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
--	A	0	145	0.00
--	A	0	145	0.00
	<b>Total</b>	<b>A</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Falzone Lorenzo	B	0	122	0.00
Fuchs Christian	B	33.75	122	4'117.50
Schädler Beat	B	0	122	0.00
Spieler Daniel	B	0	122	0.00
	<b>Total</b>	<b>B</b>	<b>33.75</b>	<b>4'117.50</b>
Fischer Michel	D	0	86	0.00
Nef Regula	D	0	86	0.00
Martin Noëlle	D	0	86	0.00
Wohld Anna	D	59.75	86	5'138.50
	<b>Total</b>	<b>D</b>	<b>59.75</b>	<b>5'138.50</b>
<b>Gesamtotal</b>		<b>93.5</b>		<b>9'256.00</b>

## Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.02.2023 bis 28.02.2023

<b>Mandant Name</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
<b>Projekt</b>	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	<b>Projektleiter</b>	Christian Fuchs
<b>PLA</b>	100	Projektleitung	<b>PLA Leiter</b>	Christian Fuchs
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen	<b>Honorarklasse</b>	9890 EP RF-BB
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc			

<b>Mitarbeiter</b>	<b>Kat.</b>	<b>Stunden</b>	<b>Kostensatz</b>	<b>Verkaufspreis</b>
Fuchs Christian	B	33.75	122.00	4'117.50
Wohld Anna	D	59.75	86.00	5'138.50
<b>Total PLA 100.Projektleitung</b>		<b>93.50</b>	<b>98.99</b>	<b>9'256.00</b>

<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
<b>Projekt</b>	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	<b>Projektleiter</b>	Christian Fuchs
<b>PLA</b>	100	Projektleitung	<b>PLA Leiter</b>	Christian Fuchs
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	<b>Projektleiter Auftraggeber</b>	Nicole Schulz
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Vertragsnummer extern</b>	090069/000003

**Mitarbeiter:** Christian Fuchs

<b>Aktivität</b>	<b>Datum</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Stunde</b>
100	01.02.2023	Internes Rücksprache mit D. Martin wg. neuer RiLi FZRS	0.25
100	02.02.2023	Technische Abklärungen für Dossierbereinigung SABA, ua mit Holinger und intern AeBo	1.50
100	03.02.2023	Terminprüfung und Telefonat mit Leipert; Durchsicht Protokoll PFS BSA; bearbeitung Präsentation für PFS T/U	1.00
100	06.02.2023	Bearbeitung Präsentation PFS T/U, Abklärung mit Hol und Aebo intern	2.00
100	07.02.2023	Sitzungsteilnahme, Vor- und Nachbereitung für PFS T/U	3.00
100	08.02.2023	JourFixe Bereinigung, Mails mit Holinger, Datentransfer und Nachbesprechung; Titelblatt aktualisieren und mit IG Partner prüfen	2.00
100	09.02.2023	Rücksprache mit FGrieder zu Titelblatt, Details FU	0.50
100	10.02.2023	Anpassung formelle Angaben Titelblatt gem Mail BHU, Verteilung IGintern	1.50
100	13.02.2023	Durchsicht und Ergänzung Protokoll PFS T/U; Prüfen Rückmeldungen - T/G zu Bereinigung; - PV U zu SIA 431	1.75
100	14.02.2023	Interne Absprache mit A. Wohld und F. Grieder (Zwischenstand, Rückmeldungen der Partner); Kalkulation Abtrennung Drittflächen und Weitergabe intern zur Ergänzung (1.0)	1.25
100	16.02.2023	Absprache mit AKP (C. Schleiniger) zu Dossierabgabe; Durchsprache offene Punkt TP K, Vorgehen festlegen	0.75
100	17.02.2023	Einarbeiten Hinweise Holinger in Kalkulation Abtrennung Drittflächen; Durchsicht Ergänzungen seitens LE (1.0); Mail Holinger Zu Zaunbedarf; Projektleitung; Prüfen Hinweis F. Grieder/L. Hunziker zu temp. /def. Landerwerb im Abs. Frick, Einbezug Zeichner	2.50
100	20.02.2023	Sitzungsteilnahme, Vor- und Nachbereitung an PFS LV, Abklärungen mit PV Verkehr, Skizzen und Mails hierzu, verfassen des Protokolls im Entwurf. Abgleich IG-intern zu Lieferstand und Vorbereitung Produktion.	6.00
100	21.02.2023	Mails betr. Langsamverkehr, Absprache zu NV, Prüfen Bearbeitungsstand Bereinigung	0.50
100	22.02.2023	Besprechen der einzelnen Dossiers, Pendenden bis Abgabe mit A. Wohld; Mail an IG, Telefonate und Rücksprachen mit TPL (u.a. TP K)	2.50
100	23.02.2023	JourFixe Bereinigung Dossier, Absprachen intern (Dossiererstellung, Offene Punkte, Bearbeitung Berichte, Synthese)	3.50
100	24.02.2023	Teilnahme an KoSi AP Bypass Kreisel AS Frick; Briefing mit A. Wohld vor Ferien; Verteilen div. Pendenden, Telefonat Grieder, Telefonat Oli und Erledigung Kalkulation Abtrennung Drittflächen (Stundenschätzung für Folgephase)	3.25
<b>Subtotal</b>			<b>33.75</b>

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:

19.03.2023

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

19.03.2023

<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
<b>Projekt</b>	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	<b>Projektleiter</b>	Christian Fuchs
<b>PLA</b>	100	Projektleitung	<b>PLA Leiter</b>	Christian Fuchs
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	<b>Projektleiter Auftraggeber</b>	Nicole Schulz
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Vertragsnummer extern</b>	090069/000003

**Mitarbeiter:** Anna Wohld

<b>Aktivität</b>	<b>Datum</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Stunde</b>
100	01.02.2023	Besprechung Stellungnahmen Bereinigung Dossier; Aktualisierung des Zeitplans	2.00
100	02.02.2023	Bereinigung des Zeitplans anhand der Rückmeldungen	0.75
100	03.02.2023	Präsentation für PFS MK T/U: Folien für Synthesedossier vorbereiten	1.50
100	14.02.2023	Besprechung des Detailplans bis zur Abgabe; Studium des Synthesedossiers als Vorbereitung für abschliessende Prüfung;	4.00
100	15.02.2023	Abfrage Arbeitsstand Alternativvorschlag zu GSWZ Neumatt; Bereinigung Synthesedossier Tägliche Absprache mit Projektleiter	3.75
100	16.02.2023	Inhaltliche Abklärungen zu Titelblatt für APs; Anlegen Ordnerstruktur für Version 1.0; AP SABA: Rausfilterung der Fremdverweise	3.50
100	17.02.2023	Ablagestruktur für eingehende abgabefertige Dokumente anlegen; Checkliste mit Inhalten MK und AP erstellen und aktualisieren	4.50
100	20.02.2023	Koordination mit Repro bezüglich Druck; Prüfung AP SABA Dokumente auf Fremdverweise	4.00
100	21.02.2023	Nutzungsvereinbarungen APs und MK auf Version1.0 aktualisieren; Prüfung der eingearbeiteten Stn der FU in NV des AP SABA	8.50
100	22.02.2023	-Besprechung Arbeitsstand und Vorgehen / anstehende Arbeiten; -Koordination der ersten Druckaufträge; -Prüfung Aktualität der NVs; -Koordination Zeichner zwecks Planänderungen	5.50
100	23.02.2023	-Wöchentliche Absprache zu Arbeitsstand Umsetzungsvorschläge und Dossierbereinigung; -Organisation der Aktualisierung der Pläne des Syntheseberichts; -Aktualisierung des Arbeitsstandes der Teilprojekte;	6.00
100	24.02.2023	-Planbeilagen Synthesedossier: Einarbeitung der Stn FU für Übergabe an Zeichner -Redaktionelle / Organisatorische Vorbereitungen für Abgabedossiers: To Dos aufnehmen, Abklärungen mit Repro	7.25
100	28.02.2023	-Koordination Einsatz Zeichner und Vorbereitung Korrek der Pläne - Aktualisierung Grobterminplan auf Version V1.0 - Annahme elektronischer Abgaben der INGE, sowie deren Gegenprüfung und geordnete Ablage	8.50
<b>Subtotal</b>			<b>59.75</b>

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:


<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
<b>Projekt</b>	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	<b>Projektleiter</b>	Christian Fuchs
<b>PLA</b>	100	Projektleitung	<b>PLA Leiter</b>	Christian Fuchs
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	<b>Projektleiter Auftraggeber</b>	Nicole Schulz
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Vertragsnummer extern</b>	090069/000003

<b>Mitarbeiter</b>		<b>Stunden</b>
FCh	Christian Fuchs	33.75
WAn	Anna Wohld	59.75
<b>Aktivität</b>		<b>Stunden</b>
100	Projektleitung	93.50
		<b>Total</b>
		<b>93.50</b>

**Aegerter & Bosshardt AG**

**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.02.2023 bis 28.02.2023**

**Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Massnahmenkonzept**

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
--	A	0	145	0.00
--	A	0	145	0.00
	<b>Total</b>	<b>A</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Beck Peter	B	0	122	0.00
Falzone Lorenzo	B	6	122	732.00
Häner David	B	0	122	0.00
Fuchs Christian	B	0	122	0.00
Niedermeyer Friederike	B	0	122	0.00
Ruff Ute	B	0	122	0.00
Schädler Beat	B	0	122	0.00
Spieler Daniel	B	0	122	0.00
Weber Madeleine	B	0	122	0.00
	<b>Total</b>	<b>B</b>	<b>6</b>	<b>732.00</b>
Brem Jakob	C	0	95	0.00
Chroust Steffi	C	0	95	0.00
Kern Etienne	C	0	95	0.00
Martin Dirk	C	36.75	95	3'491.25
Mendoza Maria	C	5.5	95	522.50
Yelman Mahir	C	0	95	0.00
Wieland Manuel	C	0	95	0.00
	<b>Total</b>	<b>C</b>	<b>42.25</b>	<b>4'013.75</b>
Hardmeyer Christian	D	0	86	0.00
Delmas Marc	D	3	86	258.00
Beuret Agnès	D	0	86	0.00
Chrysopoulos Viktoria	D	31	86	2'666.00
Fischer Michel	D	0	86	0.00
Lüthi Tobias	D	39	86	3'354.00
Meier Lukas	D	19.25	86	1'655.50
Moser Tobias	D	0	86	0.00
Meyer Ramona	D	0	86	0.00
Nicolosi Lucia	D	0	86	0.00
Schaub Anja	D	0	86	0.00
Schneider Martin	D	0	86	0.00
Nef Regula	D	0	86	0.00
Martin (Weider) Noëlle	D	0	86	0.00
Wohld Anna	D	13.5	86	1'161.00
	<b>Total</b>	<b>D</b>	<b>105.75</b>	<b>9'094.50</b>
Schär Cédric	E	0	62	0.00
	<b>Total</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Boser Florian	F	0	50	0.00
Boschung Jan	F	21.25	50	1'062.50
Christ Florian	F	0	50	0.00
Karabasoglu Emre	F	0	50	0.00
Schär Raphaël	F	0	50	0.00
Schmidlin Julian	F	0	50	0.00
Tesan Laila	F	3.75	50	187.50
	<b>Total</b>	<b>F</b>	<b>25</b>	<b>1'250.00</b>
Bajrami Shemsi	G 1/2	2	4	8.00
Bätscher Basil	G 1/2	0	4	0.00
Rizzo Arianna	G 1/2	0	4	0.00
Honegger Mark	G 1/2	0	4	0.00
Zimmermann Alec	G 1/2	0	4	0.00
	<b>Total</b>	<b>G 1/2</b>	<b>2</b>	<b>8.00</b>
Krenger Kyara	G 3/4	0	6	0.00
Wagner Mika	G 3/4	0	6	0.00
Weber Fabian	G 3/4	0	6	0.00
Davet Kilian	G 3/4	0	6	0.00
Manz Selena	G 3/4	0	6	0.00
	<b>Total</b>	<b>G 3/4</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtotal</b>		<b>181</b>		<b>15'098.25</b>

**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.02.2023 bis 28.02.2023**

<b>Mandant Name</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11004	A.B.V.U. Verkehr und Umwelt		
<b>Projekt</b>	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	<b>Projektleiter</b>	Christian Fuchs
<b>PLA</b>	310	MK, FB T-U	<b>PLA Leiter</b>	Christian Fuchs
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen		
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Honorarklasse</b>	9890 EP RF-BB

<b>Mitarbeiter</b>	<b>Kat.</b>	<b>Stunden</b>	<b>Kostensatz</b>	<b>Verkaufspreis</b>
Martin Dirk	C	36.75	95.00	3'491.25
Mendoza Maria del Mar	C	5.50	95.00	522.50
Delmas Marc	D	3.00	86.00	258.00
Wohld Anna	D	13.50	86.00	1'161.00
Boschung Jan	F	6.00	50.00	300.00
Tesan Laila	F	3.75	50.00	187.50
<b>Total PLA 310.MK, FB T-U</b>		<b>68.50</b>	<b>86.43</b>	<b>5'920.25</b>

<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
<b>Projekt</b>	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	<b>Projektleiter</b>	Christian Fuchs
<b>PLA</b>	310	MK, FB T-U	<b>PLA Leiter</b>	Christian Fuchs
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	<b>Projektleiter Auftraggeber</b>	Nicole Schulz
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Vertragsnummer extern</b>	090069/000003

**Mitarbeiter:** Jan Boschung


<b>Aktivität</b>	<b>Datum</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Stunde</b>
310	21.02.2023	Anpassungen Entwässerungskonzept 9890/40-60	2.00
310	22.02.2023	Anpassungen Entwässerungskonzept 9890/40-60	2.00
310	24.02.2023	Anpassungen FZRS 9890/61-82	2.00
<b>Subtotal</b>			<b>6.00</b>

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:


<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
<b>Projekt</b>	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	<b>Projektleiter</b>	Christian Fuchs
<b>PLA</b>	310	MK, FB T-U	<b>PLA Leiter</b>	Christian Fuchs
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	<b>Projektleiter Auftraggeber</b>	Nicole Schulz
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Vertragsnummer extern</b>	090069/000003

**Mitarbeiter:** Marc Delmas

<b>Aktivität</b>	<b>Datum</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Stunde</b>
310	23.02.2023	EP RHE FRI: Anpassungen Titelblätter auf Plänen	3.00
			<b>Subtotal</b> <b>3.00</b>

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

  
 09.03.2023

<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11004	A.B.VU, Verkehr und Umwelt		
<b>Projekt</b>	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	<b>Projektleiter</b>	Christian Fuchs
<b>PLA</b>	310	MK, FB T-U	<b>PLA Leiter</b>	Christian Fuchs
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	<b>Projektleiter Auftraggeber</b>	Nicole Schulz
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Vertragsnummer extern</b>	090069/000003

**Mitarbeiter:** Dirk Martin

<b>Aktivität</b>	<b>Datum</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Stunde</b>
310	01.02.2023	IG-Bespr. zur Bearbeitung der Rückmeldung FU und Präsentation PFS inkl. Vor- und Nachbereitung	2.50
310	02.02.2023	Bearbeiten der Präsentation PFS zur Stn FU	1.00
310	03.02.2023	Bearbeiten der Präsentation PFS zur Stn FU, IG-Bespr./Abstimmung neue RL FZRS, Prüfung und kommentieren der Stn BuP	4.25
310	06.02.2023	Bearbeiten der Präsentation PFS zur Stn FU	1.00
310	07.02.2023	Bearbeiten der Präsentation PFS zur Stn FU, PFS inkl. Nachbereitung, Prüfung und kommentieren der Stn BuP,	5.25
310	08.02.2023	IG-Bespr. zur Bearbeitung der Rückmeldungen an PFS mit PPP FU inkl. Vor- und Nachbereitung	1.50
310	09.02.2023	Prüfung und kommentieren der Stn BuP inkl. Projektierung	1.50
310	10.02.2023	Prüfung und kommentieren der Stn BuP abgeschlossen, Projektierung und Plankorrekturen MK	4.00
310	13.02.2023	Korreferat Prot. PFS T/U vom 07.02.23; Plankontrolle und Projektierung Pläne MK abgeschlossen inkl. Zeichnerinstruktion	2.50
310	17.02.2023	Prüfen Vollständigkeit Landerwerb inkl. Zeichnerinstruktion	1.50
310	20.02.2023	Planprüfung mit Plankorrekturen inkl. Zeichnerinstruktion	1.50
310	21.02.2023	Planprüfung mit Plankorrekturen inkl. Zeichnerinstruktion	3.25
310	23.02.2023	IG-Sitzung inkl. Vor- und Nachbereitung	1.50
310	24.02.2023	Planprüfung mit Plankorrekturen inkl. Zeichnerinstruktion, prüfen IO-Liste	2.00
310	28.02.2023	Bearbeiten Inhaltsverzeichnis, Bearbeiten Technische Berichte, Abgabedossier vorbereiten, Einholen aktuelle IO-Liste	3.50
			<b>Subtotal</b> <b>36.75</b>

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:


<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
<b>Projekt</b>	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	<b>Projektleiter</b>	Christian Fuchs
<b>PLA</b>	310	MK, FB T-U	<b>PLA Leiter</b>	Christian Fuchs
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	<b>Projektleiter Auftraggeber</b>	Nicole Schulz
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Vertragsnummer extern</b>	090069/000003

**Mitarbeiter:** Maria del Mar Mendoza

<b>Aktivität</b>	<b>Datum</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Stunde</b>
310	01.02.2023	IG EP RF BB - Besprechung Stellungnahmen Bereinigung Dossier. Bearbeiten Stellungnahmen FU, korrigieren Planunterlagen gem. Stellungnahme und besprechen mit Zeichner.	2.50
310	02.02.2023	Bearbeiten Stellungnahmen FU, korrigieren Planunterlagen gem. Stellungnahme und besprechen mit Zeichner.	3.00
			<b>Subtotal</b> <b>5.50</b>

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:


  
 09.03.2023

<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
<b>Projekt</b>	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	<b>Projektleiter</b>	Christian Fuchs
<b>PLA</b>	310	MK, FB T-U	<b>PLA Leiter</b>	Christian Fuchs
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	<b>Projektleiter Auftraggeber</b>	Nicole Schulz
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Vertragsnummer extern</b>	090069/000003

**Mitarbeiter:** Laila Tesan

<b>Aktivität</b>	<b>Datum</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Stunde</b>
310	28.02.2023	Anpassung Text auf Plan Nr. 91-93 und 95-97	3.75
			<b>Subtotal</b> <b>3.75</b>

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

C.F.H.  
09.03.2023

<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
<b>Projekt</b>	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	<b>Projektleiter</b>	Christian Fuchs
<b>PLA</b>	310	MK, FB T-U	<b>PLA Leiter</b>	Christian Fuchs
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	<b>Projektleiter Auftraggeber</b>	Nicole Schulz
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Vertragsnummer extern</b>	090069/000003

**Mitarbeiter:** Anna Wohld

<b>Aktivität</b>	<b>Datum</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Stunde</b>
310	03.02.2023	GWSZ Neumatt: Auswertungstabelle für Reparaturarbeiten vervollständigen und mit Daten befüllen; Studium der VSA Norm "Baulicher Unterhalt von Entwässerungsanlagen" für geeignete Bautechniken in GWSZ	4.75
310	06.02.2023	GWSZ Neumatt: Auswertungstabelle für Reparaturarbeiten, Analyse der Schäden auf potenzielle Reparatur/Renovation/Erneuerung	4.00
310	07.02.2023	GWSZ Neumatt: Auswertungstabelle für Reparaturarbeiten, Analyse der Schäden auf potenzielle Reparatur/Renovation/Erneuerung	2.00
310	10.02.2023	GWSZ Neumatt: Auswertungstabelle für Reparaturarbeiten, Analyse der Schäden auf potenzielle Reparatur/Renovation/Erneuerung; Zusammenstellung der Kanal-TV-Dokumentation der betroffenen Haltungen im GWSZ	2.50
310	13.02.2023	GWSZ Neumatt: Übergabe der Auswertung / Zusammenstellung der betroffenen Haltungen	0.25
<b>Subtotal</b>			<b>13.50</b>

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:


  
 09.03.2023

<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
<b>Projekt</b>	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	<b>Projektleiter</b>	Christian Fuchs
<b>PLA</b>	310	MK, FB T-U	<b>PLA Leiter</b>	Christian Fuchs
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	<b>Projektleiter Auftraggeber</b>	Nicole Schulz
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Vertragsnummer extern</b>	090069/000003

<b>Mitarbeiter</b>		<b>Stunden</b>
BoJ	Jan Boschung	6.00
DeM	Marc Delmas	3.00
MD	Dirk Martin	36.75
MeM	Maria del Mar Mendoza	5.50
TL	Laila Tesan	3.75
WAn	Anna Wohld	13.50

<b>Aktivität</b>		<b>Stunden</b>
310	MK, FB T-U	68.50
	<b>Total</b>	<b>68.50</b>

**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.02.2023 bis 28.02.2023**

<b>Mandant Name</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
<b>Projekt</b>	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	<b>Projektleiter</b>	Christian Fuchs
<b>PLA</b>	320	MK, FB K	<b>PLA Leiter</b>	Christian Fuchs
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen		
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Honorarklasse</b>	9890 EP RF-BB

<b>Mitarbeiter</b>	<b>Kat.</b>	<b>Stunden</b>	<b>Kostensatz</b>	<b>Verkaufspreis</b>
Falzone Lorenzo	B	6.00	122.00	732.00
Chrysopoulos Viktoria	D	31.00	86.00	2'666.00
Lüthi Tobias	D	39.00	86.00	3'354.00
Meier Lukas	D	19.25	86.00	1'655.50
Boschung Jan	F	15.25	50.00	762.50
Bajrami Shemsi	G1/2	2.00	4.00	8.00
<b>Total PLA 320.MK, FB K</b>		<b>112.50</b>	<b>81.58</b>	<b>9'178.00</b>

<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
<b>Projekt</b>	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	<b>Projektleiter</b>	Christian Fuchs
<b>PLA</b>	320	MK, FB K	<b>PLA Leiter</b>	Christian Fuchs
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	<b>Projektleiter Auftraggeber</b>	Nicole Schulz
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Vertragsnummer extern</b>	090069/000003

**Mitarbeiter:** Shemsi Bajrami

<b>Aktivität</b>	<b>Datum</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Stunde</b>
320	15.02.2023	Pläne korrigiert 503,516,517,521-526	2.00
			<b>Subtotal</b> <b>2.00</b>

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
<b>Projekt</b>	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	<b>Projektleiter</b>	Christian Fuchs
<b>PLA</b>	320	MK, FB K	<b>PLA Leiter</b>	Christian Fuchs
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	<b>Projektleiter Auftraggeber</b>	Nicole Schulz
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Vertragsnummer extern</b>	090069/000003

**Mitarbeiter:** Jan Boschung

<b>Aktivität</b>	<b>Datum</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Stunde</b>
320	09.02.2023	Anpassungen Massnahmenpläne 9890/501-551	2.50
320	10.02.2023	Anpassungen Massnahmenpläne 9890/501-551	3.00
320	13.02.2023	Anpassungen Massnahmenpläne 9890/501-551	3.25
320	14.02.2023	Anpassungen Massnahmenpläne 9890/501-551 und Schadenspläne 9890/601-626	2.50
320	17.02.2023	Anpassungen Massnahmenpläne 9890/501-551 und Schadenspläne 9890/601-626	4.00
			<b>Subtotal</b> <b>15.25</b>

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:


  
 09.03.2023


<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
<b>Projekt</b>	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	<b>Projektleiter</b>	Christian Fuchs
<b>PLA</b>	320	MK, FB K	<b>PLA Leiter</b>	Christian Fuchs
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	<b>Projektleiter Auftraggeber</b>	Nicole Schulz
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Vertragsnummer extern</b>	090069/000003

**Mitarbeiter:** Viktoria Chrysopoulos

<b>Aktivität</b>	<b>Datum</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Stunde</b>
320	09.02.2023	Bereinigung Dossier K	0.50
320	10.02.2023	Bereinigung Dossier K inkl. Detailabsprache PL	1.50
320	13.02.2023	Bereinigung Dossier K Detailabsprache Pendenzen Projektteam Korrespondenz P. Seiler betr. Massnahmen an FBÜ	3.00
320	14.02.2023	Aktualisierung der Versionen in den Bericht inkl. div. Absprachen und Monitoring der Revisionsprotokolle Bereinigung Dossier K	4.00
320	15.02.2023	Detailabsprache KV sowie Kostenvergleich ProGen Bereinigung Dossier K	3.00
320	16.02.2023	Bereinigung Dossier MK Div. Absprachen INGE und PL	3.75
320	17.02.2023	Bereinigung Schadenpläne, Koordination Z/K Bereinigung TB und NV UEF	4.50
320	20.02.2023	Bereinigte Pläne kontrollieren	0.75
320	21.02.2023	Bereinigung K3.1 Nutzungsvereinbarungen, K3.2 Projektbasen, K8.1 Übersichtspläne, K8.2 Übersichtsskizzen	5.00
320	22.02.2023	Bereinigung K3.2 Projektbasen, Detailabsprache Impressum, Koordination betr. Produktion Papierdossier	2.00
320	23.02.2023	Detailabsprache Projektteam betr. Pendenzen bei der Kostenschätzung und TB	1.50
320	24.02.2023	Detailabsprache mit A. Wohld Schnittstellen Synthesebericht Bereinigung Dossier MK K, TB	1.50
<b>Subtotal</b>			<b>31.00</b>

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:



Datum:

Datum:



<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
<b>Projekt</b>	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	<b>Projektleiter</b>	Christian Fuchs
<b>PLA</b>	320	MK, FB K	<b>PLA Leiter</b>	Christian Fuchs
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	<b>Projektleiter Auftraggeber</b>	Nicole Schulz
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Vertragsnummer extern</b>	090069/000003

**Mitarbeiter:** Lorenzo Falzone


<b>Aktivität</b>	<b>Datum</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Stunde</b>
320	13.02.2023	Bereinigung MK	1.50
320	14.02.2023	Bereinigung MK, Liste Erdbeben K	2.00
320	15.02.2023	Abklärung mit FU bzgl. SDA, Bereinigung MK	1.00
320	17.02.2023	Tabelle Erdbeben K	1.50
			<b>Subtotal</b>
			<b>6.00</b>

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:


  
 09.03.2023

<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
<b>Projekt</b>	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	<b>Projektleiter</b>	Christian Fuchs
<b>PLA</b>	320	MK, FB K	<b>PLA Leiter</b>	Christian Fuchs
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	<b>Projektleiter Auftraggeber</b>	Nicole Schulz
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Vertragsnummer extern</b>	090069/000003

**Mitarbeiter:** Tobias Lüthi

<b>Aktivität</b>	<b>Datum</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Stunde</b>
320	01.02.2023	Bereinigung MK-Dossier gemäss Rückmeldung FU	9.00
320	06.02.2023	Bereinigung Dossier MK Teil K gemäss Rückmeldung FU	4.00
320	07.02.2023	Bereinigung Dossier MK Teil K gemäss Rückmeldung FU	4.00
320	08.02.2023	Bereinigung Dossier MK Teil K gemäss Rückmeldung FU	2.00
320	09.02.2023	Bereinigung Dossier MK Teil K gemäss Rückmeldung FU	3.25
320	13.02.2023	Bereinigung Dossier K gemäss Rückmeldung FU	4.50
320	14.02.2023	Bereinigung Dossier K gemäss Rückmeldung FU	3.75
320	15.02.2023	Bereinigung Dossier K gemäss Rückmeldung FU	5.50
320	16.02.2023	Bereinigung Dossier K gemäss Rückmeldung FU	3.00
<b>Subtotal</b>			<b>39.00</b>

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:

C.FH  
09.03.2023

<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
<b>Projekt</b>	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	<b>Projektleiter</b>	Christian Fuchs
<b>PLA</b>	320	MK, FB K	<b>PLA Leiter</b>	Christian Fuchs
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	<b>Projektleiter Auftraggeber</b>	Nicole Schulz
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Vertragsnummer extern</b>	090069/000003

**Mitarbeiter:** Lukas Meier

<b>Aktivität</b>	<b>Datum</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Stunde</b>
320	02.02.2023	Optimierung PBs, ÜBs auf die Anmerkungen der Dossierrückmeldung statische Themen	1.25
320	03.02.2023	Optimierung PBs, ÜBs auf die Anmerkungen der Dossierrückmeldung statische Themen	3.25
320	13.02.2023	Besprechung Fertigstellung Überprüfungsbericht TB, KV und Rest des Dossiers, Erstellung Zusammenstellung Budgetbetrag Anprall	4.00
320	15.02.2023	Prüfung Erdbebentabelle	1.75
320	16.02.2023	Fertigstellung Überprüfungsbericht UEF und Ausarbeitung Budgetposition Anprall auf Überbauten	1.00
320	17.02.2023	Besprechung zur Budgetposition Anprall auf Überbauten und Einarbeitung in Technischer Bericht	2.00
320	20.02.2023	Fertigstellen Erdbebentabelle	2.25
320	23.02.2023	Fertigstellen Erdbebentabelle, Ergänzungen Synthesebericht, Besprechung Budgetpositionen im KV	3.75
<b>Subtotal</b>			<b>19.25</b>

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:



Datum:

Datum:



<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
<b>Projekt</b>	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	<b>Projektleiter</b>	Christian Fuchs
<b>PLA</b>	320	MK, FB K	<b>PLA Leiter</b>	Christian Fuchs
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	<b>Projektleiter Auftraggeber</b>	Nicole Schulz
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Vertragsnummer extern</b>	090069/000003

<b>Mitarbeiter</b>		<b>Stunden</b>
BaS	Shemsi Bajrami	2.00
BoJ	Jan Boschung	15.25
ChV	Viktoria Chrysopoulos	31.00
FL	Lorenzo Falzone	6.00
LT	Tobias Lüthi	39.00
MeL	Lukas Meier	19.25

<b>Aktivität</b>		<b>Stunden</b>
320	MK, FB K	112.50
		<b>Total</b> 112.50

**JAUSLIN STEBLER AG**

**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.02.23 bis 28.02.23**

**Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Massnahmenkonzept**

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Roth Stefan	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
	<b>Total</b>	<b>A</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Forlin Sandro	B	3.5	122	427.00
Hartmann Peter	B	0	122	0.00
Mantinger Michael	B	0	122	0.00
Methner Raphael	B	0	122	0.00
	<b>Total</b>	<b>B</b>	<b>3.5</b>	<b>427.00</b>
Brauchli Stefan	C	45.5	95	4'322.50
Grieder Fabio	C	24.75	95	2'351.25
Hunziker Livia	C	0	95	0.00
Stocker Thomas	C	0	95	0.00
	<b>Total</b>	<b>C</b>	<b>70.25</b>	<b>6'673.75</b>
Abdelmoghni Ahmed	D	12	86	1'032.00
Deck Andreas	D	0	86	0.00
Dolder Silvio	D	0	86	0.00
Hassler Ramona	D	0	86	0.00
Rothfuss Fabian	D	49	86	4'214.00
Haberthür Nicolas	D	4.5	86	387.00
Seebacher Andreas	D	13.25	86	1'139.50
Meyer Moritz	D	0	86	0.00
Nosdeo Maya	D	0	86	0.00
Nyffenegger Christoph	D	0	86	0.00
Brunner Andreas	D	0	86	0.00
Boeglin Chantal	D	0	86	0.00
Weber Anita	D	2	86	172.00
	<b>Total</b>	<b>D</b>	<b>80.75</b>	<b>6'944.50</b>
Müller Jan	E	0	62	0.00
Brüngger Marco	E	10.75	62	666.50
Ladner Roman	E	0	62	0.00
Russer Elisabeth	E	0	62	0.00
Wortelboer Alexander	E	0	62	0.00
	<b>Total</b>	<b>E</b>	<b>10.75</b>	<b>666.50</b>
Dogan Esra	F	0	50	0.00
Köchli Pascal	F	0	50	0.00
Prescha Deliah	F	0	50	0.00
	<b>Total</b>	<b>F</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Strittmatter Katja (Praktikantin)	G	0	8	0.00
Möri Anna	G	0	8	0.00
	<b>Total</b>	<b>G</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Aston Tim	G3/4	0	6	0.00
Gloor Leoni	G3/4	0	6	0.00
Straub Vanessa	G3/4	0	6	0.00
Schreiber Severin	G3/4	0	6	0.00
Hegi Yannick	G3/4	18	6	108.00
	<b>Total</b>	<b>G</b>	<b>18</b>	<b>108.00</b>
Schneider Anika	G1/2	0	4	0.00
	<b>Total</b>	<b>G</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamttotal</b>		<b>183.25</b>		<b>14'819.75</b>

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.2160
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b> <b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b> <b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.2160_PH 31 T-G
Bezeichnung	<b>EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-G</b>

Mitarbeiter                   **Forlin Sandro (SFo)**                   Kategorie:   B353      Leitender Ingenieur(B)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
06.02.2023	Abklärungen Umsetzung Rückmeldung FU, Errinnerungs E-Mail an Herr Caron	1.00
08.02.2023	Bearbeitung Rückmeldung (R.Caron); Projektadministration; Projektierung Abdichtung Betondecke Senkugsmulde; Projektleitung Anpassungsarbeiten (Angaben an Projektingenieur)	2.50
<b>Summe</b>		<b>3.50</b>

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.: 702288.2160  
Bezeichnung N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen  
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803

Auftrag-Nr.: 702288.2160\_PH 31 T-G  
Bezeichnung EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-G

Mitarbeiter Brauchli Stefan (bsn) Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
01.02.2023	INGE-Sitzung, Bereitstellen Übersichtsplan Objekte T/G für PV Umwelt	0.75
01.02.2023	Ergänzungen im Überprüfungsbericht zu erwartetem zukünftigem Ankerverhalten; Angabe zu Anpassungen im Synthesizedossier und IO-Plan;	7.50
03.02.2023	Überarbeitung Bericht KV auf neues Layout Kostenstellen	3.25
08.02.2023	INGE-Sitzung	1.00
09.02.2023	Senkungsmulde: Bearbeitung Rückmeldung zu Stellungnahme, Ergänzung MA-Abdichtung für Betonplatte (Abklärung Anforderungen (SIA272), Plankorrex, Technischer Bericht etc.)	7.75
13.02.2023	Anpassung Titelblätter, Verteiler, Versions-Nr. für alle Berichte T/G	6.00
14.02.2023	Besprechung Umsetzung der Stellungnahmen FU in den Berichten (Überprüfungsbericht, Nutzungsvereinbarung, Projektbasis), Aktualisierung Umsetzungsliste gem Rückmeldung R. Caron (FaS K)	3.50
15.02.2023	Bearbeitung KV Abdichtung Betonplatte Senkungsmulde	3.25
17.02.2023	Besprechung Umsetzung Abdichtung Senkungsmulde (gem. FaS K) inkl. Kostenermittlung, Fertigstellen Dossier (KV, TB etc.)	2.50
21.02.2023	Ergänzung Temperatur, differentielle Setzungen in PB Senkungsmulde	2.50
22.02.2023	Korrektur Adresse Verfasser im Impressum aller T/G-Berichte	2.00
23.02.2023	INGE-Sitzung; Kontrolle Plananpassung Senkungsmulde; Vorbereiten Abgabe MK	2.50
24.02.2023	Zusammenstellung Gesamt-KV für TP T/G; Veranlassung Erstellung Papierversion	3.00
<b>Summe</b>		45.50

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.: 702288.0

Bezeichnung **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**

**ASTRA-Bestellnummer: 1357043803**

**ASTRA-Projektnummer: MP-090069**

Auftrag-Nr.: 702288.0\_PH 31 PL

Bezeichnung **EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) PL**

Mitarbeiter **Grieder Fabio (fg)** Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
01.02.2023	IG-Sitzung inkl. Nachbereitung; kurze Vorbereitung Mini-PS Bau	2.50
02.02.2023	Mini PS Bau inkl. Nachbereitung	2.00
17.02.2023	Zusammenstellen übergeordnete Kosten (neue Kostenkonten)	1.00
<b>Summe</b>		<b>5.50</b>

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b> <b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b> <b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 T-U
Bezeichnung	<b>EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U</b>

Mitarbeiter	Kategorie:	C253	Leitender Ingenieur
Datum	Leistungsbeschrieb		Stunden
01.02.2023	Vorbereiten Beispiel für Präsentation PFS T/U 16		0.50
02.02.2023	Vorbereiten Präsentation für PFS T/U 16; Abgleich mit W. Schüler betreffend neuer RiLi FZRS und Auswirkungen EP RHE FRI		2.50
06.02.2023	Ergänzung Präsentation PFS T/U 16 und Info Projektteam betreffend Fertigstellungstermin		1.00
07.02.2023	Fertigstellung Präsentation PFS T/U 16; PFS T/U 16 inkl. Nachbereitung		3.50
08.02.2023	Start Protokoll PFS T/U 16; Vorbereiten interner Abgleich zum weiteren Vorgehen		1.00
09.02.2023	Abgleich intern im Projektteam zur Überarbeitung des Dossiers (Infos aus PFS T/U 16)		2.50
10.02.2023	Abfüllen Notizen im Protokoll PFS T/U 16; Upload auf interne Plattform für Vervollständigung durch IG		2.50
13.02.2023	Ergänzung Protokoll PFS T/U 16; Ableich betreffend Titelblätter Dossier		2.00
14.02.2023	Fertigstellen Protokoll PFS T/U 16 inkl. Versand		1.25
16.02.2023	Überarbeitung Dossier T/U; Erstellen Zuständigkeitsmatrix und Info IG; Info Fachmandate betreffend Titelblätter		2.50
<b>Summe</b>			<b>19.25</b>

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b>
	<b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b>
	<b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>

Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 T-U
Bezeichnung	<b>EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U</b>

Mitarbeiter                   **Abdelmoghni Ahmed (aha)**                   Kategorie: D154           Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
09.02.2023	Arbeitssitzung / Koordination und Besprechung Rückmeldungen FU und Abgabe vom 13.03.	2.50
10.02.2023	Ablage und Bearbeitung KV T-U mit neuer Vorlage gemäss Rückmeldung FU. Anpasungen Plan 10.7.6.1 / .2 / .3 vorbereiten und Korrespondent.	3.50
17.02.2023	Besprechung Bearbeitung Pläne für PV Umwelt (10.7.6-01 bis 03)	0.75
21.02.2023	Abgleich und Prüfung Anpassungen MK-Pläne (T/U) Genehmigungsversion	1.25
22.02.2023	Prüfung Abgabepläne Version 1.0.	1.50
24.02.2023	Bereitung KV und Integration Kosten KV-Gesamt in neuer Vorlage - Auszug einzelne KVs und Erstellung KV-Bericht	2.50
<b>Summe</b>		<b>12.00</b>

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.: 702288.2160  
Bezeichnung N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen  
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803  
ASTRA-Projektnummer: MP-090069  
Auftrag-Nr.: 702288.2160\_PH 31 K  
Bezeichnung EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) K

Mitarbeiter Haberthür Nicolas (han) Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
07.02.2023	N3-301: Anpassug Rückmeldung FU	3.00
09.02.2023	N3-202: Anpasungen Bericht Kunstbauten gemäss Rückmeldung FU K.	1.50
<b>Summe</b>		<b>4.50</b>

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.2160
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b>
	<b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b>
	<b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>

Auftrag-Nr.:	702288.2160_PH 31 K
Bezeichnung	<b>EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) K</b>

Mitarbeiter **Rothfuss Fabian (rfa)** Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
01.02.2023	Sichtung Objekte UEF N3-205, N3-407 und N3-405 bzgl. Thematik lärmärmer Belag	1.00
02.02.2023	Interne Besprechung Überarbeitung PB Objekt N3-201 und N3-301	0.50
08.02.2023	Erstellen Übersicht Erdbebensicherheit Kunstbauten über alle Objekte (UEF, BR, UNF): Zusammenstellen detaillierter Angaben über Ausgangslage, bereits ausgeführter Erdbebenüberprüfungen, Überprüfungen im Rahmen des MK und Vorschlag weiteres Vorgehen MP gem. Besprechung PFS K 17.01.2023	7.50
13.02.2023	Einarbeiten Rückmeldungen FU Fachbereich K in ÜB+TP UEF, Erstellen Titelblätter TP K Version 1.0, Besprechung INGE Partner bzgl. Anpassung Belagsersatz mit SDA 8/12	7.00
13.02.2023	Überarbeiten Übersicht Erdbebensicherheit Kunstbauten mit Objekten Bänziger (Objekte Vorgezogene Massnahmen an Kunstbauten )	2.00
14.02.2023	Einarbeiten Rückmeldungen FU Fachbereich K, Bereinigen PB und StUe Objekte N3-202; N3-205, N3-301, N3-313, N3-314	9.50
15.02.2023	Einarbeiten Rückmeldungen FU Fachbereich K, Bereinigen PB und StUe Objekte N3-315, N3-315A, N3-317, N3-322A, N3-403, Angaben Zeichner für Bereinigung Massnahmenpläne N3-405 und N3-407	9.50
16.02.2023	Einarbeiten Rückmeldungen FU Fachbereich K in ÜB+TP DL, Erstellen Titelblätter TP K Version 1.0	4.00
17.02.2023	Einarbeiten Rückmeldungen FU Fachbereich K in NV UEF, Ergänzungen TB UEF, Kontrolle Änderungen Massnahmenpläne N3-405 und N3-407, Abgabe Dokumente an INGE Partner	6.00
22.02.2023	Erneute Anpassung Titelblatt Fachbereich K gem. Angaben PL	2.00

**Summe** 49.00

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.: 702288.0  
Bezeichnung N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen  
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803  
ASTRA-Projektnummer: MP-090069

Auftrag-Nr.: 702288.0\_PH 31 T-U  
Bezeichnung EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U

Mitarbeiter Seebacher Andreas (san) Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
01.02.2023	IG Sitzung: Abgleich zu Stand Dossiers; PPP PFS: Nachführen Präsentation aktuelle Erkenntnisse inkl. nachbearbeiten	1.25
02.02.2023	Schlitzrinne im MS: Abgleich mit Konstrukteur und Kurzabgleich mit fg inkl. Auftrag an Zeichner	0.75
03.02.2023	PPP: Einarbeiten Thematik Schlitzirnne	0.50
06.02.2023	Breit PS: Abgleich mit Y. Hegi und nachführen in PPP	0.50
07.02.2023	Kuerzbagleich mit fg und einarbeitne in PPP	0.50
09.02.2023	Interne Sitzugn Dossierabgabe F. Grieder, A. Abdelmoghni u. S. Dolder	1.00
13.02.2023	UEF Bütti: Verlegung Achse an KUBA rückmelden	0.50
20.02.2023	Angaben Anpassungen Y. Hegi gemäss Stgn FU in Pläne inkl. Auftrag; Titelblätter Anpassen in Dokumente	1.50
21.02.2023	KV: Anpassen an neuen Kontenplan für TRA IO	0.50
22.02.2023	KV: übergeordnete Kosten fertigstellen und Anfrage an BHU	0.75
23.02.2023	INGE Sitzung letzter Stand Abgabe inkl. sichten; IO Liste: Kurzbagleich aktuellen Stand; KV Gesamt: Anfragenn alle Fachebreiche, KV anpassen nach neuen Kontenplan in Absprache mit BHU; BSA: Zustellen Pläne für Abgabe	3.00
24.02.2023	Besprechung intern zu Abgabe MK (KV, Sit Pläne); Abgabe an IG intern; 10.3 TB: Anpassen Kap 80 Lärm gemäss FU	2.50
<b>Summe</b>		13.25

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

---

Projekt-Nr.: 702288.2160  
Bezeichnung N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen  
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803  
ASTRA-Projektnummer: MP-090069  
Auftrag-Nr.: 702288.2160\_PH 31 T-G  
Bezeichnung EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-G

Mitarbeiter **Weber Anita (aw)** Kategorie: D375 Kaufm.-  
/Sekretariatspers.(D)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
28.02.2023	Unterstützung Repro/Erstellung Abgabedossier in Papier	2.00
<b>Summe</b>		<b>2.00</b>

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

---

Projekt-Nr.: 702288.2160  
Bezeichnung N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen  
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803  
ASTRA-Projektnummer: MP-090069  
Auftrag-Nr.: 702288.2160\_PH 31 T-G  
Bezeichnung EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-G

Mitarbeiter Brügger Marco (mbr) Kategorie: E356 Zeichner(E)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
23.02.2023	Massnahmenplan Senkungsmulde, Anpassung Belagsaufbau, Zusätzliche Abdichtung, Freileitung Axpo Lage und Höhe mittels Dreickevermaschung ermitteln, allg. Titelblatt Anpassungen u.s.w.	5.00
24.02.2023	Anpassen aller Titelblätter für definitive Abgabe der Pläne	3.50
<b>Summe</b>		<b>8.50</b>

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.: 702288.2160

Bezeichnung N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen

ASTRA-Bestellnummer: 1357043803

ASTRA-Projektnummer: MP-090069

Auftrag-Nr.: 702288.2160\_PH 31 K

Bezeichnung EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) K

Mitarbeiter Brüngger Marco (mbr) Kategorie: E356 Zeichner(E)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
15.02.2023	Besprechung Änderungen Titelblatt und in 2 Plänen	0.50
17.02.2023	Anpassen Titelblätter und 2 Korrekturen in 2 Plänen, Bei allen Titelblätter das Pixelbild neu einpassen.	1.75
<b>Summe</b>		<b>2.25</b>

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.: 702288.0  
Bezeichnung N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen

ASTRA-Bestellnummer: 1357043803

ASTRA-Projektnummer: MP-090069

Auftrag-Nr.: 702288.0\_PH 31 T-U  
Bezeichnung EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U



Mitarbeiter Hegi Yannick (yh) Kategorie: H Lehrling (3. + 4. LJ)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
03.02.2023	Prüfung von Pannenstreifen grösser als 3.25	6.00
06.02.2023	Prüfung von dem Pannenstreifen grösser als 3.25 fertigstelln	2.50
17.02.2023	Pläne für Abgabe vorbereiten (Titelblätter anpassen und darstellerische Korrekturen einarbeiten)	4.00
20.02.2023	Pläne für Abgabe fertig machen (BSA Pläne und Signalisation und Markierungspläne)	4.00
21.02.2023	Letzte Pläne für Abgabe fertig machen (Signalisationsplan für FB BSA)	1.50
<b>Summe</b>		<b>18.00</b>



## Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt:	N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen	Vertragsdatum:	14.11.2018
Vertragnehmer:	INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG	Vertragslaufzeit:	31.12.2022
Vertrag Nr.:	000003	Finanzierungskonto:	Unterhalt
Vertragsgegenstand:	PV Bau/BSA	Inventarobjekt:	FUP.2
Projektnummer:	090069	Phasen, beauftragt:	Option SABA
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2023	Phasen, rapportiert:	Option SABA
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Februar		

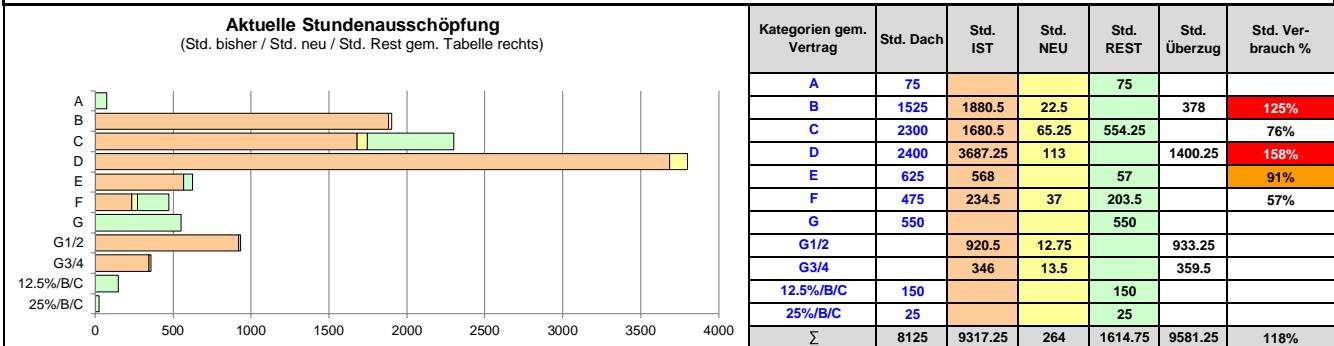

Stundenabrechnung																
Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG		A														
		B	1109													1109
		C	1419.5	49	50											1518.5
		D	2339.75	63.25	71.5											2474.5
		E	39.25													39.25
		F	215.5	19	37											271.5
		G														
		G1/2	841.75		12.75											854.5
		G3/4	342													342
Jauslin Stebler AG		A														
		B														
		C	165.75	16	15.25											197
		D	98.5	2.75												101.25
		E	6.5													6.5
		F														
		G														
		G1/2	46	4.5												50.5
		G3/4	4		13.5											17.5
Leipert AG		B	289	13												302
		C	11.5													11.5
		D	165.5													165.5
		E														
		F														
Holinger AG		B	448.5	21	22.5											492
		C	18.75													18.75
		D	918.5	99	41.5											1059
		E	486.25	36												522.25
		F														
		G1/2	28.25													28.25
Total			8993.75	323.5	264											9581.25

Kostenabrechnung																
Ansatz (exkl. MwSt. inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total	
CHF 145.00	A															
CHF 122.00	B	225'273	4'148	2'745												232'166
CHF 95.00	C	153'473	6'175	6'199												165'846
CHF 86.00	D	302'914	14'190	9'718												326'822
CHF 62.00	E	32'984	2'232													35'216
CHF 50.00	F	10'775	950	1'850												13'575
CHF 8.00	G															
CHF 4.00	G1/2	3'664	18	51												3733
CHF 6.00	G3/4	2'076		81												2'157
CHF 13.56	12.5%/B/C															
CHF 27.13	25%/B/C															
Total		731'158.00	27'713.00	20'643.75												CHF 779'514.75

## Aegerter &amp; Bosshardt AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.02.2023 bis 28.02.2023

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP SABA inkl. SABA Mumpf

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
--	A	0	145	0.00
--	A	0	145	0.00
	<b>Total</b>	<b>A</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Beck Peter	B	0	122	0.00
Falzone Lorenzo	B	0	122	0.00
Fuchs Christian	B	0	122	0.00
Niedermeyer Friederike	B	0	122	0.00
Jung Roman	B	0	122	0.00
Ruff Ute	B	0	122	0.00
Schädler Beat	B	0	122	0.00
Spieler Daniel	B	0	122	0.00
	<b>Total</b>	<b>B</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Kern Etienne	C	0	95	0.00
Martin Dirk	C	21.75	95	2'066.25
Mendoza Maria	C	28.25	95	2'683.75
Nommay Emmanuelle	C	0	95	0.00
	<b>Total</b>	<b>C</b>	<b>50</b>	<b>4'750.00</b>
Enderlen Francis	D	0	86	0.00
Di Maura Miriam	D	0	86	0.00
Di Maria Marcello	D	0	86	0.00
Hardmeyer Christian	D	71.5	86	6'149.00
Iten Vanessa	D	0	86	0.00
Meyer Ramona	D	0	86	0.00
Nicolosi Lucia	D	0	86	0.00
Breiter Michael	D	0	86	0.00
Schaub Anja	D	0	86	0.00
Wira Stephane	D	0	86	0.00
	<b>Total</b>	<b>D</b>	<b>71.5</b>	<b>6'149.00</b>
Schär Cedric	E	0	62	0.00
	<b>Total</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Boschung Jan	F	37	50	1'850.00
Christ Florian Michael	F	0	50	0.00
Redlich Moritz	F	0	50	0.00
	<b>Total</b>	<b>F</b>	<b>37</b>	<b>1'850.00</b>
Bajrami Shemsi	G 1/2	12.75	4	51.00
Bätscher Basil	G 1/2	0	4	0.00
Rizzo Arianna	G 1/2	0	4	0.00
Streiff Timon	G 1/2	0	4	0.00
Zimmermann Alec	G 1/2	0	4	0.00
	<b>Total</b>	<b>G 1/2</b>	<b>12.75</b>	<b>51.00</b>
Wagner Mika	G 3/4	0	6	0.00
	<b>Total</b>	<b>G 3/4</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtotal</b>		<b>171.25</b>		<b>12'800.00</b>

**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.02.2023 bis 28.02.2023**

<b>Mandant Name</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
<b>Projekt</b>	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	<b>Projektleiter</b>	Christian Fuchs
<b>PLA</b>	420	AP SABA	<b>PLA Leiter</b>	Christian Fuchs
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen		
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Honorarklasse</b>	9890 EP RF-BB

<b>Mitarbeiter</b>	<b>Kat.</b>	<b>Stunden</b>	<b>Kostensatz</b>	<b>Verkaufspreis</b>
Martin Dirk	C	21.75	95.00	2'066.25
Mendoza Maria del Mar	C	28.25	95.00	2'683.75
Hardmeyer Christian	D	71.50	86.00	6'149.00
Boschung Jan	F	37.00	50.00	1'850.00
Bajrami Shemsi	G1/2	12.75	4.00	51.00
<b>Total PLA 420.AP SABA</b>		<b>171.25</b>	<b>74.74</b>	<b>12'800.00</b>

<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
<b>Projekt</b>	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	<b>Projektleiter</b>	Christian Fuchs
<b>PLA</b>	420	AP SABA	<b>PLA Leiter</b>	Christian Fuchs
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	<b>Projektleiter Auftraggeber</b>	Nicole Schulz
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Vertragsnummer extern</b>	090069/000003

**Mitarbeiter:** Shemsi Bajrami

<b>Aktivität</b>	<b>Datum</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Stunde</b>
420	01.02.2023	Korrektur von 9890/435, 436,437,438,429,430,431,432,433,434,427	3.25
420	02.02.2023	Pläne bearbeiten 9890/427,424,425,435,433 PDF erstellen	6.75
420	07.02.2023	Korrekturen und PDF erstellen	1.25
420	15.02.2023	Titelblatt & Legende bearbeitet PDF erstellen Plan 421-438	1.50
<b>Subtotal</b>			<b>12.75</b>

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:

C.F.H.  
09.03.2023

<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
<b>Projekt</b>	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	<b>Projektleiter</b>	Christian Fuchs
<b>PLA</b>	420	AP SABA	<b>PLA Leiter</b>	Christian Fuchs
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	<b>Projektleiter Auftraggeber</b>	Nicole Schulz
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Vertragsnummer extern</b>	090069/000003

**Mitarbeiter:** Jan Boschung

<b>Aktivität</b>	<b>Datum</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Stunde</b>
420	02.02.2023	Anpassungen Pumpwerk Plan 9890/421-438	4.25
420	06.02.2023	Anpassungen Pumpwerk Plan 9890/421-438	2.50
420	07.02.2023	Anpassungen Pumpwerk Plan 9890/421-438	5.75
420	08.02.2023	Anpassungen Pumpwerk Plan 9890/421-438	5.00
420	09.02.2023	Anpassungen Pumpwerk Plan 9890/421-438	2.00
420	20.02.2023	Anpassungen Entwässerungspläne 9890/561-581 Übersicht 9890/7-9 und Installation 9890/17-19	4.75
420	21.02.2023	Anpassungen Entwässerungspläne 9890/561-581 Übersicht 9890/7-9 und Installation 9890/17-19	1.25
420	22.02.2023	Anpassungen Entwässerungspläne 9890/561-581 Übersicht 9890/7-9 und Installation 9890/17-19	2.75
420	23.02.2023	Anpassungen Entwässerungspläne 9890/561-581 Freileitungen 9890/631-637	4.75
420	24.02.2023	Anpassungen Entwässerungspläne 9890/561-581 Rodung 9890/98-100 Längenprofil Zu und Ableitungskanal 9890/400 + 419 und 420	4.00
<b>Subtotal</b>			<b>37.00</b>

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

  
 09.03.2023

Datum:

Datum:

<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
<b>Projekt</b>	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	<b>Projektleiter</b>	Christian Fuchs
<b>PLA</b>	420	AP SABA	<b>PLA Leiter</b>	Christian Fuchs
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	<b>Projektleiter Auftraggeber</b>	Nicole Schulz
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Vertragsnummer extern</b>	090069/000003

**Mitarbeiter:** Christian Hardmeyer

<b>Aktivität</b>	<b>Datum</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Stunde</b>
420	01.02.2023	Fertigstellung der Installationsflächen (3 Pl) 1:5'000	8.50
420	02.02.2023	Korrekturen aller Uebersichtspläne/resp. PW/SABA mit Umgebung 1:200 .	8.50
420	03.02.2023	Korrekturen aller Uebersichtspläne Entwässerung (21 Pl.) 1:1'000 .	9.50
420	06.02.2023	Fertigstellung Änderungen an allen 200er Sit. Pläne	4.25
420	07.02.2023	Anpassen FZRS Pläne / Legende, Farb sowie Linientyp.	3.75
420	08.02.2023	Anpassen der 1000er Sit. Pläne Entw.	9.00
420	09.02.2023	Situationen Entw. Konzept, ergänzen best. Bereiche Entw. über Schulter.	3.50
420	13.02.2023	Kontrolle Sit. 200er Pumpw. (7421-/438). bez. Änderungen gem. Korrex. Anpassen Grundriss bei PW Bhf. Stein.	4.50
420	14.02.2023	Anpassen aller 1000er Pläne Sit./Entw (/561-/581) bez. Änderungen Titelblätter.	7.00
420	15.02.2023	Fertigstellung Indexierung aller Pläne (Uebers. Install. 200er Sit, 1000er Sit) stand Version 1.0.	4.50
420	16.02.2023	Erstellen Kartenausdruck (Autobahn) für Excelbericht. Anpassen Farbzuteilung (Einzugsgebiet) bei Situationen Installationen.	1.00
420	17.02.2023	Erstellen Abgabe-File mit Leitungen außerhalb ASTRA Perimeter für JSAG Landerwerb.	7.50
<b>Subtotal</b>			<b>71.50</b>

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:

<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
<b>Projekt</b>	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	<b>Projektleiter</b>	Christian Fuchs
<b>PLA</b>	420	AP SABA	<b>PLA Leiter</b>	Christian Fuchs
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	<b>Projektleiter Auftraggeber</b>	Nicole Schulz
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Vertragsnummer extern</b>	090069/000003

**Mitarbeiter:** Dirk Martin

<b>Aktivität</b>	<b>Datum</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Stunde</b>
420	01.02.2023	Korreferat Pläne gem. Stn FU, Projektierung IF-Pläne und Pumpwerke	1.50
420	02.02.2023	Prüfen und kommentieren der Stn BuP inkl. aufgleisen der Umsetzung	3.25
420	03.02.2023	Abschluss der Prüfung und kommentieren der Stn BuP	1.00
420	21.02.2023	Planprüfung mit Plankorrekturen inkl. Zeichnerinstruktion	3.00
420	22.02.2023	Planprüfung mit Plankorrekturen inkl. Zeichnerinstruktion, Rückmeldung BHU zur Planlieferung, Bearbeiten NV	6.75
420	23.02.2023	Planprüfung mit Plankorrekturen inkl. Zeichnerinstruktion	1.00
420	24.02.2023	Abgleich Landerwerb inkl. Datenaustausch	1.50
420	28.02.2023	Abgleich Landerwerb, Bearbeiten Inhaltsverzeichnis, Bearbeiten Technische Berichte, Abgabedossier vorbereiten	3.75
<b>Subtotal</b>			<b>21.75</b>

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:


<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
<b>Projekt</b>	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	<b>Projektleiter</b>	Christian Fuchs
<b>PLA</b>	420	AP SABA	<b>PLA Leiter</b>	Christian Fuchs
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	<b>Projektleiter Auftraggeber</b>	Nicole Schulz
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Vertragsnummer extern</b>	090069/000003

**Mitarbeiter:** Maria del Mar Mendoza

<b>Aktivität</b>	<b>Datum</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Stunde</b>
420	01.02.2023	IG EP RF BB - Besprechung Stellungnahmen Bereinigung Dossier. Kontrollieren Pläne Installationsflächen und Baustellenzufahrten und besprechen mit Zeichner. Bearbeiten Stellungnahmen FU, korrigieren Planunterlagen gem. Stellungnahme und besprechen mit Zeichner. Korrigieren Entwässerungspläne und Pumpwerke.	2.50
420	02.02.2023	Bearbeiten Stellungnahmen FU, korrigieren Planunterlagen gem. Stellungnahme und besprechen mit Zeichner. Korrigieren Entwässerungspläne und Pumpwerke. Bearbeiten Präsentation Stellungnahme Dossier T-U und APs.	4.75
420	07.02.2023	Teamssitzung PFS T/U. Kontrollieren und korrigieren Pläne.	4.25
420	08.02.2023	Teamssitzung, besprechen Stellungnahmen Bereinigung Dossier. Instruieren Zeichner, bzgl. Pläne Versickerung und Dienstbarkeiten.	2.00
420	14.02.2023	Korrigieren div. Berichte Entwässerung.	4.75
420	15.02.2023	Korrigieren div. Berichte Entwässerung. Prüfen Versickerungspläne. Kontrollieren und korrigieren Entwässerungspläne und Pläne Pumpwerke.	4.00
420	16.02.2023	Korrigieren div. Berichte Entwässerung. Kontrollieren und korrigieren Entwässerungspläne und Pläne Pumpwerke.	6.00
<b>Subtotal</b>			<b>28.25</b>

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:


  
 09.03.2023

<b>Mandant</b>	AeBo	1000		
<b>Abteilung</b>	11004	A.B.VU. Verkehr und Umwelt		
<b>Projekt</b>	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	<b>Projektleiter</b>	Christian Fuchs
<b>PLA</b>	420	AP SABA	<b>PLA Leiter</b>	Christian Fuchs
<b>Typ</b>	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	<b>Projektleiter Auftraggeber</b>	Nicole Schulz
<b>Währung</b>	CHF Switzerland Franc		<b>Vertragsnummer extern</b>	090069/000003

<b>Mitarbeiter</b>		<b>Stunden</b>
BaS	Shemsi Bajrami	12.75
BoJ	Jan Boschung	37.00
Har	Christian Hardmeyer	71.50
MD	Dirk Martin	21.75
MeM	Maria del Mar Mendoza	28.25

<b>Aktivität</b>		<b>Stunden</b>
420	AP SABA	171.25
	<b>Total</b>	<b>171.25</b>

**JAUSLIN STEBLER AG**

**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.02.23 bis 28.02.23**

**Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP SABA inkl. SABA Mumpf**

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Roth Stefan	A	0	145	0.00
	<b>Total</b>	<b>A</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Forlin Sandro	B	0	122	0.00
Hartmann Peter	B	0	122	0.00
Mantinger Michael	B	0	122	0.00
Methner Raphael	B	0	122	0.00
	<b>Total</b>	<b>B</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Brauchli Stefan	C	0	95	0.00
Grieder Fabio	C	3	95	285.00
Hunziker Livia	C	12.25	95	1'163.75
Stocker Thomas	C	0	95	0.00
	<b>Total</b>	<b>C</b>	<b>15.25</b>	<b>1'448.75</b>
Deck Andreas	D	0	86	0.00
Dolder Silvio	D	0	86	0.00
Rothfuss Fabian	D	0	86	0.00
Haberthür Nicolas	D	0	86	0.00
Seebacher Andreas	D	0	86	0.00
Meyer Moritz	D	0	86	0.00
Nyffenegger Christoph	D	0	86	0.00
Brunner Andreas	D	0	86	0.00
Boeglin Chantal	D	0	86	0.00
	<b>Total</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Müller Jan	E	0	62	0.00
Brüngger Marco	E	0	62	0.00
Ladner Roman	E	0	62	0.00
Russer Elisabeth	E	0	62	0.00
Wortelboer Alexander	E	0	62	0.00
	<b>Total</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Dogan Esra	F	0	50	0.00
Prescha Deliah	F	0	50	0.00
	<b>Total</b>	<b>F</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Strittmatter Katja (Praktikantin)	G	0	8	0.00
Möri Anna	G	0	8	0.00
	<b>Total</b>	<b>G</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Aston Tim	G3/4	0	6	0.00
Gloor Leoni	G3/4	0	6	0.00
Straub Vanessa	G3/4	0	6	0.00
Schreiber Severin	G3/4	0	6	0.00
Hegi Yannick	G3/4	13.5	6	81.00
	<b>Total</b>	<b>G</b>	<b>13.5</b>	<b>81.00</b>
Schneider Anika	G1/2	0	4	0.00
	<b>Total</b>	<b>G</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamttotal</b>		<b>28.75</b>		<b>1'529.75</b>

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b> <b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b> <b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP SABA
Bezeichnung	<b>AP SABA</b>

Mitarbeiter           **Grieder Fabio (fg)**            Kategorie: C253    Leitender Ingenieur

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
17.02.2023	Abgleich mit L. Hunziker betreffend Kalkulation Abtrennung Fremdwasser (Thema LE)	1.00
17.02.2023	Koordination mit C. Fuchs betreffend fehlender Leitungen für Enteignungspläne; Abgleich mit L. Hunziker betreffend Überarbeitung Enteignungspläne	1.50
28.02.2023	Kurzabgleich mit L. Hunziker betreffend abgetrennten Fremdwasserleitungen	0.50
<b>Summe</b>		<b>3.00</b>

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b> <b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b> <b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP SABA
Bezeichnung	<b>AP SABA</b>

Mitarbeiter **Hunziker Livia (Lgr)** Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
03.02.2023	ASTRA Dienstbarkeiten in Pläne einzeichnen für Konstrukteur, Besprechung mit Konstrukteur für Plananpassung,	2.00
07.02.2023	Prüfung Pläne inkl. Zeichnerkoordination, Exceltabelle für AeBo erstellen mit fehlenden Höhenangaben Leitungen für Personaldienstbrkeit, Projektdurchsprache mit F. Grieder	2.25
17.02.2023	Kalkulations FW Abtrennung erstellen inkl. Besprechung mit F. Grieder, Grunderwerbstabelle anpassen	1.50
24.02.2023	Besprechung mit Y. Hegi betreffend fehlenden SABA Leitungen, Besprechung mit D. Martin (AeBo) betreffend Landerwerb bei SABAleitungen, überprüfung LE-Pläne	2.00
28.02.2023	Besprechung mit D. Martin betreffend fehlenden SABA Leitungen bei SABA Eiken und SABA Frick, Pläne mit fehlenden Leitungen für Konstrukteur vorbereiten, Grundeigentümer für fehlende Parzellen heraussuchen, fehlende Parzellen in Grunderwerbstabelle ergänzen	4.50
<b>Summe</b>		<b>12.25</b>

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b> <b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b> <b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP SABA
Bezeichnung	<b>AP SABA</b>

Mitarbeiter      **Hegi Yannick (yh)**      Kategorie:    H      Lehrling (3. + 4. LJ)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
06.02.2023	Korrekturen von L.Hunziker in Enteignungsplänen einarbeiten (Darstellung und Ergänzungen)	5.00
07.02.2023	Inputs von L.Hunziker in Enteignungsplänen einarbeiten (Darstellung und Ergänzungen) fertigstellen	4.00
20.02.2023	Pläne abgabefertig machen (TB anpassen sowie darstellerische Anpassungen)	2.00
21.02.2023	Abgleich Landerwerbspläne mit Angaben von AeBo	1.00
28.02.2023	Anpassungen von L.Hunziker in Landerwerbspläne/ Enteignungspläne einarbeiten	1.50
<b>Summe</b>		<b>13.50</b>

**HOLINGER AG**

**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.02.2023 bis 28.02.2023**

**Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP SABA inkl. SABA Mumpf**

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Name Vorname	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
<b>Total</b>	<b>A</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>
Brodmann René	B	22.5	122	2'745.00
Name Vorname	B	0	122	0.00
<b>Total</b>	<b>B</b>	<b>22.5</b>		<b>2'745.00</b>
Wyrsch Vera	C	0	95	0.00
Heizmann Dominik	C	0	95	0.00
Schill Jasmin	C	0	95	0.00
Pflugi Matthias	C	0	95	0.00
Schwab Alexander	C	0	95	0.00
<b>Total</b>	<b>C</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>
Wiss Lukas	D	0	86	0.00
Hof Fabian	D	41.5	86	3'569.00
Peier Reto	D	0	86	0.00
Schneider Tanja	D	0	86	0.00
<b>Total</b>	<b>D</b>	<b>41.5</b>		<b>3'569.00</b>
Baumann Yannick	E	0	62	0.00
Häfelfinger Sarah	E	0	62	0.00
Schlumpf Oliver	E	0	62	0.00
Gerber Joel	E	0	62	0.00
Ammann Carmen	E	0	62	0.00
<b>Total</b>	<b>E</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>
Name Vorname	F	0	50	0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
<b>Total</b>	<b>F</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>
Poggioli Marisa	G1/2	0	4	0.00
Reimann Lea	G1/2	0	4	0.00
Trinh Cherry	G1/2	0	4	0.00
<b>Total</b>	<b>G1/2</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>
<b>Gesamttotal</b>		<b>64</b>		<b>6'314.00</b>

Detailrapport  
CHL03612.01 Rheinfelden-Frick, PV SABA  
Februar 2023



Holinger Gruppe

Datum	Mitarbeiter	Text	Anzahl Std.
01.02.2023		Bespr IG, Fachbespr HFA, Stellungnahmen ergänzen, Folien	3.00
03.02.2023		Folien für PFS vorbereiten, Bericht Anpassungen	3.50
06.02.2023		Folien für PFS Ergänzungen, Mails, Telefonate	1.50
07.02.2023		Teams PSFS T/U 16, inkl. Vor und Nachbereitung, Mail, Tel. Fuchs	4.00
08.02.2023		Team IG, Koord d Arbeiten, Mail Martin, Mail Leipert	1.50
13.02.2023		Mail bzgl Protokoll, Fachbespr intern - Terminkoordination	1.50
15.02.2023		Teams mit M. Mendoza	0.50
16.02.2023		Tel Mendoza, Fachbespr Hof	1.00
17.02.2023		Fachbespr HFA, Koordination der Abgabedoku, Mail bzgl Zaun SABA + Drittflächen	2.50
23.02.2023		Koordination der Restarbeiten bis zu Abgabe	2.00
24.02.2023		Fachbespr. Hof, Koordination der Dokumente	1.00
28.02.2023		Mail Umwelt, Unterlagen Versand	0.50
	<b>1000057. Brodmann René</b>		<b>22.50</b>
01.02.2023		IG Besprechung Stellungnahme, Absprache Aebo	2.00
02.02.2023		Überarbeitung Verweise der Berichte	2.50
03.02.2023		Powerpoint Stellungnahmen, Überarbeitung Bericht, Abgabe an Aebo	5.50
13.02.2023		Auflistung ausstehende Arbeiten	1.00
15.02.2023		Auflistung ausstehende Arbeiten	0.50
16.02.2023		Anpassung Titelblätter	0.50
17.02.2023		Abgabedokumente R+I Schema und Anlageschema, besprechung ausstehende Arbeiten	4.00
22.02.2023		Besprechung Abgabedossier D.Martin	1.50
22.02.2023		Anpassen R+I Schemas, Berichte und Titelblätter	4.00
23.02.2023		Anpassen R+I Schemas, Berichte und Titelblätter	5.00
24.02.2023		Anpassung Kostenschätzungen, Abgabedokumente	7.75
27.02.2023		Anpassen R+I Schemas, Berichte und Titelblätter	7.00
28.02.2023		Datenabgabe Afry	0.25
	<b>1000172. Hof Fabian</b>		<b>41.50</b>
<b>Total CHL03612.01 Rheinfelden-Frick, PV SABA</b>			<b>64.00</b>



### Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt:	N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen	Vertragsdatum:	14.11.2018
Vertragnehmer:	INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG	Vertragslaufzeit:	31.12.2022
Vertrag Nr.:	000003	Finanzierungskonto:	Unterhalt
Vertragsgegenstand:	PV Bau/BSA	Inventarobjekt:	FUP.2
Projektnummer:	090069	Phasen, beauftragt:	AP Bypass
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2023	Phasen, rapportiert:	AP Bypass
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Februar		

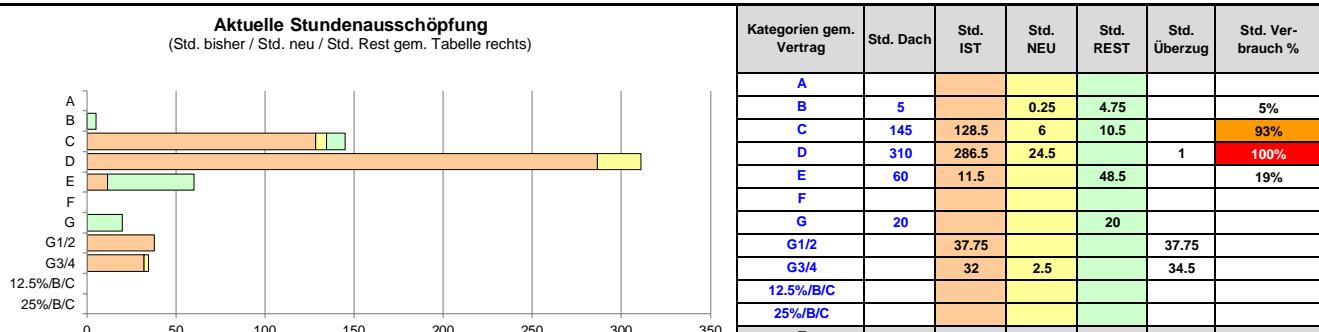

### Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG		A														
		B														
		C														
		D														
		E														
		F														
		G														
		G1/2														
		G3/4														
Jauslin Stebler AG		A														
		B			0.25											0.25
		C	123.5	5	6											134.5
		D	283.25	3.25	24.5											311
		E	11.5													11.5
		F														
		G														
		G1/2	37.75													37.75
		G3/4	32		2.5											34.5
Leipert AG		B														
		C														
		D														
		E														
		F														
Holinger AG		B														
		C														
		D														
		E														
		F														
		G														
		G1/2														
Total			488	8.25	33.25											529.5

### Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MwSt. inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A														31
CHF 122.00	B			31											31
CHF 95.00	C	11733	475	570											12776
CHF 86.00	D	24'360	280	2'107											26746
CHF 62.00	E	713													713
CHF 50.00	F														
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2	151													151
CHF 6.00	G3/4	192	15												207
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		37'148.00	754.50	2'722.50											CHF 40'625.00

**JAUSLIN STEBLER AG**

**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.02.23 bis 28.02.23**

**Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP Bypass**

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Roth Stefan	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
	<b>Total</b>	<b>A</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Forlin Sandro	B	0	122	0.00
Hartmann Peter	B	0	122	0.00
Mantinger Michael	B	0.25	122	30.50
Methner Raphael	B	0	122	0.00
	<b>Total</b>	<b>B</b>	<b>0.25</b>	<b>30.50</b>
Brauchli Stefan	C	0	95	0.00
Grieder Fabio	C	6	95	570.00
Hunziker Livia	C	0	95	0.00
Name Vorname	C	0	95	0.00
	<b>Total</b>	<b>C</b>	<b>6</b>	<b>570.00</b>
Abdelmoghni Ahmed	D	13.75	86	1'182.50
Deck Andreas	D	0	86	0.00
Dolder Silvio	D	7.25	86	623.50
Rothfuss Fabian	D	0	86	0.00
Seebacher Andreas	D	3.5	86	301.00
Meyer Moritz	D	0	86	0.00
Nyffenegger Christoph	D	0	86	0.00
Brunner Andreas	D	0	86	0.00
Boeglin Chantal	D	0	86	0.00
	<b>Total</b>	<b>D</b>	<b>24.5</b>	<b>2'107.00</b>
Meier Karin	E	0	62	0.00
Meier Vera	E	0	62	0.00
Müller Jan	E	0	62	0.00
Brüngger Marco	E	0	62	0.00
Ladner Roman	E	0	62	0.00
Russer Elisabeth	E	0	62	0.00
Wortelboer Alexander	E	0	62	0.00
	<b>Total</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Dogan Esra	F	0	50	0.00
Prescha Deliah	F	0	50	0.00
	<b>Total</b>	<b>F</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Strittmatter Katja (Praktikantin)	G	0	8	0.00
Möri Anna	G	0	8	0.00
	<b>Total</b>	<b>G</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Aston Tim	G3/4	0	6	0.00
Straub Vanessa	G3/4	0	6	0.00
Hegi Yannick	G3/4	2.5	6	15.00
Schneider Anika	G1/2	0	4	0.00
	<b>Total</b>	<b>G</b>	<b>2.5</b>	<b>15.00</b>
<b>Gesamttotal</b>		<b>33.25</b>		<b>2'722.50</b>

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.0		
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b> <b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b> <b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>		
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS		
Bezeichnung	<b>Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA</b> <b>Projektkurzbezeichnung: EP RhFr</b> <b>Projektnummer: 090069</b> <b>AP Bypass</b>		
Mitarbeiter	<b>Mantinger Michael (mim)</b>	Kategorie:	B353 Leitender Ingenieur(B)
Datum	Leistungsbeschrieb		Stunden
23.02.2023	Zuarbeit neuer KV		0.25
<b>Summe</b>			<b>0.25</b>

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b> <b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b> <b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	<b>Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA</b> <b>Projektkurzbezeichnung: EP RhFr</b> <b>Projektnummer: 090069</b> <b>AP Bypass</b>

Mitarbeiter                   **Grieder Fabio (fg)**                   Kategorie:   B353           Leitender Ingenieur(B)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
01.02.2023	Vorbereiten Beispiel für Präsentation PFS T/U 16	0.50
02.02.2023	Zusammentragen Informationen für PFS T/U 16	0.75
03.02.2023	Ergänzung Präsentation PFS T/U 16	1.00
09.02.2023	Vorbereiten Präsentation PFS LV inkl. Koreferat Traktandenvorschlag und Rückmeldung an BHU	1.75
24.02.2023	KoSi AP Bypass inkl. Vorbereitung	2.00
<b>Summe</b>		<b>6.00</b>

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b> <b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b> <b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	<b>Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA</b> <b>Projektkurzbezeichnung: EP RhFr</b> <b>Projektnummer: 090069</b> <b>AP Bypass</b>

Mitarbeiter                   **Abdelmoghni Ahmed (aha)**                   Kategorie: D154                   Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
10.02.2023	Bearbeitung Tech. Bericht Bypass Frick gemäss Rückmeldung FU.	3.00
13.02.2023	Vorbereitung Titelblatt-Vorgaben und interne Koordination betreffend Abgabe 13.03.2023. Aktualisierung Inhaltsverzeichnis	1.50
14.02.2023	Ersellung Dossierberschrifungen.	0.50
23.02.2023	Interne Besprechung JS und Bearbeitung Tech. Bericht. Bearbeitung KV gemäss neuer Vorlage. Vorgaben Radweg gemäss ASTRa und Kanton Aargau sichten und Korrespondent.	2.75
24.02.2023	Besprechung Langsamverkehr JS Intern. Bearbeitung und Ablage Beilage m1 für Abgabe 13.03	1.25
27.02.2023	Prüfung Radweg Bereich Kreisel West. Prüfung bestehende Breiten und Abmessungen NP gemäss ASTRa RL, VSS, Kanton Aargau. Erstellung erster Entwurf und korrespondent.	4.75
<b>Summe</b>		<b>13.75</b>

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b>
	<b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b>
	<b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	<b>Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA</b>
	<b>Projektkurzbezeichnung: EP RhFr</b>
	<b>Projektnummer: 090069</b>
	<b>AP Bypass</b>

Mitarbeiter                   **Dolder Silvio (sdo)**                   Kategorie: D154      Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
14.02.2023	Überarbeitung Enteignungsplan und Querprofil gem. Rückmeldung FU	1.25
20.02.2023	Ändern neue Parzellengrenze im Enteignungsplan, Übertragen der neuen Parzellengrenze in die Querprofile, Kontrolle der Titelblätter der Dokumente für die UMW und Versand der Dokumente an PV Umwelt	3.50
24.02.2023	Ändern Titelblätter der Dokumente für die Abgabe, Anpassen Pläne mit Verweis auf das MK oder Protokolle	2.50
<b>Summe</b>		<b>7.25</b>

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b> <b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b> <b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	<b>Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA</b> <b>Projektkurzbezeichnung: EP RhFr</b> <b>Projektnummer: 090069</b> <b>AP Bypass</b>

Mitarbeiter                    **Seebacher Andreas (san)**                    Kategorie: D154                    Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
23.02.2023	Sitzung intern aktueller Stand und Sitzung Langsamverkehr mit S. Dolder u. A. Abdelmoghni; Langsamverkehr sichten Unterlagen; KV anpassen nach neuen Kontenplan in Absprache mit BHU	1.50
24.02.2023	KV: Bericht (Textbausteine) anpassen gemäss aktuellen Kontenplan; KoSi: Langsamverkehr inkl. vorbereiten und nachbereiten	2.00
<b>Summe</b>		<b>3.50</b>

# ARBEITSRAPPORT

**JAUSLIN  
STEBLER**

**Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023**

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b> <b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b> <b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	<b>Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA</b> <b>Projektkurzbezeichnung: EP RhFr</b> <b>Projektnummer: 090069</b> <b>AP Bypass</b>



Mitarbeiter                   **Hegi Yannick (yh)**                   Kategorie:    H                   Lehrling (3. + 4. LJ)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
15.02.2023	Beginn mit Pläne abgabefertig machen sowie Korrekturen von S.Dolder in Landerwerbsplan einarbeiten	1.50
17.02.2023	Pläne abgabefertig machen (Titelnblätter anpassen)	1.00
<b>Summe</b>		<b>2.50</b>



### Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt:	N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen	Vertragsdatum:	14.11.2018
Vertragnehmer:	INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG	Vertragslaufzeit:	31.12.2022
Vertrag Nr.:	000003	Finanzierungskonto:	Unterhalt
Vertragsgegenstand:	PV Bau/BSA	Inventarobjekt:	FUP.2
Projektnummer:	090069	Phasen, beauftragt:	AP Installationen
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2023	Phasen, rapportiert:	AP Installationen
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Februar		

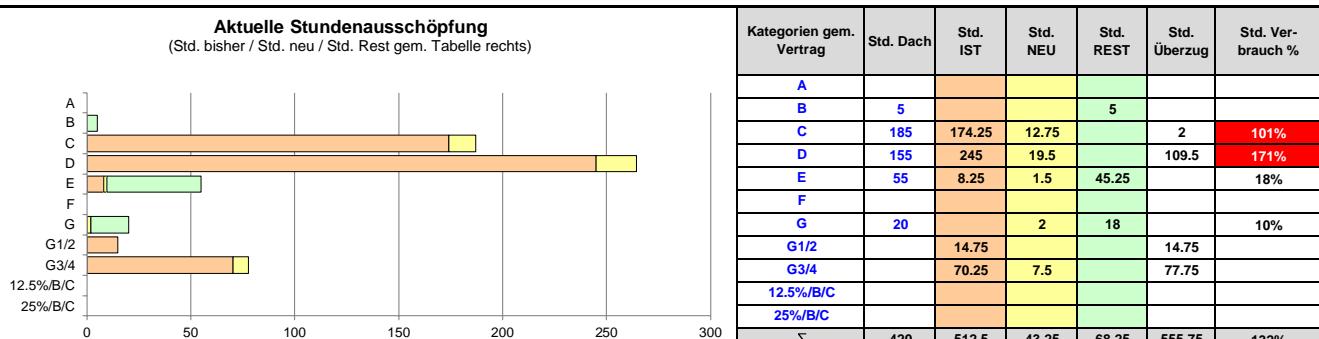

Stundenabrechnung																
Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG		A														
		B														
		C														
		D														
		E														
		F														
		G														
		G1/2														
		G3/4														
Jauslin Stebler AG		A														
		B														
		C	158.25	16	12.75											187
		D	237	8	19.5											264.5
		E	8.25		1.5											9.75
		F														
		G			2											2
		G1/2	13.75	1												14.75
		G3/4	70.25		7.5											77.75
Leipert AG		B														
		C														
		D														
		E														
		F														
Holinger AG		B														
		C														
		D														
		E														
		F														
		G1/2														
Total			487.5	25	43.25											555.75

Kostenabrechnung																
Ansatz (exkl. MwSt. inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total	
CHF 145.00	A															
CHF 122.00	B															
CHF 95.00	C	15'034	1'520	1'211												17'765
CHF 86.00	D	20'382	688	1'677												22'747
CHF 62.00	E	512		93												605
CHF 50.00	F															
CHF 8.00	G			16												16
CHF 4.00	G1/2	55	4													59
CHF 6.00	G3/4	422		45												467
CHF 13.56	12.5%/B/C															
CHF 27.13	25%/B/C															
Total		36'403.75	2'212.00	3'042.25												CHF 41'658.00

**JAUSSLIN STEBLER AG**

**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.02.23 bis 28.02.23**

**Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Installationen**

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Roth Stefan	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
<b>Total</b>	<b>A</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>
Forlin Sandro	B	0	122	0.00
Hartmann Peter	B	0	122	0.00
Mantinger Michael	B	0	122	0.00
Methner Raphael	B	0	122	0.00
<b>Total</b>	<b>B</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>
Brauchli Stefan	C	0	95	0.00
Grieder Fabio	C	6.75	95	641.25
Hunziker Livia	C	6	95	570.00
Stocker Thomas	C	0	95	0.00
<b>Total</b>	<b>C</b>	<b>12.75</b>		<b>1'211.25</b>
Abdelmoghni Ahmed	D	9.25	86	795.50
Deck Andreas	D	0	86	0.00
Dolder Silvio	D	8	86	688.00
Rothfuss Fabian	D	0	86	0.00
Haberthür Nicolas	D	0	86	0.00
Seebacher Andreas	D	2.25	86	193.50
Meyer Moritz	D	0	86	0.00
Nyffenegger Christoph	D	0	86	0.00
Brunner Andreas	D	0	86	0.00
Boeglin Chantal	D	0	86	0.00
<b>Total</b>	<b>D</b>	<b>19.5</b>		<b>1'677.00</b>
Marscovetere Liliana	E	1.5	62	93.00
Müller Jan	E	0	62	0.00
Brüngger Marco	E	0	62	0.00
Ladner Roman	E	0	62	0.00
Russer Elisabeth	E	0	62	0.00
Wortelboer Alexander	E	0	62	0.00
<b>Total</b>	<b>E</b>	<b>1.5</b>		<b>93.00</b>
Dogan Esra	F	0	50	0.00
Prescha Deliah	F	0	50	0.00
<b>Total</b>	<b>F</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>
Eisele Marcus (Praktikant)	G	2	8	16.00
Strittmatter Katja (Praktikantin)	G	0	8	0.00
Möri Anna	G	0	8	0.00
<b>Total</b>	<b>G</b>	<b>2</b>		<b>16.00</b>
Schneider Anika	G1/2	0	4	0.00
Aston Tim	G3/4	0	6	0.00
Gloor Leoni	G3/4	0	6	0.00
Straub Vanessa	G3/4	0	6	0.00
Schreiber Severin	G3/4	0	6	0.00
Hegi Yannick	G3/4	7.5	6	45.00
<b>Total</b>	<b>G</b>	<b>7.5</b>		<b>45.00</b>
<b>Gesamtotal</b>		<b>43.25</b>		<b>3'042.25</b>

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b> <b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b> <b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung	<b>Installationensflächen und Landerwerb</b>

Mitarbeiter      **Grieder Fabio (fg)**      Kategorie: C354      Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
02.02.2023	Zusammentragen Informationen für PFS T/U 16	0.75
03.02.2023	PFS BSA inkl. Nachbereitung; Ergänzung Präsentation PFS T/U 16	3.00
27.02.2023	Durchsicht überarbeiteter Technischer Bericht (markierte Textpassagen) und Abgleich mit L. Hunziker betreffend Stand Abklärungen IP AS Rhf Ost	1.50
28.02.2023	Info Projektbeteiligte betreffend Entscheid GHGW und weiteres Vorgehen zum Dossierabschluss	1.50
<b>Summe</b>		<b>6.75</b>

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b> <b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b> <b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung	<b>Installationensflächen und Landerwerb</b>

Mitarbeiter      **Hunziker Livia (Lgr)**      Kategorie: C354      Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
13.02.2023	Besprechung mit F. Grieder betreffend IP Rheinfelden Ost	0.25
21.02.2023	Telefonat mit B.Morgenthaler betreffend IP RHF Ost, inkl. E-Mail an F. Grieder	0.50
24.02.2023	Abklärung betreffend IP RhF Ost	0.25
27.02.2023	Planvorlage "Skizzen" mit allnen Dienstbarkeiten auf ASTRA Parzellen, Telefonat mit Fabio Grieder betreffend IP Rheinfelden	2.50
28.02.2023	Zeichnerkoordination für Pläne (DB ASTRA Parzellen) Grunderwerbstabelle ergänzen, Telefonat mit B. Morgenthaler betreffend weitem vorgehen IP Rheinfelden Parzelle N. 1715 RHF, Terminprogramm anpassen	2.50
<b>Summe</b>		<b>6.00</b>

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.: 702288.0  
Bezeichnung **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**  
**ASTRA-Bestellnummer: 1357043803**  
**ASTRA-Projektnummer: MP-090069**  
Auftrag-Nr.: 702288.0\_PH31\_AP\_IF + LE  
Bezeichnung **Installationensflächen und Landerwerb**

Mitarbeiter **Abdelmoghni Ahmed (aha)** Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
08.02.2023	Bearbeitung Beilage m1 für AP IF + LE. Bearbeitung und integration Beilage m1 im AP MK.	6.75
13.02.2023	Vorbereitung Titelblatt-Vorgaben und interne Koordination betreffend Abgbe 13.03.2023. Aktualisierung Inhaltsverzeichnis	1.00
14.02.2023	Ersellung Dossierberschrifungen.	0.50
15.02.2023	Besprechung Bearbeitung Pläne b1- b3 mit dem Zeichner gemäss Rückmeldung FU.	0.50
23.02.2023	Bearbeitung KV gemäss neuer Vorlage	0.50
<b>Summe</b>		<b>9.25</b>

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b> <b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b> <b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung	<b>Installationensflächen und Landerwerb</b>

Mitarbeiter      **Dolder Silvio (sdo)**      Kategorie: D154      Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
09.02.2023	Interne Besprechung weitere Bearbeitung der Dossiers nach Rückmeldung FU	1.50
23.02.2023	Vorbereitung Besprechung zum Stand der Arbeiten zu den Rückmeldungen der FU, Besprechung weiteres Vorgehen und Stand der Arbeiten mit A. Seebacher und A. Abdelmoghni, Anpassung Landerwerb im KV, Überarbeiten vom Technischen Bericht und entfernen alle Verweise auf das MK und Sitzungen	3.25
24.02.2023	TB überarbeiten und alle Verweise auf MK oder Protokolle entfernen, Abgleich Stand Dossierüberarbeitung mit A. Abdelmoghni, A. Seebacher und F. Grieder	2.50
28.02.2023	Überarbeiten des TB gemäss der Rückmeldung von F. Grieder, überprüfen Flächenangaben im TB mit den Enteignungsplänen	0.75
<b>Summe</b>		<b>8.00</b>

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

---

Projekt-Nr.: 702288.0  
Bezeichnung **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**  
**ASTRA-Bestellnummer: 1357043803**  
**ASTRA-Projektnummer: MP-090069**  
Auftrag-Nr.: 702288.0\_PH31\_AP\_IF + LE  
Bezeichnung **Installationenflächen und Landerwerb**

Mitarbeiter **Seebacher Andreas (san)** Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
23.02.2023	Sitzung intern zu aktuellem Stand S. Dolder u. A. Abdelmoghni inkl. Ablgeich Verweise im AP; KV anpassen nach neuen Kontenplan in Absprache mit BHU	1.50
24.02.2023	KV: Bericht (Textbausteine) anpassen gemäss aktuellen Kontenplan	0.75
<b>Summe</b>		<b>2.25</b>

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b> <b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b> <b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung	<b>Installationensflächen und Landerwerb</b>

Mitarbeiter      **Marscovetere Liliana (lma)**      Kategorie: E376      Kaufm.-/Sekretariatspers.(E)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
07.02.2023	EP RHE FRI: Planbeilagen Rodungsgesuche für F.Grieder bereitgestellt	1.00
08.02.2023	EP RHE FRI: Planbeilagen Rodungsgesuche /Dokumente fertiggestellt für F.Grieder	0.50
<b>Summe</b>		<b>1.50</b>

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

---

Projekt-Nr.: 702288.0  
Bezeichnung **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**  
**ASTRA-Bestellnummer: 1357043803**  
**ASTRA-Projektnummer: MP-090069**

Auftrag-Nr.: 702288.0\_PH31\_AP\_IF + LE  
Bezeichnung **Installationensflächen und Landerwerb**

Mitarbeiter **Eisele Marcus** (marcus.eisele) Kategorie: G Praktikant (G)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
20.02.2023	Bereinigen Digitale Ablage	2.00
<b>Summe</b>		<b>2.00</b>

# ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.02.2023 - 28.02.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	<b>N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen</b> <b>ASTRA-Bestellnummer: 1357043803</b> <b>ASTRA-Projektnummer: MP-090069</b>
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung	<b>Installationensflächen und Landerwerb</b>

Mitarbeiter      **Hegi Yannick (yh)**      Kategorie:    H      Lehrling (3. + 4. LJ)


Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
06.02.2023	Korrekturen von L.Hunziker in Situationsplan Landerwerb einarbeiten	0.50
15.02.2023	Pläne abgabefertig machen (Titelblätter anpassen, Korrekturen von A.Abdelmoghn bei Darstellung einarbeiten)	3.00
28.02.2023	Kontrollieren mittels Angaben von AeBo ob alle Landerwerbspläne vorhanden sind sowie Korrekturen von L.Hunziker in Landerwerbspläne einarbeiten (Inhaltliche Anpassungen)	4.00
<b>Summe</b>		<b>7.50</b>




### Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt:	N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen	Vertragsdatum:	14.11.2018
Vertragnehmer:	INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG	Vertragslaufzeit:	31.12.2022
Vertrag Nr.:	000003	Finanzierungskonto:	Unterhalt
Vertragsgegenstand:	PV Bau/BSA	Inventarobjekt:	FUP.2
Projektnummer:	090069	Phasen, beauftragt:	GHGW
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2023	Phasen, rapportiert:	GHGW
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Februar		

**Aktuelle Stundenausschöpfung**  
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

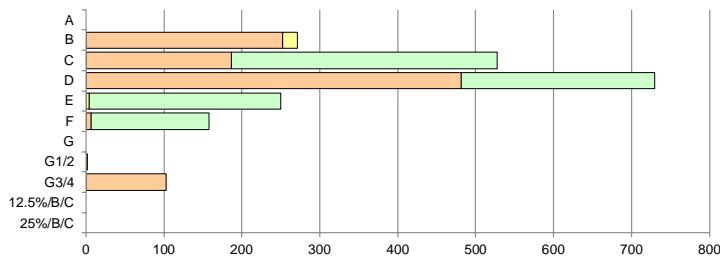

**Gesamtübersicht in %**



quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung 99%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach CHF 152'200.00

Kosten ist CHF 93'602

Kostenausschöpfung 61.50%

Stundenausschöpfung 59%

### Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG		Kategorie														
		A														
		B	2													2
		C	7.25													7.25
		D	38.75													38.75
		E														
		F														
		G														
		G1/2														
		G3/4														
Jauslin Stebler AG		Kategorie														
		A														
		B	0.25													0.25
		C	132.75													132.75
		D	436.5													436.5
		E														
		F	6.5													6.5
		G														
		G1/2	2													2
		G3/4	103.25													103.25
Leipert AG		Kategorie														
		B	246	4	19.5											269.5
		C	47													47
		D	6.75													6.75
		E				4.5										4.5
Holinger AG		Kategorie														
		B														
		C														
		D														
		E														
		F														
		G														
		G1/2														
Total			1029	4	24											1057

### Kostenabrechnung

Ansatz (exkl. MwSt. inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A														
CHF 122.00	B	30'287	488	2'379											33'154
CHF 95.00	C	17'765													17'765
CHF 86.00	D	41'452													41'452
CHF 62.00	E			279											279
CHF 50.00	F	325													325
CHF 8.00	G														8
CHF 4.00	G1/2	8													8
CHF 6.00	G3/4	620													620
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		90'456.00	488.00	2'658.00											CHF 93'602.00

**Leipert AG**

**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.02.2023 bis 28.02.2023**

**Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, GHGW**

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Name Vorname	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
	<b>Total</b>	<b>A</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Leipert Markus	B	19.5	122	2'379.00
Herzog Stefan	B	0	122	0.00
Riderle Timo	B	0	122	0.00
	<b>Total</b>	<b>B</b>	<b>19.5</b>	<b>2'379.00</b>
Mozzillo Sergio	C	0	95	0.00
Weisskopf Silvan	C	0	95	0.00
Hofer Michael	C	0	95	0.00
Lazzarato Roberto	C	0	95	0.00
	<b>Total</b>	<b>C</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Gassmann Silvia	D	0	86	0.00
Hofer Michael	D	0	86	0.00
	<b>Total</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Rauchenstein Lars	E	4.5	62	279.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
	<b>Total</b>	<b>E</b>	<b>4.5</b>	<b>279.00</b>
Name Vorname	F	0	50	0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
	<b>Total</b>	<b>F</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamttotal</b>		<b>24</b>		<b>2'658.00</b>



Name: <b>Rauchenstein</b>	Vorname: <b>Lars</b>	Monat: <b>Februar</b>	Jahr: <b>2023</b>	Kategorie: <b>E</b>	Kostenart	
Auftraggeber: <b>INGE EP RF BB</b>	Auftragsnummer: <b>327.2</b>	Bezeichnung: <b>N03 EP Rheinfelden - Frick, GHGW (MK)</b>				Vertrags- oder Bestellnummer:

Tag	Stunden	Nacht	Sonntag	Tätigkeitsbeschrieb
	100%	25.0%	50.0%	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22	2.00			Prinzipschema und Synoptikpläne anpassen (Datum, Version etc.) für Abgabe
23	2.50			Prinzipschema und Synoptikpläne anpassen (Datum, Version etc.) für Abgabe
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
Total	<b>4.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

MA: L. Müller

PL: M. K. W.



Name: <b>Leipert</b>	Vorname: <b>Markus</b>	Monat: <b>Februar</b>	Jahr: <b>2023</b>	Kategorie: <b>B</b>	Kostenart
Auftraggeber: <b>INGE EP RF BB</b>	Auftragsnummer: <b>327.2</b>	Bezeichnung: <b>N03 EP Rheinfelden - Frick, GHGW (MK)</b>			Vertrags- oder Bestellnummer:

Tag	Stunden	Nacht	Sonntag	Tätigkeitsbeschrieb
	100%	25.0%	50.0%	
1				
2				
3	4.00			PFS BSA, Vorbereitung Sitzung, Erstellung Protokoll
4				
5				
6				
7				
8	1.50			Interne Bespr. Stand Überab. MK, Vorbereitung Aufgabenzuweisung
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22	2.00			Überarbeitung MK-Unterlagen Interne Bespr. Stand Bereinigung MK, Abkl. betr. aktualisierter Beilagen PV Bau, Überarbeiten MK gem.
23	7.50			Rückmeldung, Prüfen, anpassen Kosten, Prüfen div. Beilagen
24	3.00			Überarbeitung Unterlagen MK, Prüfen der Ergänzungen in div. Plänen und Beilagen
25				
26				
27	1.50			Abkl. mit VI betr. Dossier, Fertigstellen der Unterlagenbereinigung, Abkl. betr. Darstellung Gesamtkosten
28				
29				
30				
31				
Total	<b>19.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

MA: \_\_\_\_\_

PL:
