


Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt: N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
Vertragnehmer: INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau/BSA
Projektnummer: 090069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU): August

Vertragsdatum: 14.11.2018
Vertragslaufzeit: 31.12.2022
Finanzierungskonto: Unterhalt
Inventarobjekt: FUP.2
Phasen, beauftragt: Option Lärm
Phasen, rapportiert: Option Lärm

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

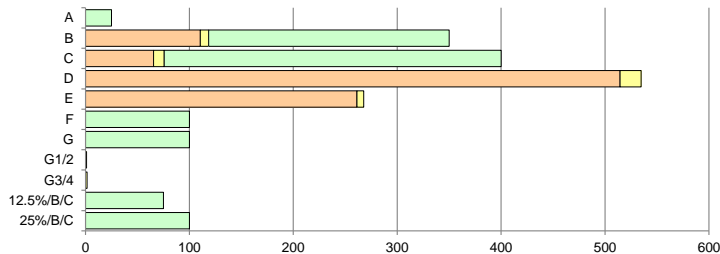

Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	25			25		
B	350	110.5	8	231.5		34%
C	400	65.5	10.25	324.25		19%
D	450	514.5	20.25		84.75	119%
E	125	261.25	6.5		142.75	214%
F	100			100		
G	100			100		
G1/2			1		1	
G3/4			1.5		1.5	
12.5%/B/C	75			75		
25%/B/C	100			100		
Σ	1725	951.75	47.5	955.75	999.25	58%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung 91%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach CHF 140'304.69

Kosten ist CHF 84'255

Kostenausschöpfung 60.05%

Stundenausschöpfung 58%

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B														
	Kategorie	C														
	Kategorie	D														
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2														
	Kategorie	G3/4														
Jauslin Stebler AG	Kategorie	A														
	Kategorie	B	110							0.5	8					118.5
	Kategorie	C	63						1	1.5	10.25					75.75
	Kategorie	D	504.75							9.75	20.25					534.75
	Kategorie	E	261.25								6.5					267.75
	Kategorie	F														
	Kategorie	G														
	Kategorie	G1/2									1					1
	Kategorie	G3/4								1.5						1.5
Leipert AG	Kategorie	B														
	Kategorie	C														
	Kategorie	D														
	Kategorie	F														
Holinger AG	Kategorie	B														
	Kategorie	C														
	Kategorie	D														
	Kategorie	E														
	Kategorie	F														

JAUSLIN STEBLER AG
Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.08.22 bis 31.08.22
Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP Lärm

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Roth Stefan	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Forlin Sandro	B	8	122	976.00
Hartmann Peter	B	0	122	0.00
Mantinger Michael	B	0	122	0.00
Methner Raphael	B	0	122	0.00
Total	B	8		976.00
Brauchli Stefan	C	0	95	0.00
Grieder Fabio	C	10.25	95	973.75
Hunziker Livia	C	0	95	0.00
Name Vorname	C	0	95	0.00
Total	C	10.25		973.75
Abdelmoghni Ahmed	D	0	86	0.00
Deck Andreas	D	0	86	0.00
Rothfuss Fabian	D	0	86	0.00
Seebacher Andreas	D	0	86	0.00
Meyer Moritz	D	0	86	0.00
Nyffenegger Christoph	D	0	86	0.00
Brunner Andreas	D	20.25	86	1'741.50
Boeglin Chantal	D	0	86	0.00
Total	D	20.25		1'741.50
Müller Jan	E	0	62	0.00
Brüngger Marco	E	0	62	0.00
Ladner Roman	E	2	62	124.00
Marsicovetere Liliana	E	4.5	62	279.00
Russer Elisabeth	E	0	62	0.00
Wortelboer Alexander	E	0	62	0.00
Total	E	6.5		403.00
Dogan Esra	F	0	50	0.00
Prescha Deliah	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Strittmatter Katja (Praktikantin)	G	0	8	0.00
Möri Anna	G	0	8	0.00
Total	G	0		0.00
Straub Vanessa	G3/4	0	6	0.00
Werthen Lukas	G3/4	1.5	6	9.00
Hegi Yannick	G1/2	0	4	0.00
Schneider Anika	G1/2	1	4	4.00
Total	G	2.5		13.00
Gesamttotal		47.5		4'107.25

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.08.2022 - 31.08.2022

Projekt-Nr.:	702288.2160
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.2160_PH 31 AP LSP
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (AP LSP) Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 Phase 31 AP LSP

Mitarbeiter	Forlin Sandro (SFo)	Kategorie:	B353	Leitender Ingenieur(B)
-------------	----------------------------	------------	------	------------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
12.08.2022	Erstellung Nutzungsvereinbarung (Unterstützung Projektingenieur)	6.00
18.08.2022	Schlusslesung (Korreferat, Ergänzungen) NV LSW, Abschlussarbeiten	2.00

Summe		8.00
--------------	--	-------------

Periode: 01.08.2022 - 31.08.2022

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 AP LSP
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (AP LSP)

Mitarbeiter	Grieder Fabio (fg)	Kategorie:	C253	Leitender Ingenieur
-------------	---------------------------	------------	------	---------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
16.08.2022	Koordination mit Projektteam betreffend Stand der Arbeiten und aufzeigen weiteres Vorgehen	0.75
18.08.2022	Koreferat überarbeitete UWN inkl. Rückmeldung an PV U; Kuzabgleich mit A. Brunner betreffend Stand Überarbeitung Pläne und Technischer Bericht	1.00
19.08.2022	Koordination mit PV U betreffend überarbeiteter NV; Abgleich mit PV Akustik betreffend Abgabedokumenten und aufgleisen Dossiererstellung; Durchsicht überarbeitete Pläne und Technischer Bericht	2.50
22.08.2022	Zusammenstellen Dossier inkl. Kurzkontrolle und Info GPL / BHU	0.75
23.08.2022	Koordination mit PV U betreffend Frage zu ökologischer Flächenbilanz; Abgleich mit PV Akustik betreffend Stand Dossiererstellung und Infos aus Gesamtprojekt	2.00
24.08.2022	Kurzabgleich mit PV U betreffend ökologische Flächenbilanz; Interne Koordination betreffend Dossiererstellung (mit L. Marsicovetere)	2.00
26.08.2022	Dossiererstellung und Kontrolle inkl. Abgleich mit P. Seiler	0.75
29.08.2022	Koordination mit P. Seiler betreffend Fertigstellung Dossiers und Schlusskontrolle	0.50
Summe		10.25



ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.08.2022 - 31.08.2022

Projekt-Nr.:	702288.2160
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.2160_PH 31 AP LSP
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (AP LSP) Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 Phase 31 AP LSP

Mitarbeiter **Brunner Andreas** (ban) Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
09.08.2022	Angaben für Zeichner und Kontrolle Unterlagen	1.00
10.08.2022	Plankorrektur und Anweisungen Zeichner	0.50
12.08.2022	Überarbeitung NV; interne Besprechung	1.50
15.08.2022	Überarbeiten NV (Normaktualisierung, aktualisierung Bauwerksbeschreibung, + Kap. 4, 5 + 6)	6.75
16.08.2022	Überarbeitung NV (aktualisieren Kap. 6, 7, 8 + 9)	3.00
17.08.2022	Überarbeitung NV (Abschlusskorekturen)	1.75
18.08.2022	Fertigstellen NV; Überprüfen alle Dokumente für die Abgabe	4.75
19.08.2022	Kontrolle und Versand Dossierunterlagen	1.00
Summe		20.25

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.08.2022 - 31.08.2022

Projekt-Nr.:	702288.2160
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.2160_PH 31 AP LSP
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (AP LSP) Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 Phase 31 AP LSP

Mitarbeiter	Ladner Roman (lar)	Kategorie:	E356	Zeichner(E)
-------------	---------------------------	------------	------	-------------

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
09.08.2022	Situation Ansichten und Querschnitte bereinigen/fertigstellen	2.00
Summe		2.00

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.08.2022 - 31.08.2022

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 AP LSP
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (AP LSP)

Mitarbeiter	Marsicovetere Liliana (Ima)	Kategorie:	E376	Kaufm.- /Sekretariatspers.(E)
-------------	------------------------------------	------------	------	----------------------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
24.08.2022	Vorbereiten / Erstellung Berichtdokumente für Dossierabgabe (Technischer Bericht, NV, UWN, m-Dossier	3.00
26.08.2022	Vorbereiten Dossierschachteln für Dossierabgabe	1.50
Summe		4.50

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.08.2022 - 31.08.2022

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 AP LSP
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (AP LSP)

Mitarbeiter	Werten Lukas (lw)	Kategorie:	H	Lehrling (3. + 4. Lj)
-------------	--------------------------	------------	---	-----------------------

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
-------	--------------------	---------

25.08.2022	Pläne für Abgabe AP Lärm vorbereiten (56 Stk.)	1.50
------------	--	------

Summe		1.50
--------------	--	------

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.08.2022 - 31.08.2022

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 AP LSP
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (AP LSP)

Mitarbeiter	Schneider Anika (sca)	Kategorie: I	Lehrling (1. + 2. LJ)
-------------	------------------------------	--------------	-----------------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
-------	-----------------------	---------

29.08.2022	Pläne für Abgabe Lärm erstellen (16 Stk.)	1.00
------------	---	------

Summe		1.00
--------------	--	------
