

Techdata AG
Herrn Matthias Lüthi
Ohmstrasse 14
8050 Zürich

Basel, 8. Juli 2022 / 9890.200 / MNo

9890_200_LS_BHU_R46 Juni 22_MNo_20220708.docx

L I E F E R S C H E I N

Betrifft: EP RHE FRI, IG EP RF-BB Honorarrechnung Juni 2022

- zur Prüfung/Genehmigung
- zur Weiterleitung an: ASTRA Zofingen

Beilage / Bemerkungen:


Sehr geehrter Herr Lüthi

In der Beilage senden wir Ihnen die Honorarrechnung für die geleisteten Arbeiten im Juni 2022.

Wir bitten Sie, die Rechnung zu kontrollieren und diese anschliessend an die Bauherrschaft weiterzuleiten.

Freundliche Grüsse

Noëlle Martin
Projektassistenz



IG EP RF-BB

c/o Aegeert & Bosshardt AG
Hochstrasse 48, 4002 Basel
Tel. 061 365 22 22 / E-Mail: basel@aebo.ch

Rechnungsdeckblatt und Kostenmatrix Dienstleistungen

ASTRA Projekt-Nr.		ASTRA Vertrags-Nr.		ASTRA Baileg-Nr.	
Kurzbezeichnung	090069	090069/20000003		07.07.2022	
Projektbezeichnung	EP RHE FRI	01.07.2018	Vertragende	31.12.2022	
Teilprojekt / Auftrag	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen	PV Bau/BSA		Rechnungsdatum	
FUP.2		Christian Fuchs		Rechnungsnummer	
Projektleiterin	Nicole Schulz	061 365 22 22		Leistungszeitraum	
		c.fuchs@aebo.ch		von	
ASTRA-Filiale	Bundesanst für Strassen (ASTRA)	Auftragnehmer		Abrechnungsart	
	Filiale Zofingen	INGE EP RF BB, c/o Aegeater & Bosshardt AG		Rechnungsart	
	Brühistrasse 3	Hochstrasse 48		Zahlungsfrist (ab korrektem Eingang bei erster Prüfstelle):	
	4800 Zofingen	4002 Basel		Eingangsstempel und -datum:	
		MWST/UID-Nr.	CHE-164.869.840 MWST	Stempel Erste Prüfstelle	45 Tage
				Stempel ASTRA	

RECHNUNGSBETRÄGE - GEGLIEDERT NACH PROJEKTSTRUKTUR TD COST (KOSTENMATRIX)

Kostenmatrix						
Inventarobjekt-Nr.	IO-Bezeichnung	Finanzierungs-konto	Kostenart	Prozentuale-Aufteilung	Leistungen (Brutto)	Nebenkosten (mit Rabatt)
19.03.48.311.01	U_Unterhalt	U	1.3100	-	81'892.50	0.00
		0	0		0.00	0.00
		0	0		0.00	0.00
		0	0		0.00	0.00
		0	0		0.00	0.00
	Gesamttotal				81'892.50	0.00
						81'892.50
						Rundungsdifferenz
						Rechnungsbetrag gerundet
						Netto inkl. MWST ohne Skontoabzug
						88'198.22

Bemerkungen:

Fr. 88'198.20

Rechnungsfreigabe für den Betrag von:

Fr. 88'198.20

1	2	3	4
BHU	-	ASTRA ICR	ASTRA Bereichsleiter
Techdata AG Ohmstrasse 14, 8050 Zürich Prüfperson:	Firma Adresse Prüfperson: E-Mail Stempel	Prüfperson: Name	Prüfperson: Kit
Datum (Materielle und rechnerische Prüfung)	Datum (Formelle Prüfung)	Visum	Datum (Materielle und rechnerische Prüfung) Visum (Genehmigung)

Datum (Materielle und rechnerische Prüfung)	Datum (Formelle Prüfung)	Visum	Visum
		Datum (Materielle und rechnerische Prüfung)	Visum (Genehmigung)

Beilagen: Rechnung Auftragnehmer mit Einzahlungsschein, Arbeitsrapporte mit Original-Unterschrift der betroffenen Person und ihres Vorgesetzten, Detail-/Drittbelege für Nebenkosten

20220630_RDB_V_090069_000003_46_MN0.xlsx / Erstellt von ASTRA am 22.04.2014

Kostenübersicht

ASTRA Projekt-Nr.	090069	ASTRA Vertrags-Nr.	090069/2000003	Rechnungsdatum	07.07.2022
Projektbezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmaßnahmen	Auftragnehmer	INGE EP RRF BB, c/o Aegerter & Bosshardt A	Abrechnungsnummer	46

VERTRAGSÜBERSICHT

Vertragsart	Vertragsdatum	ASTRA Vertrags-Nr.	Datum letzter Nachtrag	Anzahl Nachträge	Vertragssumme
Vertrag	14.11.2018	090069/2000003	23.11.2020	3	3'779'750.65
Summe aller Nachträge mit MWSt A					44'5378.65
Summe aller Nachträge mit MWSt B					4'225'129.30
Vertrag + Nachtragssumme					

RECHNUNGSSÜBERSICHT

Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Abrechnungsart	Nr.	Leistungszeitraum von bis	ASTRA Rechnungsart	Nettobetrag exkl. MWSt	Rechnungssumme	MWSt	Nettobetrag inkl. MWSt
01 - 02	diverse	Teilrechnung	01-02	01.09.2018	Honorar usw.	53'622.25	7.7%		57'751.15
03 - 14	23.04.2019	Teilrechnung	03-14	01.01.2019	Honorar usw.	73'470.25	7.7%		79'137.59
15-17, 19-27	23.03.2020	Teilrechnung	15-17, 19-27	01.01.2020	Honorar usw.	99'2946.50	7.7%		106'9403.34
18	30.04.2020	Teilrechnung	18	01.01.2019	Teuerung	2889.40	7.7%		3'111.90
28	26.04.2021	Teilrechnung	28	01.01.2021	Honorar usw.	90'520.25	7.7%		97'490.30
29	03.05.2021	Teilrechnung	29	01.02.2021	Honorar usw.	91'222.00	7.7%		98'246.10
30	19.08.2021	Teilrechnung	30	01.03.2021	Honorar usw.	131'284.00	7.7%		141'392.85
31	26.08.2021	Teilrechnung	31	01.04.2021	Honorar usw.	130'449.50	7.7%		140'494.10
32	26.08.2021	Teilrechnung	32	01.05.2021	Honorar usw.	118'420.00	7.7%		127'538.35
33	30.08.2021	Teilrechnung	33	01.06.2021	Honorar usw.	190'483.75	7.7%		205'151.00
34	02.09.2021	Teilrechnung	34	01.07.2021	Honorar usw.	208'993.00	7.7%		225'085.45
35	06.09.2021	Teilrechnung	35	01.01.2020	Teuerung	910'17.05	7.7%		9'711.35
36	09.11.2021	Teilrechnung	36	01.08.2021	Honorar usw.	87'286.75	7.7%		94'007.85
37	10.11.2021	Teilrechnung	37	01.09.2021	Honorar usw.	74'581.25	7.7%		80'324.00
38	15.11.2021	Teilrechnung	38	01.10.2021	Honorar usw.	77'431.75	7.7%		83'384.00
39	17.01.2022	Teilrechnung	39	01.11.2021	Honorar usw.	105'570.75	7.7%		113'689.70
40	15.02.2022	Teilrechnung	40	01.12.2021	Honorar usw.	88'878.25	7.7%		95'721.90
41	07.04.2022	Teilrechnung	41	01.01.2022	Honorar usw.	149'928.50	7.7%		161'473.00
42	03.05.2022	Teilrechnung	42	01.02.2022	Honorar usw.	166'506.00	7.7%		179'326.95
43	10.05.2022	Teilrechnung	43	01.03.2022	Honorar usw.	22'297.00	7.7%		24'013.85
44	16.06.2022	Teilrechnung	44	01.04.2022	Honorar usw.	21'034.25	7.7%		22'653.90
45	22.06.2022	Teilrechnung	45	01.05.2022	Honorar usw.	44'928.00	7.7%		48'387.45
46	07.07.2022	Teilrechnung	46	01.06.2022	Honorar usw.	81'892.50	7.7%		88'198.20
Rechnungssumme ohne Teuerung						3'663'046.50			3'945'101.03
Rechnungssumme mit Teuerung						3'674'952.95			3'957'924.29
Aufteilung der Rechnungen nach Rechnungsart:									
Anteil HON Honorar usw.						3'663'046.50			3'945'101.03
Anteil NK Nebenkosten						0.00			0.00
Anteil TEU Teuerung						11906.45			12'823.26

REST VERTRÄG

Vertrag + Nachtragssumme	Nettobetrag exkl. MWSt	Nettobetrag inkl. MWSt
Rechnungssumme ohne Teuerung	3'663'046.50	3'945'101.03
Aufteilung der Rechnungen nach Rechnungsart:		
Rest Vertrag	260'007.60	280'028.27
Ausschöpfung Vertrag in %	93.37%	93.37%

SCHLUSSRECHNUNG

Schlussrechnung	Verzicht auf Nachforderung	Bringt der Auftragnehmer keinen schriftlichen Vorbehalt an, so erklärt er mit der Einreichung der Schlussrechnung, dass er keine weiteren Rechnungen stellen wird und auf jeden weiteren Vergütungsanspruch für Leistungen verzichtet, die er bis dahin nicht in Rechnung gestellt hat.



Bundesamt für Strassen (ASTRA)
 Filiale Zofingen
 Brühlstr. 3
 4800 Zofingen

CHE-164.869.840 MWST

Auftrag Nr. 9890 / FCh / MNo

RECHNUNG Nr. 46

Basel, 07. Juli 2022

N3 EP Rheinfelden - Frick

EP RHE FRI, 090069, FUP_EP Rheinfelden, N. Schulz

Vertragsnummer: 090069/000003 vom 14.11.2018


	CHF	CHF
Erbrachte Leistungen vom Juni 2022 gemäss beiliegenden Arbeitsrapporten		
Massnahmenkonzept		
Aegerter & Bosshardt AG	6'195.50	
Jauslin Stebler AG	4'972.00	
Leipert AG	0.00	
Holinger AG	0.00	
	11'167.50	
Projektleitung		
Aegerter & Bosshardt AG	1'650.50	
	1'650.50	
AP SABA		
Aegerter & Bosshardt AG	46'769.25	
Jauslin Stebler AG	1'589.50	
Leipert AG	6'047.00	
Holinger AG	12'812.00	
	67'217.75	
AP Bypass		
Jauslin Stebler AG	285.00	
	285.00	
AP Installationen		
Jauslin Stebler AG	683.75	
	683.75	
Lärm		
Jauslin Stebler AG	95.00	
	95.00	
GHGW		
Aegerter & Bosshardt AG	0.00	
Jauslin Stebler AG	0.00	
Leipert AG	793.00	
	793.00	81'892.50
Nebenkosten		
	0.00	
	0.00	
	81'892.50	81'892.50
MwSt.	7.7%	
Rechnungstotal		6'305.70
		88'198.20

Bitte überweisen Sie den Betrag innert 45 Tagen auf unser Konto bei der Basler Kantonalbank, Basel, IBAN CH50 0077 0254 2872 1200 1 Besten Dank.



Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt:	N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen	Vertragsdatum:	14.11.2018
Vertragnehmer:	INGE EP RF BB, c/o Aegeuter & Bosshardt AG	Vertragslaufzeit:	31.12.2022
Vertrag Nr.:	000003	Finanzierungskonto:	Unterhalt
Vertragsgegenstand:	PV Bau/BSA	Inventarobjekt:	FUP.2
Projektnummer:	090069	Phasen, beauftragt:	MK, Phase 31
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2022	Phasen, rapportiert:	MK, Phase 31
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Juni		

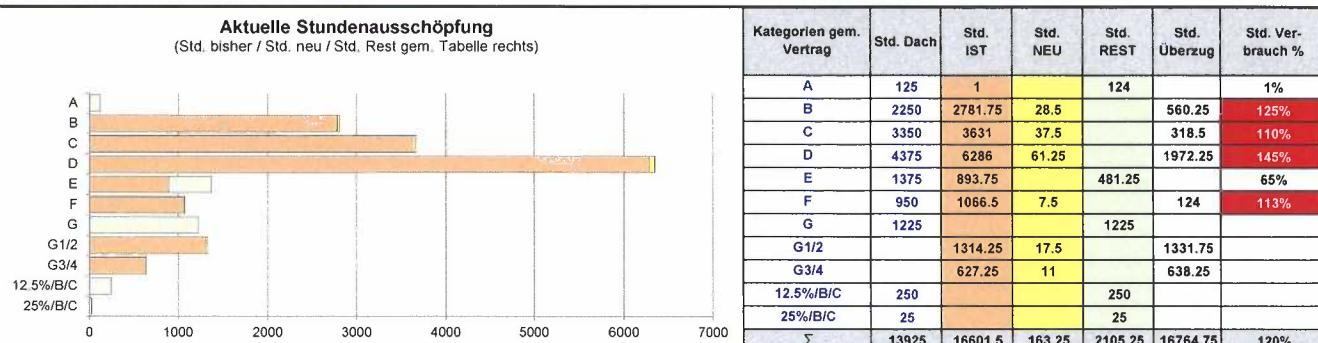

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegeuter & Bosshardt AG		A														
		B	1469.5	51.25	135	40.75	18	26.25	28.5							1769.25
		C	899.25	52	49.75	12.25	-12.25	1	8							1010
		D	2578	194.25	284.75	10.5	14.25	64.5	37							3183.25
		E	83.25													83.25
		F	896.25	104.25	20.75				7.5							1028.75
		G														
		G1/2	1144.75						13							1157.75
		G3/4	109.25													109.25
Jauslin Stebler AG		A	1													1
		B	647.5	27	9.5		0.5									684.5
		C	2410.25	103	50.25	10.75	4	13	29.5							2620.75
		D	2781.25	43	63.5		2.5	3	24.25							2917.5
		E	769.75	19.5	19											808.25
		F	45.25													45.25
		G														
		G1/2	116.5	3.25	2				4.5							126.25
		G3/4	447.5	18.5	52				11							529
Leipert AG		B	278													278
		C	7													7
		D	192													192
		E														
Holinger AG		B	78.5													78.5
		C	30.75													30.75
		D	54.5													54.5
		E	2.25													2.25
		F														
		G1/2	47.75													47.75
Total			15090	616	886.5	74.25	27	107.75	163.25							16764.75

Kostenabrechnung															
Ansatz (excl. MWSt., inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A	145													145
CHF 122.00	B	301'767	9'547	17'629	4'972	2'257	3'203	3'477							342'851
CHF 95.00	C	317'989	14'725	9'500	2'185	-784	1'330	3'563							346'508
CHF 86.00	D	482'095	20'404	29'950	903	1'441	5'805	5'268							545'864
CHF 62.00	E	53'026	1'209	1'178											55'413
CHF 50.00	F	47'075	5'213	1'038				375							53'700
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2	5'236	13	8				70							5'327
CHF 6.00	G3/4	3'341	111	312				66							3'830
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		1'210'672.25	51'220.50	59'614.00	8'059.50	2'913.75	10'337.50	12'818.00							CHF 1'355'635.50

Aegerter & Bosshardt AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.06.2022 bis 30.06.2022

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Projektleitung (MK)

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
--	A	0	145	0.00
--	A	0	145	0.00
	Total	A	0	0.00
Falzone Lorenzo	B	0	122	0.00
Fuchs Christian	B	13	122	1'586.00
Schädler Beat	B	0	122	0.00
Spieler Daniel	B	0	122	0.00
	Total	B	13	1'586.00
Nef Regula	D	0	86	0.00
Martin Noëlle	D	0.75	86	64.50
	Total	D	0.75	64.50
Gesamttotal		13.75		1'650.50

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.06.2022 bis 30.06.2022

Mandant Name	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	100	Projektleitung	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9890 EP RF-BB

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Fuchs Christian	B	13.00	122.00	1'586.00
Martin Noelle	D	0.75	86.00	64.50
Total PLA 100.Projektleitung		13.75	120.04	1'650.50

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	100	Projektleitung	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Christian Fuchs

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
100	02.06.2022	Teams mit F. Grieder, Terminorganisation und Vorbesprechung PS Bau, Traktanden vorbereiten	1.00
100	03.06.2022	Zusammenstellen und Verifikation der EKP mit F. Grieder; Mail an GPL/BHU; Ergänzungsmail Mittelbedarf; Mail an BHU zu anstehenden Sitzungen; Abstimmen zu Rückmeldungen betr. Vorabzugsdossier und Mail PV Bau zu Deckenverstärkung und Versand an Th. Fuchs	2.25
100	07.06.2022	Absprache mit R. Brodmann u D. Martin, Festlegen Traktanden für Sitzungen PS und PF-S	0.50
100	10.06.2022	Teams-Besprechung mit F. Grieder (Nachbesprechung Hauptaspekte der PS Bau v. 09.06.), Nachführen / Prüfen EKP	1.00
100	13.06.2022	Prüfen und weitergeben der Rückmeldungen GPL an TPL und PV U, hierzu diverse Mails	0.75
100	16.06.2022	Teilnahme an PF-S T/U Fokus SABA, Teilnahme an Besprechung mit PV U, hierzu Telefonate und Mails	2.75
100	17.06.2022	Sichtung& Ablage Doku PV U, Mail an Tempesta	0.50
100	20.06.2022	Projektstand prüfen, Endkosten weiter aufteilen, detaillieren, Entwurf an Partner; Mailkorrespondenz BHU (u.a. Protokolle, Berichte) sichten und ablegen	2.00
100	21.06.2022	Endkosten Aufteilung mit F. Grieder besprechen, anschl. versenden	1.00
100	27.06.2022	Telefonat mit F. Grieder btr. Stand der Arbeiten, Prüfen Stand im TP K	0.50
100	28.06.2022	Telefonat mit Oli Drengemann; Mail zu AP Lärm sichten	0.25
100	30.06.2022	Teams mit PV Umwelt, kurze Nachbesprechung mit D. Spieler	0.50
Subtotal			13.00

Unterschrift Mitarbeiter:

4

Unterschrift Vorgesetzter:

C.F.H.
01.07.2022

Datum:

Datum:

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	100	Projektleitung	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Noelle Martin

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
100	21.06.2022	Unterstützung PL, Unterlagen für die Kostenkontrolle ergänzen und aktualisieren	0.75
			Subtotal 0.75

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

C.F-11

Datum:

Datum:

01.07.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	100	Projektleitung	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter		Stunden
FCh	Christian Fuchs	13.00
MNo	Noelle Martin	0.75

Aktivität		Stunden
100	Projektleitung	13.75
	Total	13.75

Aegerter & Bosshardt AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.06.2022 bis 30.06.2022

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Massnahmenkonzept

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
--	A	0	145	0.00
--	A	0	145	0.00
	Total	A	0	0.00
Beck Peter	B	0	122	0.00
Falzone Lorenzo	B	0	122	0.00
Häner David	B	0	122	0.00
Fuchs Christian	B	0	122	0.00
Niedermeyer Friederike	B	0	122	0.00
Ruff Ute	B	0	122	0.00
Schädler Beat	B	0	122	0.00
Spieler Daniel	B	15.5	122	1'891.00
Weber Madeleine	B	0	122	0.00
	Total	B	15.5	1'891.00
Brem Jakob	C	0	95	0.00
Chroust Steffi	C	0	95	0.00
Martin Dirk	C	6	95	570.00
Mendoza Maria	C	2	95	190.00
Yelman Mahir	C	0	95	0.00
Wieland Manuel	C	0	95	0.00
	Total	C	8	760.00
Hardmeyer Christian	D	0	86	0.00
Delmas Marc	D	0	86	0.00
Beuret Agnès	D	0	86	0.00
Chrysopoulos Viktoria	D	0.5	86	43.00
Fischer Michel	D	0	86	0.00
Lüthi Tobias	D	22.75	86	1'956.50
Meier Lukas	D	0	86	0.00
Moser Tobias	D	0	86	0.00
Meyer Ramona	D	0	86	0.00
Nicolosi Lucia	D	13	86	1'118.00
Schaub Anja	D	0	86	0.00
Schneider Martin	D	0	86	0.00
Nef Regula	D	0	86	0.00
Martin (Weider) Noëlle	D	0	86	0.00
	Total	D	36.25	3'117.50
Schär Cédric	E	0	62	0.00
	Total	E	0	0.00
Boser Florian	F	0	50	0.00
Boschung Jan	F	7.5	50	375.00
Christ Florian	F	0	50	0.00
Karabasoglu Emre	F	0	50	0.00
Schär Raphaël	F	0	50	0.00
Schmidlin Julian	F	0	50	0.00
	Total	F	7.5	375.00
Bätscher Basil	G 1/2	0	4	0.00
Rizzo Arianna	G 1/2	13	4	52.00
Wagner Mika	G 1/2	0	4	0.00
Honegger Mark	G 1/2	0	4	0.00
Zimmermann Alec	G 1/2	0	4	0.00
	Total	G 1/2	13	52.00
Krenger Kyara	G 3/4	0	6	0.00
Weber Fabian	G 3/4	0	6	0.00
Davet Kilian	G 3/4	0	6	0.00
Manz Selena	G 3/4	0	6	0.00
	Total	G 3/4	0	0.00
Gesamttotal		80.25		6'195.50

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.06.2022 bis 30.06.2022

Mandant Name	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	310	MK, FB T-U	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9890 EP RF-BB

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Spieler Daniel	B	15.50	122.00	1'891.00
Martin Dirk	C	6.00	95.00	570.00
Mendoza Maria del Mar	C	2.00	95.00	190.00
Nicolosi Lucia	D	13.00	86.00	1'118.00
Total PLA 310.MK, FB T-U		36.50	103.26	3'769.00

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.06.2022 bis 30.06.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	310	MK, FB T-U	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Dirk Martin

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
310	20.06.2022	JF IG-Besprechung inkl. Vor- und Nachbereitung	1.50
310	21.06.2022	Korreferat UWN MK inkl. Rückmeldung PVU, Abarbeiten der Rückmeldungsliste ASTRA inkl. IG-Bespr. und Zeichnerinstruktion	1.50
310	27.06.2022	IG-Jour-Fix inkl. Vor- und Nachbereitung	1.00
310	29.06.2022	Abklärungen Schnittstellen Kunstbauten	1.00
310	30.06.2022	Anpassung Zäunpläne an Ausfahrt Rampe 400 AS Eiken	1.00
			Subtotal
			6.00

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

C.F.

Datum:

Datum:

01.07.2022

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.06.2022 bis 30.06.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	310	MK, FB T-U	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Maria del Mar Mendoza

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
310	23.06.2022	Überprüfen DN Schmutzwasserleitungen anhand Kanal-TV-Aufnahmen. Teamsbesprechung PV U / PV Bau-BSA, Abstimmung der Abgabedossiers AP/MK	1.50
310	30.06.2022	Teamsbesprechung, EP EHE FRI, PV U / PV Bau-BSA, Abstimmung der Abgabedossiers AP/MK.	0.50
			Subtotal 2.00

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:



 01.07.2022

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.06.2022 bis 30.06.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	310	MK, FB T-U	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Lucia Nicolosi

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
310	10.06.2022	Überarbeiten Lage neue Leitung und Schächte im Bereich SABA Stein. Textergänzungen (Schachtangaben, Leitungsangaben usw.)	2.00
310	14.06.2022	Erstellen neue Layout von 21 Plänen.	6.75
310	15.06.2022	Erstellen neue Layout von 21 Plänen.	3.75
310	21.06.2022	Arbeitsgespräch, Layoutanpassung.	0.50
Subtotal			13.00

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:


 01.07.2022

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.06.2022 bis 30.06.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.E. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	310	MK, FB T-U	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Daniel Spieler

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
310	08.06.2022	Neue Entwässerungsanpassungen für Konzept erstellt im Abgleich zu SABAs Mumpf	3.00
310	09.06.2022	Bearbeitung Vorprüfung MK und IG interne Pendenzenliste, Bearbeitung Grobkonzept auf Basis Rahmenterminprogramm der BHU	2.25
310	10.06.2022	Anpassungen im Inhaltsverzeichnis und auf IG Plattformgeladen, Bearbeitung KV Entwässerung bezüglich Änderung AP SABA Mumpf	1.25
310	14.06.2022	Prüfung inkl. Korrex für Zeichnerin betreff der neuen Standorte der SABA Burgzegli Mumpf, Hueb Mumpf, RS Mumpf Nord und Bahnhof Stein in den Situationen Konzept MK	0.50
310	15.06.2022	Kontrolle inkl. Korrex der Situationen 30-3.1 und 30-3.2	0.50
310	21.06.2022	Prüfen und Korrex für Zeichnerin der Situationspläne MK Entwässerung Konzept 9890/41 bis 9890/52 im speziellen die neuen Standorte SABA und PS-SB als Drittprojekte dargestellt	3.00
310	22.06.2022	Prüfen und Korrex für Zeichnerin der Situationspläne MK Entwässerung Konzept 9890/53 bis 9890/60 im speziellen die Standort der PS-SB als Drittprojekte,	2.50
310	27.06.2022	Prüfung und Korrex Normal- und Querprofile der Pumpleitungen im MK bezüglich den neuen SABA im Abschnitt Mumpf, Kernteamssitzung mit J+S	0.75
310	30.06.2022	Bearbeitung Situationen 1:1000 im Bereich Eiken und Frick bezüglich Drittprojekte und Korrex für Zeichnerin	1.75
Subtotal			15.50

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:





Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	310	MK, FB T-U	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter		Stunden
MD	Dirk Martin	6.00
MeM	Maria del Mar Mendoza	2.00
NL	Lucia Nicolosi	13.00
SD	Daniel Spieler	15.50

Aktivität		Stunden
310	MK, FB T-U	36.50
	Total	36.50

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.06.2022 bis 30.06.2022

Mandant Name	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	320	MK, FB K	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9890 EP RF-BB

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Chrysopoulos Viktoria	D	0.50	86.00	43.00
Lüthi Tobias	D	22.75	86.00	1'956.50
Boschung Jan	F	7.50	50.00	375.00
Rizzo Arianna	G1/2	13.00	4.00	52.00
Total PLA 320.MK, FB K		43.75	55.46	2'426.50

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	320	MK, FB K	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Jan Boschung

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
320	23.06.2022	Anpassung Titelblätter Massnahmen und Schadenspläne	2.00
320	24.06.2022	Anpassung Titelblätter Massnahmen und Schadenspläne	4.00
320	29.06.2022	Anpassungen Synoptischer Plan 552+553 und Anpassungen Massnahmenplan 503 + 504	1.50
Subtotal			7.50

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:


 01.07.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	320	MK, FB K	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Viktoria Chrysopoulos

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
320	23.06.2022	Interne Bespr. Bereinigung MK	0.50
			Subtotal 0.50

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

C. Fuchs

Datum:

Datum:

01.07.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	320	MK, FB K	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Tobias Lüthi

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
320	08.06.2022	Anpassung Projektdokumente TP K gemäss Rückmeldung BHU	4.50
320	09.06.2022	Anpassung Projektdokumente TP K gemäss Rückmeldung BHU	1.00
320	10.06.2022	Anpassung Projektdokumente TP K gemäss Rückmeldung BHU	1.00
320	13.06.2022	Anpassung Dossier MK aufgrund Rückmeldung BHU	1.50
320	14.06.2022	Anpassung Dossier MK aufgrund Rückmeldung BHU	3.50
320	15.06.2022	Anpassung Dossier MK aufgrund Rückmeldung BHU	4.00
320	20.06.2022	Überarbeitung Dossier TP K - interne Abstimmung zum Stand	0.50
320	22.06.2022	Überarbeitung Dossier TP K - Auftrag an Zeichner; Anpassung div. Dokumente	2.00
320	23.06.2022	Anpassung div. Dokumente	1.50
320	27.06.2022	Anpassung Dossier MK aufgrund Rückmeldung BHU und für Abgabe Version 0.9	1.25
320	28.06.2022	Anpassung Dossier MK aufgrund Rückmeldung BHU und für Abgabe Version 0.9	0.75
320	29.06.2022	Anpassung Dossier MK aufgrund Rückmeldung BHU und für Abgabe Version 0.9	1.25
Subtotal			22.75

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

C.F-1

Datum:

Datum:

01.07.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	320	MK, FB K	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Arianna Rizzo

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
320	15.06.2022	Anpassung restl. Pläne Teil Kunstbauten für Abgabe Dossier Vorabzug	8.50
320	16.06.2022	Anpassung restl. Pläne Teil Kunstbauten für Abgabe Dossier Vorabzug	4.50
			Subtotal 13.00

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:



 04.07.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	320	MK, FB K	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter		Stunden
BoJ	Jan Boschung	7.50
ChV	Viktoria Chrysopoulos	0.50
LT	Tobias Lüthi	22.75
RAr	Arianna Rizzo	13.00

Aktivität		Stunden
320	MK, FB K	43.75
	Total	43.75

JAUSLIN STEBLER AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.06.22 bis 30.06.22

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Massnahmenkonzept

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Roth Stefan Name Vorname	A	0	145	0.00
	A	0	145	0.00
	Total A	0		0.00
Forlin Sandro Hartmann Peter Mantinger Michael Methner Raphael	B	0	122	0.00
	B	0	122	0.00
	B	0	122	0.00
	Total B	0		0.00
Brauchli Stefan Grieder Fabio Hunziker Livia Stocker Thomas	C	8.5	95	807.50
	C	21	95	1'995.00
	C	0	95	0.00
	Total C	29.5		2'802.50
Abdelmoghni Ahmed Deck Andreas Dolder Silvio Rothfuss Fabian Haberthür Nicolas Seebacher Andreas Meyer Moritz Nyffenegger Christoph Brunner Andreas Boeglin Chantal	D	12.25	86	1'053.50
	D	0	86	0.00
	D	0	86	0.00
	D	3.5	86	301.00
	D	0	86	0.00
	D	8.5	86	731.00
	D	0	86	0.00
	D	0	86	0.00
	D	0	86	0.00
	Total D	24.25		2'085.50
Müller Jan Brüngger Marco Ladner Roman Russer Elisabeth Wortelboer Alexander	E	0	62	0.00
	E	0	62	0.00
	E	0	62	0.00
	E	0	62	0.00
	Total E	0		0.00
Dogan Esra Köchli Pascal Prescha Deliah	F	0	50	0.00
	F	0	50	0.00
	Total F	0		0.00
Strittmatter Katja (Praktikantin) Möri Anna	G	0	8	0.00
	G	0	8	0.00
	Total G	0		0.00
Aston Tim Gloor Leoni Straub Vanessa Schreiber Severin Hegi Yannick	G3/4	0	6	0.00
	G3/4	0	6	0.00
	G3/4	0	6	0.00
	G3/4	0	6	0.00
	G3/4	11	6	66.00
	Total G	11		66.00
Schneider Anika	G1/2	4.5	4	18.00
	Total G	4.5		18.00
Gesamttotal		69.25		4'972.00

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.06.2022 - 30.06.2022

Projekt-Nr.: 702288.2160
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.: 702288.2160_PH 31 T-G
Bezeichnung **EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-G**

Mitarbeiter **Brauchli Stefan (bsm)** Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
29.06.2022	Anpassung Berichte (Datum, Version, "VORABZUG"), Angabe an Zeichner für Anpassung Titelblatt	4.50
29.06.2022	Obj. N3-360: Trennung Wildschutzzaun und Absturzsicherung => Plananpassung vorbereiten, Bericht, Absprache mit Fachbereich T/U	1.50
30.06.2022	Anpassung Realisierungsdatum in sämtlichen Berichten	2.50
Summe		8.50

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.06.2022 - 30.06.2022

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
	Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
	Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 PL
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) PL

Mitarbeiter **Grieder Fabio (fg)** Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
02.06.2022	Koordination mit Ch. Fuchs betreffend Traktandenentwurf PS Bau 25 und Stand der Arbeiten	1.50
03.06.2022	Kurzabgleich mit C. Fuchs betreffend div. Administratives der IG	0.50
09.06.2022	PS Bau 25 inkl. Vor- und Nachbereitung; Vorinfo an IG aus PS Bau	2.00
10.06.2022	Koordination mit Ch. Fuchs betreffend Output aus PS Bau 25 inkl. aufgleisen nächste Schritte (Info Projektbeteiligte und Ausarbeitung Vorlage Titelblatt)	1.00
17.06.2022	Information Projektbeteiligte betreffend anstehenden Dossierabgaben und Anpassungen Titelblätter	1.00
20.06.2022	Koordination mit Ch. Fuchs betreffend Terminfindung für PL-Abgleich; Information Fachmandate betreffend anstehenden Dossierabgaben und Anpassungen Titelblätter	1.00
21.06.2022	Kurzabgleich mit Ch. Fuchs betreffend Rückmeldung an BHU zu EKP	0.50
23.06.2022	Abgleich mit BHU betreffend LE beim AP Lärm und Schnittstelle zu anderen APs	1.00
Summe		8.50

ARBEITSRAPPORT

**JAUSLIN
STEBLER**

Periode: 01.06.2022 - 30.06.2022

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 T-U
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U

Mitarbeiter **Grieder Fabio (fg)** Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
01.06.2022	Kostengegenüberstellung PA und SDA (Anfrage BHU) inkl. Erstellung Tabelle	1.50
02.06.2022	Fertigstellen Unterlagen Gegenüberstellung SDA/PA-Beläge inkl. Info BHU	1.50
07.06.2022	Koordination intern betreffend Abgleich Dossierüberarbeitung T/U	0.50
08.06.2022	Koordination mit BHU betreffend Thematik Signalisation, Rückmeldungen BSA inkl. anschliessende Absprache mit M. Leipert; Interne Absprache betreffend Überarbeitung MK T/U (Durchsicht Tabelle Stellungnahme) mit A. Seebacher und A. Abdelmoghn	3.00
10.06.2022	Prüfen Anfrage IG betreffend m1 Dossier inkl. zusammenstellen Grundlagen und Erläuterung Schutzbereiche	1.00
16.06.2022	Bilateraler Abgleich IG/PV U betreffend Überarbeitung Dossiers nach Vorprüfung GPL/BHU	1.00
20.06.2022	Abgleich mit A. Seebacher nach Jour Fix T/U (Stand der Arbeiten, offene Fragen, weitere Abklärungen)	1.00
27.06.2022	Jour Fix im Projektteam zur Überarbeitung MK inkl. Nachbereitung	1.00
28.06.2022	Abgleich mit F. Rothfuss betreffend Schnittstelle T/U zu K (Bachdurchlässe und ÖRB)	0.50
29.06.2022	Bereinigung Stellungnahmen aus Vorprüfung BHU/GPL inkl. Textanpassungen im Technischen Bericht	1.50
Summe		12.50



ARBEITSRAPPORT

**J AUSLIN
S STEBLER**

Periode: 01.06.2022 - 30.06.2022

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 T-U
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U

Mitarbeiter **Abdelmoghn Ahmed (aha)** Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
08.06.2022	Interne Besprechung Vernehmlassung	1.25
09.06.2022	Rückmeldung betreffend Grundlagen für Beilage m1 (LeV, SUVA Absände)	1.00
13.06.2022	Besichtigung Rückmeldung Hochspannungs-Freileitung. Untersuchung Kameras Standorte gemäss Rückmeldung GPL-BHU	2.25
14.06.2022	Untersuchung neue Kameras Standorte und Erarbeitung Übersichtstabelle	3.00
20.06.2022	Erarbeitung Rückmeldung BHU im Tech. Bericht. Vorbereitung Aufgaben für Zeichner	2.00
22.06.2022	Besprechung Rückmeldung BHU zu den Plänen mit dem Zeichner.	0.25
23.06.2022	Abklärung Schnittstellen Freileitungen / Kabelleitung. Bespruchung mit AXPO und Besichtigung eingegangene Unterlagen und Rückmeldung an D.Spieler	2.50
Summe		12.25



ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.06.2022 - 30.06.2022

Projekt-Nr.: 702288.2160
Bezeichnung Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.: 702288.2160_PH 31 K
Bezeichnung EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) K

Mitarbeiter Rothfuss Fabian (rfa) Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
17.06.2022	Abklärungen / Rückmeldung Anpassungen Dokumente Teilprojekt K mit INGE Partner	0.50
27.06.2022	Abgleich Pläne TP T/U bzgl. Schnittstellen BDL, Korrespondenz TPL K	1.00
29.06.2022	Klärung Schnittstellen TP T/U und K bzgl. Entwässerung der BDL, Teamsbesprechung INGE Partner Projektänderung Pumpleitungen	2.00
Summe		3.50

ARBEITSRAPPORT

**J AUSLIN
S STEBLER**

Periode: 01.06.2022 - 30.06.2022

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 T-U
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U

Mitarbeiter **Seebacher Andreas (san)** Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
16.06.2022	Plankontrolle S+M alle 8 Pläne inkl. Rückmeldung an Zeichner; Aufzeigen Zeichner neue SABA Mumpf in Grundlagenplan	1.50
20.06.2022	Grundlagenplan: Aufzeigen Zeichner neue Bauwerke SABA; S+M Pläne: Aufzeigen Zeichner Anpassungen aufgrund Rückmeldung GPL BSA; JF INGE intern: Abgabe Dossier Juli 2022; BSA: Aufzeigen Zeichner Anpassungen in BSA Plan als Drittprojekt	3.25
22.06.2022	Versand Grundlagen Plan INGE Partner und QPs/NPs; Vorbereiten Anpassungen Titelblätter A. Schneider	0.75
23.06.2022	Kurzbgleich mit A. Schneider zu Anpassung Titelblätter	0.50
27.06.2022	Abgleich INGE intern zu Schnittstellen AP u. MK inkl. vorbereiten und nachbereiten	1.50
28.06.2022	Koreferat TB BSA; Plankontrolle FBZH alle Signale und nachtragen in TB	1.00
Summe		8.50



ARBEITSRAPPORT

JAUSLIN
STEBLER

Periode: 01.06.2022 - 30.06.2022

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31 T-U
Bezeichnung	EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U

Mitarbeiter **Hegi Yannick (yh)** Kategorie: H Lehrling (3. + 4. LJ)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
20.06.2022	Die neuen Standorte von den SABA's Mumpf in die Grundlagenpläne einarbeiten sowie Anpassungen von san (inhaltliche Anpassungen) in die S+M Pläne einarbeiten	5.50
21.06.2022	Letzte Anpassungen vom Vortag in den S+M Plan einarbeiten (inhaltliche Anpassungen von san), Erstellung von 99_Signalisationsplan für FB BSA und Anpassungen in den LE Plänen (Die SABAs einarbeiten sowie deren Leitungen)	5.50
Summe		11.00



ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.06.2022 - 30.06.2022

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH 31 T-U
Bezeichnung **EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (MK) T-U**

Mitarbeiter **Schneider Anika (sca)** Kategorie: I Lehrling (1. + 2. LJ)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
23.06.2022	Anpassungen an Titelblätter für Abgabe am 12.09.22 bei 25 Plänen	2.00
29.06.2022	Titelblätter in allen MK-TU Plänen anpassen rund 30 Stück	2.50
Summe		4.50



Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)																																																																																																									
Projekt:		N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen																																																																																																							
Vertragnehmer:		INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG																																																																																																							
Vertrag Nr.:		000003																																																																																																							
Vertragsgegenstand:		PV Bau/BSA																																																																																																							
Projektnummer:		090069																																																																																																							
Aktuelles Beobachtungsjahr:		2022																																																																																																							
Beobachtungsmonat (Std. NEU):		Juni																																																																																																							
Aktuelle Stundenausschöpfung (Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategorien gem. Vertrag</th> <th>Std. Dach</th> <th>Std. IST</th> <th>Std. NEU</th> <th>Std. REST</th> <th>Std. Überzug</th> <th>Std. Verbrauch %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>75</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1525</td> <td>1476.75</td> <td>210.5</td> <td></td> <td>162.25</td> <td>111%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2300</td> <td>1422</td> <td>77.75</td> <td>800.25</td> <td></td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>2400</td> <td>2859.5</td> <td>372.75</td> <td></td> <td>832.25</td> <td>135%</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>625</td> <td>507</td> <td>12</td> <td>106</td> <td></td> <td>83%</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>475</td> <td>199.5</td> <td>16</td> <td>259.5</td> <td></td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>550</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>550</td> <td></td> </tr> <tr> <td>G1/2</td> <td></td> <td>822</td> <td>56.5</td> <td></td> <td>878.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>G3/4</td> <td></td> <td>292</td> <td>54</td> <td></td> <td>346</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12.5%/B/C</td> <td>150</td> <td></td> <td></td> <td>150</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25%/B/C</td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Σ</td> <td>8125</td> <td>7578.75</td> <td>799.5</td> <td>1965.75</td> <td>8378.25</td> <td>103%</td> </tr> </tbody> </table>															Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %	A	75				75		B	1525	1476.75	210.5		162.25	111%	C	2300	1422	77.75	800.25		65%	D	2400	2859.5	372.75		832.25	135%	E	625	507	12	106		83%	F	475	199.5	16	259.5		45%	G	550				550		G1/2		822	56.5		878.5		G3/4		292	54		346		12.5%/B/C	150			150			25%/B/C	25			25			Σ	8125	7578.75	799.5	1965.75	8378.25	103%
Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %																																																																																																			
A	75				75																																																																																																				
B	1525	1476.75	210.5		162.25	111%																																																																																																			
C	2300	1422	77.75	800.25		65%																																																																																																			
D	2400	2859.5	372.75		832.25	135%																																																																																																			
E	625	507	12	106		83%																																																																																																			
F	475	199.5	16	259.5		45%																																																																																																			
G	550				550																																																																																																				
G1/2		822	56.5		878.5																																																																																																				
G3/4		292	54		346																																																																																																				
12.5%/B/C	150			150																																																																																																					
25%/B/C	25			25																																																																																																					
Σ	8125	7578.75	799.5	1965.75	8378.25	103%																																																																																																			
Gesamtübersicht in %																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Selbsteinschätzung</th> <th>Kostenausschöpfung</th> <th>Stundenausschöpfung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Selbsteinschätzung</td> <td>95%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kostenausschöpfung</td> <td>97.60%</td> <td>103%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stundenausschöpfung</td> <td></td> <td></td> <td>103%</td> </tr> </tbody> </table>																Selbsteinschätzung	Kostenausschöpfung	Stundenausschöpfung	Selbsteinschätzung	95%			Kostenausschöpfung	97.60%	103%		Stundenausschöpfung			103%																																																																											
	Selbsteinschätzung	Kostenausschöpfung	Stundenausschöpfung																																																																																																						
Selbsteinschätzung	95%																																																																																																								
Kostenausschöpfung	97.60%	103%																																																																																																							
Stundenausschöpfung			103%																																																																																																						
Stundenabrechnung																																																																																																									
Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total																																																																																									
Aegerter & Bosshardt AG																																																																																																									
	Kategorie	A																																																																																																							
	Kategorie	B	657.5	13.75	83.75	42.25	34.75	63	138.5							1033.5																																																																																									
	Kategorie	C	823.5	125.25	226.5	9.75	28	67.75	61.25							1342																																																																																									
	Kategorie	D	1231.75	303.75	231.25	39.75	26	119	264.25							2215.75																																																																																									
	Kategorie	E	39.25													39.25																																																																																									
	Kategorie	F	55	58.25	41.25	1	7.75	36.25	16							215.5																																																																																									
	Kategorie	G																																																																																																							
	Kategorie	G1/2	514	154.75	46.5		26.25	19.75	51							812.25																																																																																									
	Kategorie	G3/4	93.25	7	61.75		34.25	91.75	54							342																																																																																									
Jauslin Stebler AG																																																																																																									
	Kategorie	A																																																																																																							
	Kategorie	B																																																																																																							
	Kategorie	C	34.25	15.25	45	15.75	3	2.25	16.5							132																																																																																									
	Kategorie	D	21.25	17.75	59.5		6.5									98.5																																																																																									
	Kategorie	E														6.5																																																																																									
	Kategorie	F																																																																																																							
	Kategorie	G																																																																																																							
	Kategorie	G1/2	7	13	12.5				5.5							38																																																																																									
	Kategorie	G3/4		4												4																																																																																									
Leipert AG																																																																																																									
	Kategorie	B	100	48.5	53	1		12	33							247.5																																																																																									
	Kategorie	C		8.5												8.5																																																																																									
	Kategorie	D		30	36				23.5							89.5																																																																																									
	Kategorie	E																																																																																																							
	Kategorie	F																																																																																																							
	Kategorie	G																																																																																																							
Holinger AG																																																																																																									
	Kategorie	B	259	17	33.5	18	23.75	16	39							406.25																																																																																									
	Kategorie	C	14.25	3												17.25																																																																																									
	Kategorie	D	506.5	79.25	74.75	10	43.75	29.25	85							828.5																																																																																									
	Kategorie	E	389.5	36.5	35.25				12							473.25																																																																																									
	Kategorie	F																																																																																																							
	Kategorie	G1/2	24.75			3.5										28.25																																																																																									
Total				4779.25	927	1047	141	227.5	457	799.5						8378.25																																																																																									

Kostenabrechnung																
Ansatz		Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00		A														
CHF 122.00		B	124'013	9'669	20'771	7'473	7'137	11'102	25'681							205'845
CHF 95.00		C	83'648	13'633	25'793	2'423	2'945	6'650	7'366							142'476
CHF 86.00		D	151'317	37'045	34'529	4'279	5'999	12'750	32'057							277'974
CHF 62.00		E	26'583	2'263	2'589				744							32'178
CHF 50.00		F	2'750	2'913	2'063	50	388	1'813	800							10775
CHF 8.00		G														
CHF 4.00		G1/2	2'183	671	236	14	105	79	226							3'514
CHF 6.00		G3/4	560	68	371		206	551	324							2'076
CHF 13.56		12.5%/B/C														
CHF 27.13		25%/B/C														
Total			391'052.50	66'258.00	86'349.50	14'237.50	16'778.50	32'943.50	67'217.75							CHF 674'837.25

Aegerter & Bosshardt AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.06.2022 bis 30.06.2022

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP SABA inkl. SABA Mumpf

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
--	A	0	145	0.00
--	A	0	145	0.00
	Total	A	0	0.00
Beck Peter	B	0	122	0.00
Falzone Lorenzo	B	0	122	0.00
Fuchs Christian	B	5.5	122	671.00
Niedermeyer Friederike	B	0	122	0.00
Jung Roman	B	1.75	122	213.50
Ruff Ute	B	0	122	0.00
Schädler Beat	B	0	122	0.00
Spieler Daniel	B	131.25	122	16'012.50
	Total	B	138.5	16'897.00
Kern Etienne	C	0	95	0.00
Martin Dirk	C	57.5	95	5'462.50
Mendoza Maria	C	3.75	95	356.25
Nommay Emmanuelle	C	0	95	0.00
	Total	C	61.25	5'818.75
Enderlen Francis	D	0	86	0.00
Di Maura Miriam	D	0	86	0.00
Di Maria Marcello	D	0	86	0.00
Hardmeyer Christian	D	108.25	86	9'309.50
Iten Vanessa	D	0	86	0.00
Meyer Ramona	D	151.5	86	13'029.00
Nicolosi Lucia	D	4.5	86	387.00
Breiter Michael	D	0	86	0.00
Schaub Anja	D	0	86	0.00
Wira Stephane	D	0	86	0.00
	Total	D	264.25	22'725.50
Schär Cedric	E	0	62	0.00
	Total	E	0	0.00
Boschung Jan	F	16	50	800.00
Christ Florian Michael	F	0	50	0.00
Redlich Moritz	F	0	50	0.00
	Total	F	16	800.00
Bätscher Basil	G 1/2	0	4	0.00
Rizzo Arianna	G 1/2	0	4	0.00
Streiff Timon	G 1/2	51	4	204.00
Zimmermann Alec	G 1/2	0	4	0.00
	Total	G 1/2	51	204.00
Wagner Mika	G 3/4	54	6	324.00
	Total	G 3/4	54	324.00
Gesamttotal		585		46'769.25

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.06.2022 bis 30.06.2022

Mandant Name	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Zeittarif, Offen		
Währung	CHF Switzerland Franc		Honorarklasse	9890 EP RF-BB

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Verkaufspreis
Fuchs Christian	B	5.50	122.00	671.00
Jung Roman	B	1.75	122.00	213.50
Spieler Daniel	B	131.25	122.00	16'012.50
Martin Dirk	C	57.50	95.00	5'462.50
Mendoza Maria del Mar	C	3.75	95.00	356.25
Hardmeyer Christian	D	108.25	86.00	9'309.50
Meyer Ramona	D	151.50	86.00	13'029.00
Nicolosi Lucia	D	4.50	86.00	387.00
Boschung Jan	F	16.00	50.00	800.00
Streiff Timon	G1/2	51.00	4.00	204.00
Wagner Mika	G3/4	54.00	6.00	324.00
Total PLA 420.AP SABA		585.00	79.95	46'769.25

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Jan Boschung

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
420	21.06.2022	Anpassungen gemäss Rückmeldung ASTRA Plan 9890/421-438	4.50
420	22.06.2022	Anpassungen gemäss Rückmeldung ASTRA Plan 9890/421-438	4.00
420	27.06.2022	Anpassungen gemäss Rückmeldung ASTRA Plan 9890/421-438	5.50
420	28.06.2022	Anpassungen gemäss Rückmeldung ASTRA Plan 9890/421-438	2.00
			Subtotal 16.00

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

C. Fuchs
01.07.2022

Datum:

Datum:

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Christian Fuchs

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
420	02.06.2022	Teilnahme an Workshop SABA	1.75
420	08.06.2022	Rückmeldung zu Traktanden PF-S	0.25
420	10.06.2022	Besprechen PS Bau (Aspekte SABA) mit D. Martin	0.25
420	15.06.2022	Vorbereitung der Präsentation für PF-S T/U mit D. Spieler	1.25
420	16.06.2022	Vor- & Nachbereitung der PF-S T/U mit Team SABA	2.00
			Subtotal 5.50

Unterschrift Mitarbeiter:

y

Unterschrift Vorgesetzter:

01.07.2022

Datum:

Datum:

C.F-11

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Christian Hardmeyer

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
420	07.06.2022	Anpassung Situationen 1:200 mit Angaben BSA (Tei1)	9.00
420	08.06.2022	Anpassung Situationen 1:200 mit Angaben BSA (Tei2)	9.00
420	13.06.2022	Anpassen SABAs bei Mumpf. Platzierung Brugzelgli in Parzellenperimeter.	3.50
420	14.06.2022	Anpassen SABAs bei Mumpf. Leitungsanschlüsse, Schachtgrößen, Standorte BSA.	8.50
420	15.06.2022	Anpassen Übersicht 5000er Bereich Mumpf mit Flächendarstellung neue Einzugsgebiete für SABAs.	8.75
420	20.06.2022	Anpassen Legende bei allen 5000er Plne (zuvor Ausschnitt, jetzt neu sep. A4).	4.50
420	21.06.2022	Anpassen 5000er, Einzugsgebiet bei Plan Mumpf.	8.75
420	22.06.2022	Update Pumpwerke/SABAs gem. Korrexxliste ASTRA (200er Pläne; resp 401-418)	9.00
420	23.06.2022	Anpassen 5000er Installationsplätze Bereich Mumpf.	8.50
420	24.06.2022	Anpassen aller 200er PW/SABAs gem. Sichtung SD (Pl. 401-418)	9.25
420	27.06.2022	Anpassen 200er SABA Päne (17 Pläne) mit Angaben zu Entwässerung, BSA und Beschriftung	4.00
420	28.06.2022	Anpassen Pläne MK (Titelblatt: KM, IO-Nr., Hinweis Vorabzug), alle Pl. Gesamtübersicht (6 Pl.), Zäune und FZRS (jeweils 22 Pl.)	9.75
420	29.06.2022	BSA bei RS Mumpf: Ergänzen Ladestationen (Proj. JSAG) sowie Erschließung BSA. Prüfen Rohrdurchmesser und Anzahl Leitungen.	7.75
420	30.06.2022	Anpassungen bei PW AS Frick und Bütilhalde Frick: Jeweils BSA Verlauf und Phase angepasst. Ergänzen Abmessungen BSA Kabinen bei allen Standorten.	8.00

Subtotal 108.25

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:

*C.F-H
01.07.2022*

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.06.2022 bis 30.06.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Roman Jung


Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
420	15.06.2022	SABA / AP:	1.75
<ul style="list-style-type: none"> - Stat. Überprüfung Auftriebssicherheit der folgenden Objekte: <ul style="list-style-type: none"> - SABA Mumpf Nord - SABA Burg-Zelgli - Stat. qualitative Abschätzung Auftriebssicherheit für folgende Objekte: <ul style="list-style-type: none"> - SABA Hueb - SABA Stein 			
			Subtotal 1.75

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:



 01.07.2022

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.06.2022 bis 30.06.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Dirk Martin

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
420	01.06.2022	Umplanung SABA-Mumpf: KV SABA Burgzelgli Vorausmass erstellt, Pläne m-Dokumente Elektrische Anlagen bearbeitet inkl. Zeichnerinstruktion, Überarbeiten der TB Entwässerung, Bearbeiten Inhaltsverzeichnis	9.25
420	02.06.2022	Umplanung SABA-Mumpf: 2. Workshop inkl. Vor- und Nachbereitung, Projektierung SABA Burgzelgli und Hueb Mumpf Stein inkl. Zeichnerinstruktion, Plankorrekturen Situationspläne	4.25
420	03.06.2022	Bearbeitung Stellungnahme PV zu Rückmeldung ASTRA zum Vorabzug AP-SABA, Projektierung SABA Burgzelgli, Hueb und Bhf. Stein, Plankorrekturen Situationspläne, Entwurf-KV abgeschlossen und IG verteilt	5.75
420	07.06.2022	Vorbereitung PFS 16.06.22; Projektierung SABA Burgzelgli, Hueb und Bhf. Stein inkl. Zeichnerinstruktion, Plankorrekturen Situationspläne, Bespr. Geologe zu SABA Burgzelgli; Bearbeiten TB g2	6.25
420	08.06.2022	Einladung und Vorbereitung PFS 16.06.22; Projektierung SABA Burgzelgli, Hueb und Bhf. Stein inkl. Zeichnerinstruktion, Bespr. Plankorrekturen Situationspläne, Rückmeldung PV-U zu UWN, - überarbeiten KV	4.50
420	09.06.2022	Einladung und Vorbereitung PFS 16.06.22; Projektierung SABA Burgzelgli, Hueb und Bhf. Stein inkl. Zeichnerinstruktion, Bespr. PV-U zur Überarbeitung UWN, überarbeiten KV, PS Bau inkl. Vor- und Nachbereitung	7.25
420	10.06.2022	Plankontrolle SABA Burgzelgli, Hueb, RS MUmpf und Bhf. Stein inkl. Zeichnerinstruktion, Bespr. IG zur IO+NPK-Darstellung KV, Vorbereitung PFS T/U, abschliessen TB	5.50
420	20.06.2022	Plankontrollen SABA Burgzelgli, Hueb und Bhf. Stein, Korreferat UWN SABA Rheinfelden +Eiken, Bespr. IG zu BSA-Erschliessung SABA Eiken + Techn. Bericht SABA Mumpf	1.00
420	21.06.2022	Korreferat UWN SABA Rheinfelden und Eiken inkl. Rückmeldung PVU, Abarbeiten der Rückmeldungliste ASTRA inkl. IG-Bespr. und Zeichnerinstruktion	1.75
420	22.06.2022	Planbearbeitung gem. Rückmeldungliste ASTRA inkl. Abklärungen Geologe	1.50
420	23.06.2022	KTS AP-Saba inkl. Vor- und Nachbereitung, Bespr. PV-Umwelt inkl. Vor- und Nachbereitung	2.50
420	24.06.2022	Zusammenstellung Materialmengen für UWN, Plankontrolle AP-SABA RP Mumpf inkl. Zeichnerinstruktion	2.25
420	28.06.2022	Plankontrolle AP-SABA Bahnhof Stein inkl. DAW-Prüfung LSW und Zeichnerinstruktion, Nutzungsvereinbarung überarbeiten	2.50
420	29.06.2022	Projektierung BSA-Erschliessung SABA RS Mumpf Nord inkl. Abklärungen BSA-Planer	1.50
420	30.06.2022	KTS inkl. Vor- und Nachbereitung, Zeichnerinstruktion, Korreferat m-Dok.	1.75
Subtotal			57.50

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:



 01.07.2022


Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Maria del Mar Mendoza

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
420	02.06.2022	AP-SABA, Umplanung SABA Mumpf - 2. Workshop.	3.00
420	23.06.2022	KTS - Umplanung SABA Mumpf.	0.75
			Subtotal 3.75

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:



 01.07.2022

Datum:

Datum:

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Ramona Meyer

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
420	01.06.2022	Erstellung Plan Elektrische Leitungen AXPO und Swissgrid: Erstellung Plan 9890/634 PS-SB Stieracker Frick FBZH (Axpo) Situation und Längenprofil (Schnitt)	9.50
420	02.06.2022	Erstellung Plan Elektrische Leitungen AXPO und Swissgrid: Erstellung Plan 9890/635 PS-SB am KS 292 beim AS Frick (Axpo) Situation und Längenprofil (Schnitt)	9.00
420	07.06.2022	Erstellung Plan Elektrische Leitungen AXPO und Swissgrid: Erstellung Plan 9890/633 PS-SB Neumet Oeschgen FBBS (Axpo) Situation und Längenprofil (Schnitt). Div. Abklärungen	9.00
420	08.06.2022	Erstellung Plan Elektrische Leitungen AXPO und Swissgrid: Erstellung Plan 9890/634 PS-SB Stieracker Frick FBZH (Axpo) Situation und Längenprofil (Schnitt). Div. Abklärungen	9.25
420	09.06.2022	Erstellung Plan Elektrische Leitungen AXPO und Swissgrid: Erstellung Plan 9890/635 PS-SB am KS 292 beim AS Frick (Axpo) Situation und Längenprofil (Schnitt). Div. Abklärungen, Richtlinien, Normen	8.75
420	13.06.2022	Erstellung Plan Elektrische Leitungen AXPO und Swissgrid: Erstellung Plan 9890/636 SABA Rheinfelden Ost (Swissgrid) Situation und Längenprofil (Schnitt). Div. Abklärungen, Richtlinien, Normen	9.00
420	14.06.2022	Erstellung Plan Elektrische Leitungen AXPO und Swissgrid: Erstellung Plan 9890/637 PS-SB Winkel Zeiningen FBBS (Swissgrid) Situation und Längenprofil (Schnitt). Div. Abklärungen, Richtlinien, Normen	9.75
420	15.06.2022	Erstellung Plan Elektrische Leitungen AXPO und Swissgrid: Erstellung Plan 9890/636 SABA Rheinfelden Ost (Swissgrid) Situation und Längenprofil (Schnitt). Div. Abklärungen, Richtlinien, Normen.	9.75
		Erstellung Plan Elektrische Leitungen AXPO und Swissgrid: Erstellung Plan 9890/637 PS-SB Winkel Zeiningen FBBS (Swissgrid) Situation und Längenprofil (Schnitt). Div. Abklärungen, Richtlinien, Normen	
		SABA Hueb Mumpf 9890/425: Anpassungen im Grundriss und Schnitt A-A. Gleichstellung der Grundlagen.	
		SABA Bahnhof Stein Mumpf 9890/427: Anpassungen im Grundriss und Schnitt A-A. Gleichstellung der Grundlagen.	
420	16.06.2022	SABA Hueb Mumpf 9890/425: Anpassungen im Grundriss und Schnitt A-A. Gleichstellung der Grundlagen.	9.50
		SABA Bahnhof Stein Mumpf 9890/427: Anpassungen im Grundriss und Schnitt A-A. Gleichstellung der Grundlagen.	
		Überarbeitung der Titelblätter. Abgleich Plangrundlagen.	
420	20.06.2022	Div. Abklärungen SABA Hueb Mumpf 9890/425: Anpassungen im Grundriss und Schnitt A-A. Gleichstellung der Grundlagen.	8.25
420	21.06.2022	Anpassungen elektrische Leitungen Axpo und Swissgrid Plan 9890-631 bis 9890-637. Überarbeitung der Titelblätter gem. Abgabedossier MK. Abgleich Plangrundlagen.	8.75
420	22.06.2022	Anpassung SABA und Pumpensümpfe (AP): Pläne 9890-421 bis 9890-438. Überarbeitung der Titelblätter gem. Abgabedossier AP Abgleich Plangrundlagen., Ergänzungen. Div. Abklärungen	8.25

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.06.2022 bis 30.06.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Ramona Meyer

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
420	23.06.2022	Anpassungen elektrische Leitungen Axpo und Swissgrid Plan 9890-631 bis 9890-637. Überarbeitung der Titelblätter gem. Abgabedossier MK. Abgleich Plangrundlagen.	8.50
		Anpassung SABA und Pumpensümpfe (AP): Pläne 9890-421 bis 9890-438.	
		Überarbeitung der Titelblätter gem. Abgabedossier AP Abgleich Plangrundlagen., Ergänzungen. Div. Abklärungen	
420	27.06.2022	Anpassung SABA und Pumpensümpfe (AP): Pläne 9890-421 bis 9890-438. Überarbeitung der Titelblätter gem. Abgabedossier AP Abgleich Plangrundlagen., Ergänzungen. Div. Abklärungen	8.75
420	28.06.2022	Anpassung SABA und Pumpensümpfe (AP): Pläne 9890-421 bis 9890-438. Überarbeitung der Titelblätter gem. Abgabedossier AP Abgleich Plangrundlagen., Ergänzungen. Div. Abklärungen	8.25
420	29.06.2022	Anpassung SABA und Pumpensümpfe (AP): Pläne 9890-421 bis 9890-438. Überarbeitung der Titelblätter gem. Abgabedossier AP Abgleich Plangrundlagen., Ergänzungen. Div. Abklärungen	8.75
420	30.06.2022	Anpassungen elektrische Leitungen Axpo und Swissgrid Plan 9890-631 bis 9890-637. Überarbeitung der Titelblätter gem. Abgabedossier MK. Abgleich Plangrundlagen.	8.50

Subtotal 151.50

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:


 01.07.2022

Mitarbeiter / Aktivität / Stunden von 01.06.2022 bis 30.06.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Lucia Nicolosi


Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
420	10.06.2022	Überarbeiten Lage neue Leitung und Schächte im Bereich SABA Stein. Textergänzungen (Schachtangaben, Leitungsangaben usw.)	2.00
420	15.06.2022	Erstellen neue Layout.	2.50
			Subtotal 4.50

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:



 01.07.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Daniel Spieler

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
420	07.06.2022	Bearbeitung m1 Elektrische Leitung, Erstellen Unterlagen für Zeichnerin, Bearbeitung TB SABA Mumpf	9.25
420	08.06.2022	Bearbeitung Einladung für PS Bau und Rücksprache mit D. Martin, Anpassungen der Entwässerungsleitungen für SABA Bahnhof Stein und Besprechung mit Zeichnerin, Überarbeitung und Ergänzungen im Technischer Bericht SABAs Mumpf, Bearbeitung Rückmeldung NSW zur Vorprüfung	5.25
420	09.06.2022	Bearbeitung Technischer bericht SABAs Mumpf Entwässerungskonzept, Kernteamssitzung mit R. Brodmann und F. Hof, Bearbeitung KV für Entwässerungsleitungen für SABA Bahnhof Stein, PS Bau per Teams, Bearbeitung Dokument m1 Elektrische Leitung nach Vorgabe FHB BSA, Bearbeitung Inhaltsverzeichnis im für Bereich SABAs Mumpf	6.75
420	10.06.2022	Fertigstellung TB SABA's Mumpf, Überarbeitung und Dokumentenprüfung Inhaltsverzeichnis AP SABA, Rücksprache mit J+S zum Inhalt Titelblatt, Erstellen PowerPoint Präsentation für PFS, Prüfung mit Korrex der Situationspläne 1:200 SABA's Mumpf	7.75
420	13.06.2022	Bearbeitung vorübergehender Landerwerb für die SABA's Mumpf Skizzen erstellt und an J+S gesendet, Korrex für Situationen 1:200 AP SABA Mumpf für Präsentation PFS vom 16.06.22, Bearbeitung PowerPoint-Präsentation für PFS vom 16.06.22, Bearbeitung KV neue Aufteilung auf IO-Nr. SABA's	7.50
420	14.06.2022	Prüfung Konstruktionspläne SABA Burgzelgli Mumpf, Hueb Mumpf, RS Mumpf Nord und Bahnhof Stein und Korrex für Zeichner, Besprechung mit Zeichner und Rücksprache mit Holinger zu SABA Burgzelgli, Abklärungen mit R. Brodmann bezüglich PowerPoint-Präsentation zu KV und Ablauf PFS, Bearbeitung Übersichtsplan SABA's Mumpf 1:5000 mit neuer Einteilung der EZG für die einzelnen SABA's Skizze in Plan für Zeichner erstellt, Prüfung der Situationen 1:200 SABA Burgzelgli Mumpf, Hueb Mumpf, RS Mumpf Nord und Bahnhof Stein mit Korrex für Zeichner, Besprechung mit Zeichner zu Situationen 1:200	8.75
420	15.06.2022	Kontrolle Konstruktionspläne SABA Burgzelgli Mumpf, Hueb Mumpf, RS Mumpf Nord und Bahnhof Stein, Überprüfung Auftriebsicherheit mit R. Jung, Abklärungen mit PV Umwelt zu Grundwasserzonen für die SABA Burgzelgli Mumpf, Hueb Mumpf, RS Mumpf Nord und Bahnhof Stein, Bearbeitung PowerPoint-Präsentation und Besprechung mit C. Fuchs, Baugrubensicherung mit Nagelwand bei SABA RS Mumpf Nord	8.75
420	16.06.2022	AVOR für PFS, PFS in Zofingen und Besprechung mit PV Umwelt, Überprüfung der GWSP und Felskoten an Hand der Geologischem Berichten von Geotest AG, Bearbeitung SABA Bahnhof Stein und Besprechung Anpassungen mit Zeichner	8.50
420	20.06.2022	Koreferat Umweltberichte und Beilagen, Prüfung und Korrex Pläne SABA Bahnhof Stein und SABA Burgzelgli Mumpf FBBS	9.00
420	21.06.2022	KV AP SABA Entwässerung geprüft und überarbeitet km 21,00 bis km 33,0, SABA Burgzelgli Mumpf, SABA Hueb Mumpf, SABA RS Mumpf Nord und SABA Bahnhof neuen berechnet	6.50
420	22.06.2022	KV AP SABA Entwässerung alle PS-SB geprüft für Abschnitt SABA Rheinfelden, SABA Eiken und Anlagen Frick und Auf IO-Nr. aufgeteilt, Korrex der Situationspläne 1:200 SABA Burgzeltli Mumpf, SABA Hueb Mumpf, SABA RS Mumpf Nord und SABA Bahnhof Stein,	6.00
420	23.06.2022	Prüfung und Korrex der Situationen 1:200 PS-SB für die SABA Rheinfelden und SABA Eiken und Anlagen Frick, Kernteamssitzung (KTS) mit Holinger Umbau SABs Mumpf und weiter Bearbeitung, Projektsitzung mit PV Umwelt, Bearbeitung Installationsplätze IP und neue Flächen bestimmt für PV U, Plankorrex Installationsfächen und Angaben für Zeichner, Besprechung Konstruktionsplan SABA Bahnhof Stein mit Lehrling T. Streif der SABA Bahnhof Stein	8.50
420	24.06.2022	Prüfung und Korrex für Zeichner der Situationen 1:200 PS-SB für Anlagen Frick und Konstruktionspläne SABA Huel Mumpf, alle PS-SB für SABA Eiken und PS-SB Ermitage Rheinfelden und PS-SB Wasserloch Rheinfelden	9.00
420	27.06.2022	Festlegung und Bearbeitung Landerwerb für PSD-SB Dotzmatt Frick und Prüfung der Enteignungspläne für alle PS-SB und Angaben für J+S AG, IG Besprechung mit J+S Jour Fix, Prüfung und Korrex für Zeichnerin der Konstruktionspläne mit Hauptabmessungen PS-SB Winkel Zeiningen und alle PS-SB für Anlagen SABA Frick, Unterlage für PV U Grobterminpan Ausführung 2026 -30	9.25
420	28.06.2022	Abklärungen mit D. Martin betreff bauliche Massnahmen zu den PS-SB Anlage für SABA Frick und Abgabe der Unterlagen an Zeichnerin, Prüfung und Korrex Pläne für Bericht m1 Elektrische Leitungen; Bearbeitung Pendenzentabelle AeBo für PS-SB und SABA, Korrexangaben für Bricht Umwelt an E. Tempesta, Erstellen Bericht m1 Elektrische Leitungen für Swissgird und Axpo, Erstellen Übersichtplan für Bericht m1 gemäss Vorgabe ASTRA FHB BSA	8.00

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Daniel Spieler


Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
420	29.06.2022	Erstellen Bericht m1 "Elektrische Leitungen" zusätzliche für Axpo Standorte und Bearbeitung Bericht m1 nach Vorgabe ASTRA FHB BSA, Prüfung der Pläne für Bericht m1 und Besprechung mit Zeichnerin	7.25
420	30.06.2022	Bericht m1 Elektrische Leitungen erstellt und für Koreferat bereitgestellt, Unterlagen für die Erstellung weiter Längenprofile bereitgestellt und Inhaltsverzeichnis ergänzt, interne KTS mit Holinger (Stand der Arbeiten) per Teams. PS mit PV Umwelt per Teams, Erstellen Unterlagen für PV U Situationen 1:1000 und 1:200 im Abschnitt Frick, Bearbeitung Installationsflächen und Installationsplan für Anlagen Frick und Technischer Bericht Anlagen SABA Frick, Unterlagen zusammengestellt und per Webtransfer an PV U gesendet	5.25
			Subtotal 131.25

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

Datum:



 01.07.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Timon Streiff

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
420	01.06.2022	Erstellen Plan Hauptabmessungen der Kunstbauten für SABA Burgzelgli-Mumpf, Grundrisse und Schnitte und Baugrubensicherung.	8.00
420	02.06.2022	Erstellen Plan Hauptabmessungen der Kunstbauten für SABA Burgzelgli-Mumpf, Grundrisse und Schnitte und Baugrubensicherung.	7.75
420	07.06.2022	Erstellen Plan Hauptabmessungen der Kunstbauten für SABA Burgzelgli-Mumpf, Grundrisse und Schnitte und Baugrubensicherung.	10.50
420	08.06.2022	Erstellen Plan Hauptabmessungen der Kunstbauten für SABA Burgzelgli-Mumpf, Grundrisse und Schnitte und Baugrubensicherung.	4.50
420	09.06.2022	Erstellen Plan Hauptabmessungen der Kunstbauten für Bahnhof Stein, Grundrisse und Schnitte und Baugrubensicherung.	7.75
420	10.06.2022	Erstellen Plan Hauptabmessungen der Kunstbauten für Bahnhof Stein, Grundrisse und Schnitte und Baugrubensicherung.	3.50
420	14.06.2022	Erstellen Plan Hauptabmessungen der Kunstbauten für Bahnhof Stein, Grundrisse und Schnitte und Baugrubensicherung.	9.00

Subtotal 51.00

Unterschrift Mitarbeiter:

Datum: 4.7.22

Unterschrift Vorgesetzter:

Datum:

14.07.2022

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter: Mika Wagner

Aktivität	Datum	Kommentar	Stunde
420	02.06.2022	Bearbeitung PS-SB Hueb Mumpf FBBS (PW 5)	7.75
420	03.06.2022	Bearbeitung PS-SB Bahnhof Stein FBBS (PW 7) und PW 5	8.50
420	07.06.2022	Bearbeitung PS-SB Bahnhof Stein FBBS (PW 7) und PW 5	8.50
420	09.06.2022	Bearbeitung PS-SB Bahnhof Stein FBBS (PW 7) und PW 5	8.00
420	10.06.2022	Bearbeitung PS-SB Bahnhof Stein FBBS (PW 7) und PW 5	8.50
420	21.06.2022	Bearbeitung aller Pumpwerke	8.75
420	24.06.2022	Bearbeitung aller Pumpwerke	4.00
			Subtotal 54.00

Unterschrift Mitarbeiter:

Unterschrift Vorgesetzter:

01.07.2022

Datum:

Datum:

C.F.

Mandant	AeBo	1000		
Abteilung	11006	A.B.BE. Bautenerhalt und Geomatik		
Projekt	BS.N.09890	ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Kt. AG	Projektleiter	Christian Fuchs
PLA	420	AP SABA	PLA Leiter	Christian Fuchs
Typ	aktiv	Kundenprojekt, Aufwand, Offen	Projektleiter Auftraggeber	Nicole Schulz
Währung	CHF Switzerland Franc		Vertragsnummer extern	090069/000003

Mitarbeiter		Stunden
BoJ	Jan Boschung	16.00
FCh	Christian Fuchs	5.50
Har	Christian Hardmeyer	108.25
JR	Roman Jung	1.75
MD	Dirk Martin	57.50
MeM	Maria del Mar Mendoza	3.75
MeR	Ramona Meyer	151.50
NL	Lucia Nicolosi	4.50
SD	Daniel Spieler	131.25
StT	Timon Streiff	51.00
WMi	Mika Wagner	54.00

Aktivität		Stunden
420	AP SABA	585.00
	Total	585.00

JAUSLIN STEBLER AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.06.22 bis 30.06.22

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP SABA inkl. SABA Mumpf

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Roth Stefan	A	0	145	0.00
Total		0		0.00
Forlin Sandro	B	0	122	0.00
Hartmann Peter		0	122	0.00
Mantinger Michael		0	122	0.00
Methner Raphael		0	122	0.00
Total		0		0.00
Brauchli Stefan	C	0	95	0.00
Grieder Fabio		5.5	95	522.50
Hunziker Livia		11	95	1'045.00
Stocker Thomas		0	95	0.00
Total		16.5		1'567.50
Deck Andreas	D	0	86	0.00
Dolder Silvio		0	86	0.00
Rothfuss Fabian		0	86	0.00
Haberthür Nicolas		0	86	0.00
Seebacher Andreas		0	86	0.00
Meyer Moritz		0	86	0.00
Nyffenegger Christoph		0	86	0.00
Brunner Andreas		0	86	0.00
Boeglin Chantal		0	86	0.00
Total		0		0.00
Müller Jan	E	0	62	0.00
Brüngger Marco		0	62	0.00
Ladner Roman		0	62	0.00
Russer Elisabeth		0	62	0.00
Wortelboer Alexander		0	62	0.00
Total		0		0.00
Dogan Esra	F	0	50	0.00
Prescha Deliah		0	50	0.00
Total		0		0.00
Strittmatter Katja (Praktikantin)	G	0	8	0.00
Möri Anna		0	8	0.00
Total		0		0.00
Aston Tim	G3/4	0	6	0.00
Gloor Leoni		0	6	0.00
Straub Vanessa		0	6	0.00
Schreiber Severin		0	6	0.00
Hegi Yannick		0	6	0.00
Total		0		0.00
Schneider Anika	G1/2	5.5	4	22.00
Total		5.5		22.00
Gesamttotal		22		1'589.50

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.06.2022 - 30.06.2022

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH 31_AP SABA
Bezeichnung **AP SABA**

Mitarbeiter **Grieder Fabio (fg)** Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
13.06.2022	Koordination betreffend aktuellen Grundlagenplänen inkl. Info Projektteam für Thematik LE	1.00
24.06.2022	Koordination innerhalb IG betreffend angepassten LE-Kosten inkl. Abgleich mit L. Hunziker betreffend Stand der Arbeiten	1.00
27.06.2022	Koordination mit L. Hunziker betreffend Thema Landerwerb inkl. Abgleich mit IG betreffend aktuellsten Plangrundlagen	1.00
28.06.2022	Koordination mit L. Hunziker betreffend aktuellem Stand Arbeiten zum LE inkl. Klärung offene Fragen	1.50
29.06.2022	Abgleich mit A. Schneider betreffend Enteignungspläne SABA inkl. Unterstützung	1.00
Summe		5.50

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.06.2022 - 30.06.2022

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH 31_AP SABA
Bezeichnung **AP SABA**

Mitarbeiter **Hunziker Livia (Lgr)** Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
14.06.2022	Rückmeldungen überprüfen und Unterlagen für Zeichner bereitstellen	2.00
27.06.2022	Besprechung mit F. Grieder betreffen Kosten SABAs inkl div. Abklärungen, Rückmeldungen GPL und BHU einarbeiten	1.50
28.06.2022	Zeichnerkoordination/interne Besprechung mit Anika Schneider betreffend Einarbeitung Rückmeldungen AEBO und GPL/BHU, Anpassung resp. neue Pläne für SABA Mumpf vorbereiten für A. Schneider, interne Besprechung mit F. Grieder betreffend SABA Mumpf div. Unterlagen ergänzen gem. Rückmeldung GPL, E-Mail an Bruno Morgenthaler	7.50
Summe		11.00

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.06.2022 - 30.06.2022

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH 31_AP SABA
Bezeichnung **AP SABA**


Mitarbeiter **Schneider Anika (sca)** Kategorie: I Lehrling (1. + 2. LJ)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
28.06.2022	Interne Besprechung mit L. Hunziker betreffend Einarbeitung Rückmeldungen AEBO und GPL/BHU, Anpassung resp. neue Pläne für SABA Mumpf erstellen, Anpassungsarbeiten gemäss AEBO und GPL/BHU für SABA Pläne Rheinfelden, Frick und Eiken	2.50
29.06.2022	Anpassungsarbeiten an SABA Plänen gemäß AEBO und GPL/BHU an Rheinfelden, Frick und Eiken	1.50
30.06.2022	Anpassungen einarbeiten von AEBO und GPL/BHU für Rheinfelden Frick Pläne und Beginn der Anpassungen an allen Titelblättern	1.50
Summe		5.50

Leipert AG**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.06.2022 bis 30.06.2022****Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP SABA**

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Name Vorname	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
	Total	A	0	0.00
Leipert Markus	B	33	122	4'026.00
Herzog Stefan	B	0	122	0.00
Riderle Timo	B	0	122	0.00
	Total	B	33	4'026.00
Weisskopf Silvan	C	0	95	0.00
Hofer Michael	C	0	95	0.00
Lazzarato Roberto	C	0	95	0.00
	Total	C	0	0.00
Gassmann Silvia	D	0	86	0.00
Hofer Michael	D	23.5	86	2'021.00
	Total	D	23.5	2'021.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
	Total	E	0	0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
	Total	F	0	0.00
Gesamttotal		56.5		6'047.00

Tag	Stunden 100%	Zuschlag 25%	Zuschlag 50%	Tätigkeitsbeschrieb
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27	3.50			Sichten Unterlagen zur Anpassung der Prinzipie E, S, DI, VTV / Aufarbeiten für Bearbeitung Prinzipie und Synoptik im Folgetagern
28	4.50			Bearbeitung der bestehenden Prinzipipläne Visio: Energie, 9 Stück
39	7.00			Weiterführen der Arbeiten vom Vortag, inkl. hinzuzufügen neue VTV / Sichten und Aufarbeiten Vorgaben für Komm. LT's und Perlketten
30	8.50			Bearbeiten der Prinzipipläne: Perlkette (ASO-Switchs), Leittechnik Divers / Rev. Prinzipie Energie Farbbegebung / Beginn Anpassung Prinzipi LT-S
Total	23.50	0.00	0.00	

Name: Hofer	Vorname: Michael	Monat: Juni	Jahr: 2022	Kategorie: D	Kostentart: 1.3100
Auftraggeber: INGE EP RF BB	Auftragsnummer: 327.1	Vertrag Nr.: N03, EP Rheinfelden Frick, Phase AP SABA	Auftragsnummer extern:		

Tag	Stunden 100%	Zuschlag 25%	Zuschlag 50%	Tätigkeitsbeschrieb
1	0.50			Mail und Abkl. betr. Sitzung zu Rückmeldungen zur Stellungnahme
2	6.00			Besprechung betr. die Rückmeldungen zur Stellungnahme und notwendigen Anpassungen am AP, Änderungen infolge Anpassungen SABA Mumpf, Bearb. Notizen, etc.
3	2.50			Durchsicht bereinigte Rückmeldeliste, Zusammenstellen weitere Ergänzungen im AP, Bearbeitung Unterlagen
4	2.50			Angaben betr. zus. Kabine an G, Bearbeiten Unterlagen für AP, Durchsicht neue Unterlagen SABA's Mumpf
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11	3.00			Durchsicht Rückmeldungen, Hinweise in Bericht für Anpassungen und Ergänzungen
12				
13	3.50			Bespr. der Bemerkungen zum AP, Bearbeitung der Notizen
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22	2.00			Prüfen und Ergänzen Energieversorgungsprinzip mit Anpassungen SABA's Mumpf, Farocode für Zeichner etc.
23				
24				
25	6.50			Ergänzen der EV-Prinzipschema mit Farocode, zus. Kameras und Anpassungen PW, Bearbeitung MK / AP mit Ergänzungen
26				
27				
28				
29	4.00			Ergänzen div. Prinzipschema gem. Rückmeldungen, Anpassung Kostentabelle AP
30	2.50			Kosten AP überarbeitet, teil. Abkl. mit Hollinger, Interne Abkl. betr. Ergänzungen Prinzipschema
Total	33.00	0.00	0.00	
				Kategorie: B
Leipert	Markus		Juni	2022
Auftraggeber:	INGE EP RF BB			
Auftragsnummer:	327.1			
Bezeichnung:	N03, EP Rheinfelden Frick, Phase AP SABA			
	H.H.W.			

HOLINGER AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.06.2022 bis 30.06.2022

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP SABA inkl. SABA Mumpf

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Name Vorname	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Brodmann René	B	39	122	4'758.00
Name Vorname	B	0	122	0.00
Total	B	39		4'758.00
Wyrsch Vera	C	0	95	0.00
Heizmann Dominik	C	0	95	0.00
Pflugi Matthias	C	0	95	0.00
Schwab Alexander	C	0	95	0.00
Total	C	0		0.00
Wiss Lukas	D	0.5	86	43.00
Hof Fabian	D	75	86	6'450.00
Peier Reto	D	0	86	0.00
Schneider Tanja	D	9.5	86	817.00
Schill Jasmin	D	0	86	0.00
Total	D	85		7'310.00
Häfelfinger Sarah	E	0	62	0.00
Schlumpf Oliver	E	0	62	0.00
Gerber Joel	E	12	62	744.00
Ammann Carmen	E	0	62	0.00
Total	E	12		744.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Poggiali Marisa	G1/2	0	4	0.00
Reimann Lea	G1/2	0	4	0.00
Trinh Cherry	G1/2	0	4	0.00
Total	G1/2	0		0.00
Gesamttotal		136		12'812.00

Detailrapport
L3612.001 Rheinfelden-Frick, N3 EP PV SABA
Juni 2022

HOLINGER AG

Datum	Text	Anzahl Std.	Visum PL	Visum SB
01.06.2022	int. Fachbespr HFA	0.50		
02.06.2022	Workshop IG bzgl SABA Mumpf + AP Bereinigung, Fachbespr FOF	4.50		
03.06.2022	Fachbespr Hof	0.50		
07.06.2022	Tel D. Martin, Traktanden PFS, Mail Leiperet Kabin SABA Eiken	1.50		
08.06.2022	Mails Traktanden, Mail Kosten Mumpf, Fachbespr intern HFA	1.50		
09.06.2022	KTS mit AeBo, Kostenkontrolle, Nutzene Aufwand Quotient	2.00		
10.06.2022	Fachbespr HFA	0.50		
13.06.2022	PS BSA Team Besprechung, Bereiniguzng Stellungnahmen	3.50		
14.06.2022	Tel Spieler, Fachbespr Hof	2.00		
15.06.2022	Anpass Folien PFS, Kosten Kontrolle + Koord .	3.00		
16.06.2022	PFS Zufingen, Fachbespr Hof, Koordination Restarbeiten, Termine	4.00		
17.06.2022	Fachbespr Hof, Mail Spieler,	2.00		
20.06.2022	Fachbespr Hof, Tabelle Stellungnahme abarbeiten	2.50		
21.06.2022	Fachbespr Hof	1.50		
23.06.2022	KTS mit AeBo, Fachbespr HOOf, Teams mit PV Uwmelt, Mail Unterlagen an PV Umwelt	3.00		
24.06.2022	Fachbespr HOF bzgl Kosten, Pläne etc.	1.50		
29.06.2022	Koord der Restarbeiten bis zur Abgabe AP	1.50		
30.06.2022	Teal KTS, Team Umweltnotuiz, Fachbespr Nerichet mit HOF, Mails tel	3.50		
	37. Brodmann René	<u>39.00</u>	<u>Bm</u>	<u>Bm</u>
23.06.2022	Anpassungen gem Rückmeldung Planauflage, SABA Rheinfelden und SABA Frick	6.00		
24.06.2022	Besprechung inputs/Probleme mit HFA, anpassungen gem. Besprechung SABA Frick	6.00		
	78. Gerber Joel	<u>12.00</u>	<u>in</u>	<u>OB</u>
28.06.2022	Anpassungen Entwässerungskonzept	4.50		
29.06.2022	Anpassungen Entwässerungskonzept	5.00		
	201. Schneider Tanja	<u>9.50</u>	<u>un</u>	<u>IPBm</u>
23.06.2022	Auswertung EZG-Flächen	0.50		
	8638. Wiss Lukas	<u>0.50</u>	<u>un</u>	<u>IPBm</u>
01.06.2022	Nutzungsvereinbarung+Technischer Bericht SABA + Entwässerung	4.50		
02.06.2022	Besprechung Stand der Arbeiten, Techn. Berichte	3.00		
03.06.2022	Abklärungen Ex-Zone, Zusammenstellung KV, Korrekturen AP SABA	3.00		
07.06.2022	Anpassungen R+I Schema, diverse Korrekturen AP SABA	4.00		
07.06.2022	Besprechung SABA Mumpf D.Martin	1.50		
08.06.2022	Korrekturen AP SABA, Zusammenstellung Kosten	4.00		
09.06.2022	KTS, Kosten-Nutzen-Quotient	2.50		
10.06.2022	Besprechung KV+FZRS Eiken	2.00		
14.06.2022	Besprechung SABA Burgzelgli, Anpassungen R+I	1.00		
15.06.2022	Abklärungen Kosten SABAs Mumpf	1.00		
16.06.2022	Techn. Bericht	1.00		
17.06.2022	diverse Anpassungen Stellungnahme AP SABA umsetzen, R+I Schema	6.00		
20.06.2022	Projektbesprechung D.Martin	0.50		
20.06.2022	diverse Anpassungen Stellungnahme AP SABA umsetzen	3.50		
20.06.2022	Projektbesprechung R.Brodmann	1.00		
21.06.2022	Plankorrekturen, Anpassungen Berichte, R+I	3.50		
22.06.2022	Besprechung D.Spieler, Anpassungung R+I, Bericht, Telefon L.Stadelmann	3.50		
24.06.2022	Anpassungen R+I	3.00		
24.06.2022	Zusammenstellung Kosten	7.00		
27.06.2022	Anpassungen R+I, Kontrolle Anlageschema Eiken	3.50		

Detailrapport
L3612.001 Rheinfelden-Frick, N3 EP PV SABA
Juni 2022

HOLINGER AG


28.06.2022	Entwässerungskonzept anpassen, Zusammenstellung Kosten, Kontr. Bericht Baugrube	3.00
29.06.2022	Dokumente für Abgabe zusammenstellen, Nutzungsvereinbarung	4.00
30.06.2022	KTS, Anpassungen Berichte, Kosten zusammenstellen	9.00
	10077. Hof Fabian	75.00
	Total L3612.001 Rheinfelden-Frick, N3 EP PV SABA	136.00

m HFA



Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt:	N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen		
Vertragnehmer:	INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG	Vertragsdatum:	14.11.2018
Vertrag Nr.:	000003	Vertragslaufzeit:	31.12.2022
Vertragsgegenstand:	PV Bau/BSA	Finanzierungskonto:	Unterhalt
Projektnummer:	090069	Inventarobjekt:	FUP.2
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2022	Phasen, beauftragt:	AP Bypass
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Juni	Phasen, rapportiert:	AP Bypass

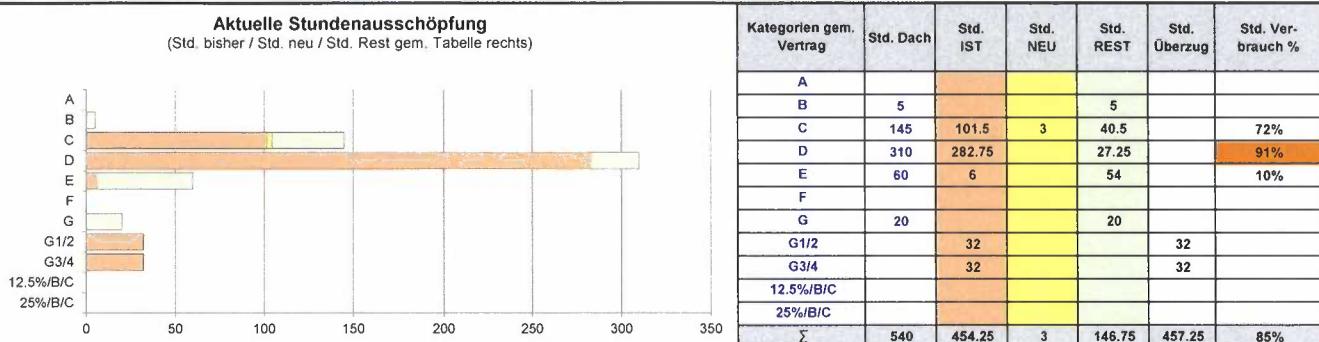

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer	Selbsteinschätzung	96%
rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)		
Kostendach	CHF 44'925.00	
Kosten ist	CHF 34'936	
Kostenausschöpfung	77.77%	
Stundenausschöpfung	85%	

Stundenabrechnung																
Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG		A														
		B														
		C														
		D														
		E														
		F														
		G														
		G1/2														
		G3/4														
Jauslin Stebler AG		A														
		B														
		C	71.25	9	21.25					3					104.5	
		D	166.5	54.5	61.75										282.75	
		E	5		1										6	
		F														
		G														
		G1/2	12.5	5	14.5										32	
		G3/4	28.5		3.5										32	
Leipert AG		B														
		C														
		D														
		E														
		F														
Holinger AG		B														
		C														
		D														
		E														
		F														
		G1/2														
Total			283.75	68.5	102					3					457.25	

Kostenabrechnung															
Ansatz (exkl. MwSt. inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A														
CHF 122.00	B														
CHF 95.00	C	6769	855	2019				285							9'928
CHF 86.00	D	14'319	4'687	5'311											24'317
CHF 62.00	E	310		62											372
CHF 50.00	F														
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2	50	20	58											128
CHF 6.00	G3/4	171		21											192
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		21'618.75	5'562.00	7'470.25				285.00							CHF 34'936.00

JAUSLIN STEBLER AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.06.22 bis 30.06.22

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP Bypass

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Roth Stefan	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
	Total	A	0	0.00
Forlin Sandro	B	0	122	0.00
Hartmann Peter	B	0	122	0.00
Mantinger Michael	B	0	122	0.00
Methner Raphael	B	0	122	0.00
	Total	B	0	0.00
Brauchli Stefan	C	0	95	0.00
Grieder Fabio	C	2.5	95	237.50
Hunziker Livia	C	0.5	95	47.50
Name Vorname	C	0	95	0.00
	Total	C	3	285.00
Abdelmoghnii Ahmed	D	0	86	0.00
Deck Andreas	D	0	86	0.00
Dolder Silvio	D	0	86	0.00
Rothfuss Fabian	D	0	86	0.00
Seebacher Andreas	D	0	86	0.00
Meyer Moritz	D	0	86	0.00
Nyffenegger Christoph	D	0	86	0.00
Brunner Andreas	D	0	86	0.00
Boeglin Chantal	D	0	86	0.00
	Total	D	0	0.00
Müller Jan	E	0	62	0.00
Brüngger Marco	E	0	62	0.00
Ladner Roman	E	0	62	0.00
Russer Elisabeth	E	0	62	0.00
Wortelboer Alexander	E	0	62	0.00
	Total	E	0	0.00
Dogan Esra	F	0	50	0.00
Prescha Deliah	F	0	50	0.00
	Total	F	0	0.00
Strittmatter Katja (Praktikantin)	G	0	8	0.00
Möri Anna	G	0	8	0.00
	Total	G	0	0.00
Aston Tim	G3/4	0	6	0.00
Straub Vanessa	G3/4	0	6	0.00
Hegi Yannick	G3/4	0	6	0.00
Schneider Anika	G1/2	0	4	0.00
	Total	G	0	0.00
Gesamttotal		3		285.00

ARBEITSRAPPORT

**JAUSLIN
STEBLER**

Periode: 01.06.2022 - 30.06.2022

Projekt-Nr.:	702288.0	
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069	
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS	
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass	
Mitarbeiter	Grieder Fabio (fg)	Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)
Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
13.06.2022	Durchsicht Tabelle Stellungnahme GPL inkl. Info Projektteam	1.00
17.06.2022	Besprechung Stellungnahmen GPL aus Vorprüfung mit L. Hunziker und definieren Dossierüberarbeitung	1.00
21.06.2022	Rückmeldung an PV U betreffend Anpassungen UWN und m-Dossiers)	0.50
Summe		2.50



ARBEITSRAPPORT

JAUSLIN
STEBLER

Periode: 01.06.2022 - 30.06.2022

Projekt-Nr.:	702288.0	
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069	
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS	
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass	
Mitarbeiter	Hunziker Livia (Lgr)	Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)
Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
24.06.2022	Technischer Bericht und Kosten sowie TB anpassen	0.50
Summe		0.50






Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt:	N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen	Vertragsdatum:	14.11.2018
Vertragnehmer:	INGE EP RF BB, c/o Aegeuter & Bosshardt AG	Vertragslaufzeit:	31.12.2022
Vertrag Nr.:	000003	Finanzierungskonto:	Unterhalt
Vertragsgegenstand:	PV Bau/BSA	Inventarobjekt:	FUP.2
Projektnummer:	090069	Phasen, beauftragt:	AP Installationen
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2022	Phasen, rapportiert:	AP Installationen
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Juni		

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

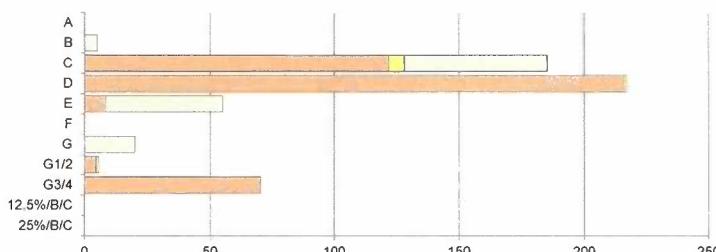

Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B	5				5	
C	185	122	6.25	56.75		69%
D	155	216	1		62	140%
E	55	8.25		46.75		15%
F	20					
G				20		
G1/2		4.5	1		5.5	
G3/4		70.25			70.25	
12.5%/B/C						
25%/B/C						
Σ	420	421	8.25	128.5	429.25	102%

Gesamtübersicht in %



quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung 97%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach CHF 35'085.00

Kosten ist CHF 31'801

Kostenausschöpfung 90.64%

Stundenausschöpfung 102%

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegeuter & Bosshardt AG		Kategorie A														
		Kategorie B														
		Kategorie C														
		Kategorie D														
		Kategorie E														
		Kategorie F														
		Kategorie G														
		Kategorie G1/2														
		Kategorie G3/4														
Jauslin Stebler AG		Kategorie A														
		Kategorie B														
		Kategorie C	83	17.75	21.25				6.25							128.25
		Kategorie D	105.75	63.25	47				1							217
		Kategorie E	3		5.25											8.25
		Kategorie F														
		Kategorie G														
		Kategorie G1/2	2	1.5	1				1							5.5
		Kategorie G3/4	24	19.25	27											70.25
Leipert AG		Kategorie B														
		Kategorie C														
		Kategorie D														
		Kategorie E														
		Kategorie F														
Holinger AG		Kategorie B														
		Kategorie C														
		Kategorie D														
		Kategorie E														
		Kategorie F														
		Kategorie G1/2														
Total				217.75	101.75	101.5				8.25						429.25

Kostenabrechnung

Ansatz (excl. MWSt, inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A														
CHF 122.00	B														
CHF 95.00	C	7'885	1'686	2'019				594							12'184
CHF 86.00	D	9'095	5'440	4'042				86							18'862
CHF 62.00	E	186		326											512
CHF 50.00	F														
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2	8	6	4				4							22
CHF 6.00	G3/4	144	116	162											422
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		17'317.60	7'247.25	6'552.25				683.75							CHF 31'800.75

JAUSLIN STEBLER AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.06.22 bis 30.06.22

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, Installationen

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Roth Stefan	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
	Total	A	0	0.00
Forlin Sandro	B	0	122	0.00
Hartmann Peter	B	0	122	0.00
Mantinger Michael	B	0	122	0.00
Methner Raphael	B	0	122	0.00
	Total	B	0	0.00
Brauchli Stefan	C	0	95	0.00
Grieder Fabio	C	1.5	95	142.50
Hunziker Livia	C	4.75	95	451.25
Stocker Thomas	C	0	95	0.00
	Total	C	6.25	593.75
Abdelmoghn Ahmed	D	1	86	86.00
Deck Andreas	D	0	86	0.00
Dolder Silvio	D	0	86	0.00
Rothfuss Fabian	D	0	86	0.00
Haberthür Nicolas	D	0	86	0.00
Seebacher Andreas	D	0	86	0.00
Meyer Moritz	D	0	86	0.00
Nyffenegger Christoph	D	0	86	0.00
Brunner Andreas	D	0	86	0.00
Boeglin Chantal	D	0	86	0.00
	Total	D	1	86.00
Müller Jan	E	0	62	0.00
Brüngger Marco	E	0	62	0.00
Ladner Roman	E	0	62	0.00
Russer Elisabeth	E	0	62	0.00
Wortelboer Alexander	E	0	62	0.00
	Total	E	0	0.00
Dogan Esra	F	0	50	0.00
Prescha Deliah	F	0	50	0.00
	Total	F	0	0.00
Strittmatter Katja (Praktikantin)	G	0	8	0.00
Möri Anna	G	0	8	0.00
	Total	G	0	0.00
Schneider Anika	G1/2	1	4	4.00
Aston Tim	G3/4	0	6	0.00
Gloor Leoni	G3/4	0	6	0.00
Straub Vanessa	G3/4	0	6	0.00
Schreiber Severin	G3/4	0	6	0.00
Hegi Yannick	G3/4	0	6	0.00
	Total	G	1	4.00
Gesamttotal		8.25		683.75

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.06.2022 - 30.06.2022

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
	Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
	Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung	Installationensflächen und Landerwerb

Mitarbeiter **Grieder Fabio (fg)** Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
17.06.2022	Besprechung Stellungnahmen GPL aus Vorprüfung mit L. Hunziker und definieren Dossierüberarbeitung	1.00
21.06.2022	Rückmeldung an PV U betreffend Anpassungen UWN und m-Dossiers)	0.50
Summe		1.50

ARBEITSRAPPORT

JAUSLIN
STEBLER

Periode: 01.06.2022 - 30.06.2022

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung	Installationensflächen und Landerwerb

Mitarbeiter **Hunziker Livia (Lgr)** Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
14.06.2022	Rückmeldungen überprüfen und Unterlagen für Zeichner bereitstellen	0.50
17.06.2022	Besprechung Stellungnahme mit F. Grieder	1.25
27.06.2022	Rückmeldungen GPL und BHU in den Unterlagen ergänzen, TB anpassen, Pläne für Zeichnerin vorbereiten	1.50
28.06.2022	Ergänzungen gem. Rückmeldung BHU/GPL für Zeichner vorbereiten	1.50
Summe		4.75

ARBEITSRAPPORT

JAUSLIN
STEBLER

Periode: 01.06.2022 - 30.06.2022

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung **Installationensflächen und Landerwerb**

Mitarbeiter **Abdelmoghni Ahmed (aha)** Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
20.06.2022	Abgleich Beilage m1 mit AXPO-Pläne. Vorbereitung Aufgabe für Zeichner	1.00
Summe		1.00



ARBEITSRAPPORT

JAUSLIN
STEBLER

Periode: 01.06.2022 - 30.06.2022

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH31_AP_IF + LE
Bezeichnung **Installationensflächen und Landerwerb**

Mitarbeiter **Schneider Anika (sca)** Kategorie: I Lehrling (1. + 2. LJ)


Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
30.06.2022	Bemerkungen von Lgr einarbeiten an Installationsplänen (Situation, Enteignungspläne)	1.00
Summe		1.00




Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt: N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmaßnahmen
Vertragnehmer: INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau/BSA
Projektnummer: 090069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2022
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Juni

Vertragsdatum:	14.11.2018
Vertragslaufzeit:	31.12.2022
Finanzierungskonto:	Unterhalt
Ventarobjekt:	FUP.2
Hasen, beauftragt:	GHGW
Hasen, rapportiert:	GHGW

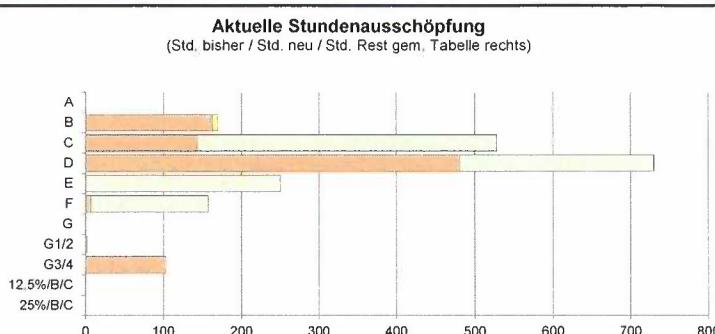

Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Ver- brauch %
A						
B	130	163.25	6.5		39.75	131%
C	528	144		384		27%
D	730	481		249		66%
E	250			250		
F	158	6.5		151.5		4%
G						
G1/2		2			2	
G3/4		103.25			103.25	
12.5%/B/C						
25%/B/C						
-						



quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer	Selbsteinschätzung	86%
rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)		
Kostendach	CHF 152'200.00	
Kosten ist		CHF 76'708
Kostenauflösung	50.40%	
Stundenausschöpfung		50%

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG		Kategorie A														
		Kategorie B	2													2
		Kategorie C	7.25													7.25
		Kategorie D	20	17.75												37.75
		Kategorie E														
		Kategorie F														
		Kategorie G														
		Kategorie G1/2														
		Kategorie G3/4														
Jauslin Stebler AG		Kategorie A														
		Kategorie B	0.25													0.25
		Kategorie C	124	8.75												132.75
		Kategorie D	282.75	124.5	29.25											436.5
		Kategorie E														
		Kategorie F	6.5													6.5
		Kategorie G														
		Kategorie G1/2				2										2
		Kategorie G3/4	56.75	46.5												103.25
Leipert AG		Kategorie B	60	48.5	28		11	13.5	6.5							167.5
		Kategorie C		4												4
		Kategorie D			6.75											6.75
		Kategorie E														
		Kategorie F														
Holinger AG		Kategorie B														
		Kategorie C														
		Kategorie D														
		Kategorie E														
		Kategorie F														
		Kategorie G1/2														
Total				559.5	250	66		11	13.5	6.5						906.5

Kostenabrechnung

Leipert AG**Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.06.2022 bis 30.06.2022****Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, GHGW**

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Name Vorname	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
	Total	A	0	0.00
Leipert Markus	B	6.5	122	793.00
Herzog Stefan	B	0	122	0.00
Riderle Timo	B	0	122	0.00
	Total	B	6.5	793.00
Weisskopf Silvan	C	0	95	0.00
Hofer Michael	C	0	95	0.00
Lazzarato Roberto	C	0	95	0.00
	Total	C	0	0.00
Gassmann Silvia	D	0	86	0.00
Hofer Michael	D	0	86	0.00
	Total	D	0	0.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
Name Vorname	E	0	62	0.00
	Total	E	0	0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
Name Vorname	F	0	50	0.00
	Total	F	0	0.00
Gesamtotal		6.5		793.00

Tag	Stunden	Zuschlag 100%	Zuschlag 25%	Zuschlag 50%	Tätigkeitsbeschrieb
1					
2					
3	1.00				Abkl. betr. Pendenz Signalisationsplan mit JS, Bearbeitung Unterlagen MK
4					
5					
6					
7					
8	0.50				tel. Austausch mit JS betr. weiterem Vorgehen Signalisationspläne
9					
10					
11					
12					Durchsicht zus. Bedarf VTV, Hinweise in MK ergänzt, Rückmeldung betr. Rückmeldung Fut zu MK durchgesehen, Weiterleitung Info an IG, Auswirkungen auf Trasse
13	1.00				
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20	2.00				Prüfen / Eintragen neue VTV-Standorte betr. Installations- und LWL-Erschließung, Prüfung Verschiebung VDE im Bereich Eiken
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30	2.00				Abkl. betr. Anpassungen Signalisationsplan und VTV-Standorte mit JS, Prüfen der erarbeiteten Unterlagen, tel. Abkl. hierzu
Total	6.50	0.00	0.00	0.00	

Name: Leipert	Vorname: Markus	Monat: Juni	Jahr: 2022	Kategorie: B	Kostenart: 1.3100
INGE EP RF BB					
Auftraggeber:					
Auftragsnummer: 327.2					
Bezeichnung: N03, EP Rheinfelden Frick, GHGW (MK)					

Vertrag Nr.:
Auftragsnummer:
Auftragsnummer extern:


Herr W.



Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt:	N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen	Vertragsdatum:	14.11.2018
Vertragnehmer:	INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG	Vertragslaufzeit:	31.12.2022
Vertrag Nr.:	000003	Finanzierungskonto:	Unterhalt
Vertragsgegenstand:	PV Bau/BSA	Inventarobjekt:	FUP.2
Projektnummer:	090069	Phasen, beauftragt:	Option Lärm
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2022	Phasen, rapportiert:	Option Lärm
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Juni		

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)

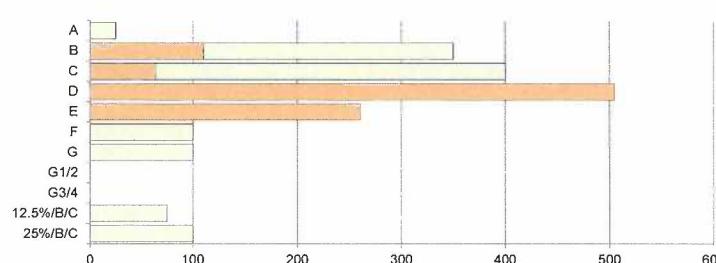

Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A	25			25		
B	350	110		240		31%
C	400	63	1	336		16%
D	450	504.75		54.75	112%	
E	125	261.25		136.25	209%	
F	100			100		
G	100			100		
G1/2						
G3/4						
12.5%/B/C	75			75		
25%/B/C	100			100		
Σ	1725	939	1	976	940	54%

Gesamtübersicht in %



quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung 80%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach CHF 140'304.69

Kosten ist CHF 79'106

Kostenausschöpfung 56.38%

Stundenausschöpfung 54%

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG		A														
		B														
		C														
		D														
		E														
		F														
		G														
		G1/2														
		G3/4														
Jauslin Stebler AG		A														
		B	110													110
		C	63							1						64
		D	504.75													504.75
		E	261.25													261.25
Leipert AG		B														
		C														
		D														
		E														
		F														
Holinger AG		B														
		C														
		D														
		E														
		F														
Total			939							1						940

Kostenabrechnung

Ansa	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A														
CHF 122.00	B	13'420													13'420
CHF 95.00	C	5'985													6'080
CHF 86.00	D	43'409													43'409
CHF 62.00	E	16'198													16'198
CHF 50.00	F														
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2														
CHF 6.00	G3/4														
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total		79'011.00													CHF 79'106.00

JAUSLIN STEBLER AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.06.22 bis 30.06.22

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP Lärm

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Roth Stefan	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
	Total	A	0	0.00
Forlin Sandro	B	0	122	0.00
Hartmann Peter	B	0	122	0.00
Mantinger Michael	B	0	122	0.00
Methner Raphael	B	0	122	0.00
	Total	B	0	0.00
Brauchli Stefan	C	0	95	0.00
Grieder Fabio	C	1	95	95.00
Hunziker Livia	C	0	95	0.00
Name Vorname	C	0	95	0.00
	Total	C	1	95.00
Abdelmoghni Ahmed	D	0	86	0.00
Deck Andreas	D	0	86	0.00
Rothfuss Fabian	D	0	86	0.00
Seebacher Andreas	D	0	86	0.00
Meyer Moritz	D	0	86	0.00
Nyffenegger Christoph	D	0	86	0.00
Brunner Andreas	D	0	86	0.00
Boeglin Chantal	D	0	86	0.00
	Total	D	0	0.00
Müller Jan	E	0	62	0.00
Brüngger Marco	E	0	62	0.00
Ladner Roman	E	0	62	0.00
Russer Elisabeth	E	0	62	0.00
Wortelboer Alexander	E	0	62	0.00
	Total	E	0	0.00
Dogan Esra	F	0	50	0.00
Prescha Deliah	F	0	50	0.00
	Total	F	0	0.00
Strittmatter Katja (Praktikantin)	G	0	8	0.00
Möri Anna	G	0	8	0.00
	Total	G	0	0.00
Straub Vanessa	G3/4	0	6	0.00
Hegi Yannick	G1/2	0	4	0.00
	Total	G	0	0.00
Gesamttotal		1		95.00

ARBEITSRAPPORT

JAUSLIN
STEBLER

Periode: 01.06.2022 - 30.06.2022

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.: 702288.0_PH 31 AP LSP
Bezeichnung **EP N03 Rheinfelden - Frick, 090069, Phase 31 (AP LSP)**

Mitarbeiter **Grieder Fabio (fg)** Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
28.06.2022	Sichtung Rückmeldung FU (Gut zum Druck) inkl. Zuweisung pro Fachplaner und Info Projektteam, Klärung einiger Details mit BHU	1.00

Summe

1.00


Erhaltungsprojekt N03 Rheinfelden-Frick, PV Bau / BSA

Mitarbeiterliste

Name/Vorname	Jg.	Berufsausbildung	Diplom	Zusatzausbildung	Diplom	Bisherige Praxis	Diplom	Bisherige Praxis	Anzahl	Funktion in der Firma	Stand per 01.06.2022
		Titel, Ausbildung, Hochschule, Technikum, Berufsfachre, Anlehnre	Lehrabschluss (Jahr)	Titel, Ausbildung, Hochschule, Technikum, Berufsfachre, Anlehnre	(Jahr)	mit Angaben des Fachgebietes	(Jahr)	mit Angaben des Fachgebietes	Jahre	im Rahmen des Auftrages	Hon-Kat:
Schädel Beat	1958	Dip. Bauing. ETH	1983			Bautenhalt (Autobahnen, Tunneln, Brücken), Gesamtleitungen, Grossprojekte Verkehr, Informatik	1999	Konstr. Ing.-Bau, Tiefbau, Bahnbau	39	Chief-Ingenieur	B
Zenners Guy	1961	Dip. Bauing. TH Karlsruhe	1987			Bautenhalt (Autobahnen, Tunneln, Brücken), Gesamtleitungen, Grossprojekte Verkehr, Informatik	2001	Bautenhalt, Tiefbau, Kanalisationen	35	Experte Verkehr	A
Suter Thomas	1967	Dip. Bauing. ETH	1992	dipl. Wirtschaftsing. FH		Tiefbau, Verkehr	1999	Konstr. Ing.-Bau, Tiefbau, Bahnbau	30	Spezialist	B
Falzone Lorenzo	1976	Dip. Bauing. TU Mailand	2001			Bautenhalt, Tiefbau, Kanalisationen	2001	Bautenhalt, Projektbauten, Projektteilier	21	TPL Kunstbauten, Trasse	B
Spießer Daniel	1957	Dip. Bauing. HTL	1984			Tiefbau, Verkehr	2001	FBL Erhaltung Infrastrukturlanlagen, Projektleiter Siv. Bl. Bauernhalt & Geomatik, FBL Erhaltung Infrastrukturlanlagen, Projektleiter	38	TPL Trasse	B
Fuchs Christian	1969	Dip. Bauing. TH Kaiserslautern	1998			Bautenhalt, Tiefbau	2001	FBL Erhaltung Infrastrukturlanlagen, Projektleiter Siv. Bl Bauernhalt & Geomatik, FBL Erhaltung Infrastrukturlanlagen, Projektleiter	24	Projektleiter	B
Häner David	1974	Dip. Bauing. ETH	2001			Projektingenieur, Hochbau, Brückenebau Bereich Lärm, Luft, Umwelt	2001	Projektleiter/Bauingenieur Diplomgeologie, Projektleiter Lärmschutz	21	Ingenieur	B
Rey Lionel	1975	Diplomgeologe, D.E.S. Umweltinaturwissenschaften	2001			Erdbebensicherheit, Konstr. Ing.-Bau Konstr. Ing.-Bau, Prüfingenieur Vermessung, GIS	2001	FBL Erdbebensicherheit, Projektleiter Prüf. u. Kontrollingenieurwesen, Projektleiter FBL Geomatik u. Vermessung, Projektleiter	51	Spezialist Lärm	B
Weber Madeleine	1976	Dip. Bauing. ETH	2001			Erdbebensicherheit, Konstr. Ing.-Bau Konstr. Ing.-Bau, Strassenbau	2002	PL Umwelt und GIS	36	Ingenieur	C
Yelman Mahir	1947	Dip. Bauing. FH Konstanz	1971			Konstr. Ing.-Bau, Prüfingenieur Vermessung, GIS	2002	FBL Geografische Informationssysteme (GIS), Geoinformatik MS-Access	30	Spezialist Vermessung	B
Beck Peter	1960	Dipl. Vermessungsing. HTL	1986			Konstr. Ing.-Bau, Strassenbau	2002	Projektleiter	28	Spezialist UBB	B
Niedermeyer Friederike	1962	Dipl.-Biologin Univ. München	1992	UNIGIS professional		Umwelt, GIS	2002	FBL Trassierungen, Projektleiter	26	Spezialist Trassierung	B
Kern Elienne	1968	Dip. Bauing. TU Paris	1994			Bauleitung, Umbau, Sanierung	2002	FBL Geografische Informationssysteme (GIS), Projektleitern	24	Spezialist Umwelt	B
Ruff Ute	1967	Dipl. Geökologin Univ. Braunschweig	1996	MAS of advanced (GIS)		Konstr. Ing.-Bau, Sanierung	2009	Projekt- und Bauleiter	24	Fachingenieur Trasse	C
Martin Dirk	1972	Dip. Bauing. FH Leipzig	1998			Konstr. Ingenieurbau	2009	Stv. BL Projektmanagement & Generalplanung	14	Ingenieur	C
Wieland Manuel	1983	Dip. Bauing. FH Karlsruhe	2008	M. Eng./M. of Business Adm. 20		Bauleitung, Umbau, Sanierung	2009	Bauingenieur	11	Ingenieur	C
Brem Jakob	1985	Dip. Bauing. FH/BSc FHNW	2011			Konstr. Ingenieurbau	2009	Geomatik-/Umwelt ingenieur	21	Ingenieur	C
Chroust Steffi	1976	Dip. Ing. FH in Geomatik FHNW	2001	Dipl. Umwelteng. NDS FH		Umwelt, GIS	2009	Bauingenieur	17	Ingenieur	C
Mendoza María	1981	Dip. Bauing. FHNW	2005			Bauleitung, Umbau, Sanierung	2009	Geomatik-/Umwelt ingenieur	13	Fachingenieur Trasse	B
Jung Roman	1984	Dip. Bauing. FH/BSc FHNW	2009			Konstr. Ingenieurbau	2009	Bauingenieur	12	Ingenieur	B
Nonnay Emmanuelle	1986	Dip. Bauing. ETH ZH	2010			Bauleitung, Umbau, Sanierung	2009	Bauingenieur	5	Fachingenieur Trasse	x
Lüthi Tobias	1990	Dipl. Bauing ETH ZH	2017			Konstr. Ingenieurbau	2009	Bauingenieur	3	Ingenieur	D
Meier Lukas	1991	Dipl. Bauing. M/Sc ETH ZH	2019			Bauleitung, Umbau, Sanierung	2009	Bauingenieur	3	Ingenieur	D
Moser Tobias	1989	Dip. Bauing. FH/BSc FHNW	2020			Konstr. Ingenieurbau	2009	Bauingenieur	2	Ingenieur	D
Chrysopoulos Viktoria	1996	Infrastrukturmanagement B.Eng.	2019			Konstr. Ingenieurbau	2009	Ingenieur	3	Ingenieur	D
Schneider Martin	1958	Vermessungszeichner	1980			Konstr. Ingenieurbau	2009	Vermesser	42	Vermesser	D
Büchler Kevin	1992	Dip. Bauing. FH/BSc FHNW	2018			Konstr. Ingenieurbau	2009	Bauingenieur	4	Bauingenieur	D
Schmidlin Julian	1995	Zeichner EFZ	2016			Konstr. Ingenieurbau	2009	Bauingenieur	1	Ingenieur	D
Di Maria Marcello	1961	Tiefbauzzeichner	1985			Konstr. Ingenieurbau	2009	Zeichner-Konstrukteur	37	Zeichner-Konstrukteur	D
Nicolosi Lucia	1968	Tiefbauzzeichnerin	1989			Konstr. Ingenieurbau	2009	Konstrukteurin	33	Konstrukteurin	D

Erhaltungsprojekt N03 Rheinfelden-Frick, PV Bau / BSA

Mitarbeiterliste

Name/Vorname	Jg.	Berufsausbildung	Diplom	Zusatzausbildung	Diplom	Bisherige Praxis	Diplom	Bisherige Fachgebiete	Anzahl Jahre	Funktion in der Firma	Vorgesetzte Funktion	Hon-Kat.	Stand per 01.06.2022
Hardmeyer Christian	1970	Tiefbauzeichner	1991							31 Zeichner-Konstrukteur	BL = Bereichsleiter FBL = Fachbereichsleiter SB = Sachbearbeiter	D	Ergänzung/ Änderung per 01.06.2022
Wira Stephane	1970	Tiefbauzeichner	1992							30 Zeichner-Konstrukteur		D	
Enderlein Francis	1973	BTS Bauzeichner	1994							28 Bauzeichner		D	
Delmas Marc	1982	Bauzeichner	2002							20 Zeichner-Konstrukteur		D	
Schaub Anja	1982	Bauzeichnerin	2007							15 Zeichner-Konstrukteurin/Sachbearbeiterin GIS		D	
Di Mauro Miriam	1979	Bauzeichnerin	1999							23 Bauzeichnerin		D	
Meyer Ramona	1983	Vermessungstechnikerin	2003							19 Zeichner-Konstrukteurn		D	
Breiter Michael	1987	Bauzeichner	2008							14 Zeichner-Konstrukteur		D	
Schär Cedric	1992	Bauzeichner	2013							9 Bauzeichner		E	
Boschung Jan	1996	Bauzeichner	2016							6 Bauzeichner		F	
Hirsbrunner Nico	1999	Zeichner EFZ	2019							3 Bauzeichner		F	
Christ Florian	1998	Zeichner EFZ	2019							3 Bauzeichner		F	
Leuch Georges	1996	Zeichner EFZ	2019							3 Bauzeichner		F	
Boser Florian	2000	Zeichner EFZ	2020							2 Bauzeichner		F	
Beutel Agnès	1996	KV-Abschluss	1985							37 Bereichsassistentin, SB Projektmanagement		D	
Nef Regula	1963	Detailhandelskauffrau	1983							39 Bereichsassistentin, SB Projektmanagement		D	
Martin Nölle	1970	BTS Direktionssekretärin	1990							32 Bereichsassistentin, SB Projektmanagement		D	
Fischer Michel	1976	Planer Marketingkommunikation	2002							20 Marketing		D	
Eilers Brigitte	1961	Reprographin	1980							42 Reprographin		E	
Barth Sandra	1969	Verkaufslehre	1988							34 Reprographin		E	
Schär Raphael	1994	BSc Bauingenieur ETH								Praktikant		F	
Wyrsch Joël	2000	Student								Praktikant Geomatik		F	
Karabasoglu Emre	1998	Student								Praktikant		F	
Redlich Moritz	1996									Praktikant		F	
Zenners Patrick	1997	Student								Praktikant		F	
Tesan Laila	2000	Zeichnerin EFZ							1 Bauzeichnerin		F		
Weber Fabian	2002	Zeichner EFZ							4. Lehrjahr		3/4G		
Krenger Kyara	2003	Zeichner EFZ							3. Lehrjahr		1/2G		
Bätscher Basil	2004	Zeichner EFZ							2. Lehrjahr		1/2G		
Zimmermann Alec	2005	Zeichner EFZ							2. Lehrjahr		1/2 G		
Honegger Marc	2004	Zeichner EFZ							3. Lehrjahr		3/4G		
Wagner Milka	2003	Zeichner EFZ							1. Lehrjahr		1/2G		
Rizzo Arianna	2005	Zeichnerin EFZ							1. Lehrjahr		1/2G		
Streiff Timon	2006	Zeichner EFZ											

Schlüsselpersonen sind fett markiert

Neu aufgenommene Mitarbeiter

Kategoriewechsel
