

JAUSLIN STEBLER AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.07.21 bis 31.07.21

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP Bypass

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Roth Stefan	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Forlin Sandro	B	0	122	0.00
Hartmann Peter	B	0	122	0.00
Mantinger Michael	B	0	122	0.00
Methner Raphael	B	0	122	0.00
Total	B	0		0.00
Brauchli Stefan	C	0	95	0.00
Grieder Fabio	C	4.5	95	427.50
Hunziker Livia	C	0	95	0.00
Name Vorname	C	0	95	0.00
Total	C	4.5		427.50
Abdelmoghni Ahmed	D	0	86	0.00
Deck Andreas	D	20.5	86	1'763.00
Rothfuss Fabian	D	0	86	0.00
Seebacher Andreas	D	0	86	0.00
Meyer Moritz	D	0	86	0.00
Nyffenegger Christoph	D	0	86	0.00
Brunner Andreas	D	0	86	0.00
Boeglin Chantal	D	0	86	0.00
Total	D	20.5		1'763.00
Müller Jan	E	0	62	0.00
Brüngger Marco	E	0	62	0.00
Ladner Roman	E	0	62	0.00
Russer Elisabeth	E	0	62	0.00
Wortelboer Alexander	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Dogan Esra	F	0	50	0.00
Prescha Deliah	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Strittmatter Katja (Praktikantin)	G	0	8	0.00
Möri Anna	G	0	8	0.00
Total	G	0		0.00
Straub Vanessa	G3/4	0	6	0.00
Hegi Yannick	G1/2	0	4	0.00
Total	G	0		0.00
Gesamttotal		25		2'190.50

ARBEITSRAPPORT

JAUSLIN
STEBLER

Periode: 01.07.2021 - 31.07.2021

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass

Mitarbeiter	Grieder Fabio (fg)	Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)
Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
06.07.2021	Kurzbesprechung mit A. Deck betreffend Übersicht Flächenbedarf für PFS T/U 11	0.50
14.07.2021	Information PV Vermessung betreffend neuem Teilprojekt Bypass und Auftrag Aufwandschätzung	1.00
19.07.2021	Konzeptionelle Überlegungen für Varianten inkl. Besprechung mit A. Deck	0.50
20.07.2021	Durchsicht Varianten mit A. Deck inkl. div. Ergänzungen	0.50
21.07.2021	Besprechung Variantenfächer mit A. Deck	0.50
29.07.2021	Koordination mit M. Meer betreffend Typ Dossier für Bypass	0.50
30.07.2021	Abgleich mit BHU betreffend Koordination mit FU; Information VI inkl. Auftrag zu weiteren Angaben betreffend Ausgestaltung seitens Verkehr	1.00
Summe		4.50



ARBEITSRAPPORT

**J AUSLIN
S STEBLER**

Periode: 01.07.2021 - 31.07.2021

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass

Mitarbeiter **Deck Andreas (dea)** Kategorie: D264 Zeichner Konstrukteur,
Bauleiter


Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
06.07.2021	Besprechung intern / Erstellen 1. Grobentwurf Geometrie Bypass	1.00
07.07.2021	Erstellen Übersichten / Landwererb und Schnitte für Präsentation	2.00
19.07.2021	Besprechung intern (F. Grieder / Ideensammlung) // Aufbereiten Grundlagen / Erstellen Schleppkurven für div. Varianten	4.50
20.07.2021	Erstellen Varianten 01-05 inkl. Schleppkurven und Sichtweitenprüfung	7.50
21.07.2021	Erstellen Variante 06 / Erstellen Schnitte Varianten 01-06 / Layout und Export	4.00
30.07.2021	Bearbeitung Vermessungsdaten AS Frick Kreisel West	1.50
Summe		20.50





Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt:	N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmaßnahmen	Vertragsdatum:	14.11.2018
Vertragnehmer:	INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG	Vertragslaufzeit:	31.12.2022
Vertrag Nr.:	000003	Finanzierungskonto:	Unterhalt
Vertragsgegenstand:	PV Bau/BSA	Inventarobjekt:	FUP.2
Projektnummer:	090069	Phasen, beauftragt:	AP Bypass
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2021	Phasen, rapportiert:	AP Bypass
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	August		

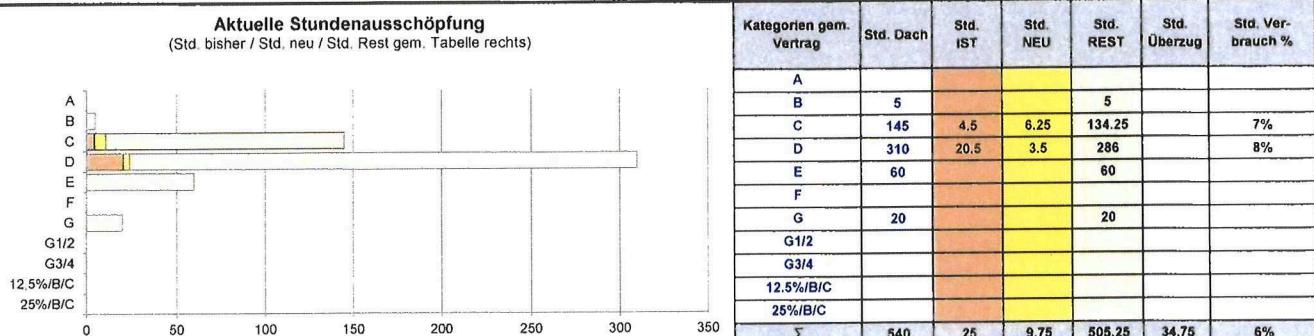

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer	
Selbsteinschätzung	6%
rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)	
Kostendach	CHF 44'925.00
Kosten ist	CHF 3'085
Kostenausschöpfung	6.87%
Stundenausschöpfung	6%

Stundenabrechnung																
Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG		Kategorie A														
		Kategorie B														
		Kategorie C														
		Kategorie D														
		Kategorie E														
		Kategorie F														
		Kategorie G														
		Kategorie G1/2														
		Kategorie G3/4														
Jauslin Stebler AG		Kategorie A														
		Kategorie B														
		Kategorie C								4.5	6.25					10.75
		Kategorie D							20.5	3.5						24
		Kategorie E														
		Kategorie F														
		Kategorie G														
		Kategorie G1/2														
		Kategorie G3/4														
Leipert AG		Kategorie B														
		Kategorie C														
		Kategorie D														
		Kategorie E														
		Kategorie F														
Holinger AG		Kategorie B														
		Kategorie C														
		Kategorie D														
		Kategorie E														
		Kategorie F														
		Kategorie G1/2														
Total									25	9.75						34.75

Kostenabrechnung																
Ansatz (exkl. MWSt, inkl. 6% Rrofit)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total	
CHF 145.00	A															
CHF 122.00	B															
CHF 95.00	C									428	594					1'021
CHF 86.00	D								1'763	301						2'084
CHF 62.00	E															
CHF 50.00	F															
CHF 8.00	G															
CHF 4.00	G1/2															
CHF 6.00	G3/4															
CHF 13.56	12.5%/B/C															
CHF 27.13	25%/B/C															
Total									2'190.50	894.75						CHF 3'085.25

JAUSLIN STEBLER AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.08.21 bis 31.08.21

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP Bypass

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Roth Stefan	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Forlin Sandro	B	0	122	0.00
Hartmann Peter	B	0	122	0.00
Mantinger Michael	B	0	122	0.00
Methner Raphael	B	0	122	0.00
Total	B	0		0.00
Brauchli Stefan	C	0	95	0.00
Grieder Fabio	C	6.25	95	593.75
Hunziker Livia	C	0	95	0.00
Name Vorname	C	0	95	0.00
Total	C	6.25		593.75
Abdelmoghi Ahmed	D	0	86	0.00
Deck Andreas	D	3.5	86	301.00
Rothfuss Fabian	D	0	86	0.00
Seebacher Andreas	D	0	86	0.00
Meyer Moritz	D	0	86	0.00
Nyffenegger Christoph	D	0	86	0.00
Brunner Andreas	D	0	86	0.00
Boeglin Chantal	D	0	86	0.00
Total	D	3.5		301.00
Müller Jan	E	0	62	0.00
Brüngger Marco	E	0	62	0.00
Ladner Roman	E	0	62	0.00
Russer Elisabeth	E	0	62	0.00
Wortelboer Alexander	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Dogan Esra	F	0	50	0.00
Prescha Deliah	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Strittmatter Katja (Praktikantin)	G	0	8	0.00
Möri Anna	G	0	8	0.00
Total	G	0		0.00
Straub Vanessa	G3/4	0	6	0.00
Hegi Yannick	G1/2	0	4	0.00
Total	G	0		0.00
Gesamttotal		9.75		894.75

ARBEITSRAPPORT

J AUSLIN
S STEBLER

Periode: 01.08.2021 - 31.08.2021

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass

Mitarbeiter **Grieder Fabio (fg)** Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
16.08.2021	PS Bau 18 - Ergänzung Traktandenentwurf inkl. Abgleich mit BHU	1.00
20.08.2021	Kurzbesprechung mit A. Deck betreffend Qualität der ergänzenden Vermessungsaufnahmen	1.50
23.08.2021	PS Bau inkl. Vor- und Nachbereitung	1.50
25.08.2021	Vorbereitung KoSi inkl. Sichtung Faktenblatt PV Verkehr	0.50
26.08.2021	KoSi mit PV Verkehr betreffend Prüfung Variantenstudium inkl. Nachbereitung	1.00
27.08.2021	Koordination mit GPL betreffend Unterlagen für Abklärungen mit Filialjurist inkl. Zusammenstellung	0.75
Summe		6.25



ARBEITSRAPPORT

J AUSLIN
S STEBLER

Periode: 01.08.2021 - 31.08.2021

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass

Mitarbeiter **Deck Andreas (dea)** Kategorie: D264 Zeichner Konstrukteur,
Bauleiter

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
16.08.2021	Besprechung intern / Vorprüfung Vermessungsdaten	0.50
20.08.2021	Besprechung intern (F. Grieder) Einarbeiten Vermessungsgrundlagen AS Frick Bypass (2dr)	3.00
Summe		3.50






Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)


Projekt:	N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen	Vertragsdatum:	14.11.2018
Vertragnehmer:	INGE EP RF BB, c/o Aegeuter & Bosshardt AG	Vertragslaufzeit:	31.12.2022
Vertrag Nr.:	000003	Finanzierungskonto:	Unterhalt
Vertragsgegenstand:	PV Bau/BSA	Inventarobjekt:	FUP.2
Projektnummer:	090069	Phasen, beauftragt:	AP Bypass
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2021	Phasen, rapportiert:	AP Bypass
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	September		

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B	5				5	
C	145	10.75	15	119.25		18%
D	310	24	12	274		12%
E	60			60		
F						
G	20			20		
G1/2						
G3/4			7	7		
12.5%/B/C						
25%/B/C						
Σ	540	34.75	34	478.25	68.75	13%

Gesamtübersicht in %



quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer

Selbsteinschätzung 13%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)

Kostendach CHF 44'925.00

Kosten ist CHF 5'584

Kostenausschöpfung 12.43%

Stundenausschöpfung 13%

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegeuter & Bosshardt AG		Kategorie A														
		Kategorie B														
		Kategorie C														
		Kategorie D														
		Kategorie E														
		Kategorie F														
		Kategorie G														
		Kategorie G1/2														
		Kategorie G3/4														
Jauslin Siebler AG		Kategorie A														
		Kategorie B														
		Kategorie C								4.5	6.25	15				25.75
		Kategorie D							20.5	3.5	12					36
		Kategorie E														
		Kategorie F														
		Kategorie G														
		Kategorie G1/2														
		Kategorie G3/4										7				7
Leipert AG		Kategorie B														
		Kategorie C														
		Kategorie D														
		Kategorie E														
		Kategorie F														
Holinger AG		Kategorie B														
		Kategorie C														
		Kategorie D														
		Kategorie E														
		Kategorie F														
		Kategorie G1/2														
Total												25	9.75	34		68.75

Kostenabrechnung

Ansatz (excl. MWSt., incl. 3% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A														
CHF 122.00	B														
CHF 95.00	C														2'446
CHF 86.00	D														3'098
CHF 62.00	E														
CHF 50.00	F														
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2														
CHF 6.00	G3/4														42
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														42
Total															CHF 5'584.25

JAUSLIN STEBLER AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.09.21 bis 30.09.21

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP Bypass

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Roth Stefan	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Forlin Sandro	B	0	122	0.00
Hartmann Peter	B	0	122	0.00
Mantinger Michael	B	0	122	0.00
Methner Raphael	B	0	122	0.00
Total	B	0		0.00
Brauchli Stefan	C	0	95	0.00
Grieder Fabio	C	15	95	1'425.00
Hunziker Livia	C	0	95	0.00
Name Vorname	C	0	95	0.00
Total	C	15		1'425.00
Abdelmoghnii Ahmed	D	0	86	0.00
Deck Andreas	D	12	86	1'032.00
Rothfuss Fabian	D	0	86	0.00
Seebacher Andreas	D	0	86	0.00
Meyer Moritz	D	0	86	0.00
Nyffenegger Christoph	D	0	86	0.00
Brunner Andreas	D	0	86	0.00
Boeglin Chantal	D	0	86	0.00
Total	D	12		1'032.00
Müller Jan	E	0	62	0.00
Brüngger Marco	E	0	62	0.00
Ladner Roman	E	0	62	0.00
Russer Elisabeth	E	0	62	0.00
Wortelboer Alexander	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Dogan Esra	F	0	50	0.00
Prescha Deliah	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Strittmatter Katja (Praktikantin)	G	0	8	0.00
Möri Anna	G	0	8	0.00
Total	G	0		0.00
Straub Vanessa	G3/4	0	6	0.00
Hegi Yannick	G3/4	7	6	42.00
Total	G	7		42.00
Gesamttotal		34		2'499.00

ARBEITSRAPPORT

JASLIN
STEBLER

Periode: 01.09.2021 - 30.09.2021

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass

Mitarbeiter **Grieder Fabio (fg)** Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
03.09.2021	Abgleich mit A. Deck betreffend Anpassungen "Bestvarianten" 2a und 2b inkl. definieren weiteres Vorgehen	1.00
07.09.2021	Abgleich mit PV Umwelt betreffend Dossierinhalt und weiteres Vorgehen	0.50
08.09.2021	Besprechung mit A. Deck betreffend überarbeiteten Varianten (2a und 2b) inkl. zusammenstellen Unterlagen für PS Bau 19	1.00
09.09.2021	Durchsicht Varianten mit A. Deck inkl. neuer QPs, Kontrolle Kombi-Variante	0.50
16.09.2021	PS Bau 19 (Teil Bypass) inkl. Vorbereitung	2.00
20.09.2021	PFS T/U 12 - Vorbereiten und zusammenstellen Unterlagen für Sitzungseinladung (Ergänzungen Textbausteine "Fakten zu Varianten" und Anpassungen Schnitte)	1.00
21.09.2021	PFS T/U 12 - Vorbereiten Präsentation (Zusammenfassung seit letzter Sitzung), Bewertung verfeinerte Varianten aus baulicher Sicht	2.50
22.09.2021	Koordination mit Y. Hegi betreffend Kontrolle Werkleitungen Dritter im Bereich Kreisel	0.50
23.09.2021	PFS T/U 12 - Erstellung PPT (Kurzhistorie, Zusammenfassung Erkenntnisse VI, Abklärungen mit Jurist); Koordination mit D. Spieler betreffend Entwässerungskataster Bereich Bypass	2.00
24.09.2021	Prüfung Schnittstelle zu Werkleitungen, PFS T/U 12 - Fertigstellung PPT (Fazit, Antrag und weiteres Vorgehen)	1.50
27.09.2021	PFS T/U 12 inkl. Vor- und Nachbereitung (Info Projektbeteiligte)	1.50
28.09.2021	Aufgleisen Nachbestellung fehlende Leitungskataster (Swisscom, IWB, GVM); Kurzbesprechung mit A. Abdelmoghni betreffend Aufgabenteilung	1.00

Summe

15.00

ARBEITSRAPPORT

JAUSLIN
STEBLER

Periode: 01.09.2021 - 30.09.2021

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass

Mitarbeiter **Deck Andreas (dea)** Kategorie: D264 Zeichner Konstrukteur, Bauleiter

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
02.09.2021	Aktualisierung Varianten 2a und 2b gem. Rückmeldung PV Verkehr	1.00
03.09.2021	Aufbereiten Vermessung Bypass / Ausarbeiten Variante 2a in 2dr Modell	2.00
06.09.2021	Besprechung intern (F. Grieder) - Ausarbeitung Bestvarianten 2a und 2b	1.50
07.09.2021	Konstruieren Bypass Varianten 2a und 2b in 2dr (Modell) / Export	2.50
08.09.2021	Ausarbeiten Varianten Bypass AS Frick: Erstellen Situationspläne, Flächenbeanspruchung, Sichtbermen, TB und Export	3.00
09.09.2021	Erstellen Variante 2a/2b kombiniert - Ergänzung Schnitte 01-04	2.00

Summe

12,00

ARBEITSRAPPORT

J AUSLIN
S STEBLER

Periode: 01.09.2021 - 30.09.2021

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
	Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
	Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
	Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
	Projektnummer: 090069
	AP Bypass


Mitarbeiter **Hegi Yannick (yh)** Kategorie: H Lehrling (3. + 4. LJ)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
09.09.2021	Bypass AS Frick PHASE 02; Querprofile für Variante 2a und 2b erstellen	3.00
22.09.2021	Werkleitungsplan; Erstellung Werkleitungsplan Bypass	3.50
27.09.2021	Werkleitungsplan; Kontrolle der vorhandenen Werkleitungen und fg weiterleiten welche Werkleitungen fehlen	0.50
Summe		7.00


Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt:	N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
Vertragnehmer:	INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.:	000003
Vertragsgegenstand:	PV Bau/BSA
Projektnummer:	090069
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2021
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Oktober

Vertragsdatum:	14.11.2018
Vertragslaufzeit:	31.12.2022
Finanzierungskonto:	Unterhalt
Inventarobjekt:	FUP.2
Phasen, beauftragt:	AP Bypass
Phasen, rapportiert:	AP Bypass

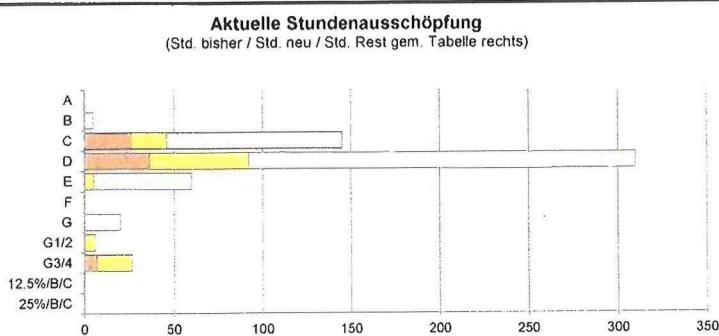

Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Ver- brauch %
A						
B	5			5		
C	145	25.75	20	99.25		32%
D	310	36	56.25	217.75		30%
E	60		5	55		8%
F						
G	20			20		
G1/2			6		6	
G3/4		7	19.5		26.5	
12.5%/B/C						
25%/B/C						
S	540	68.75	106.75	397	175.5	33%



	quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer	
	Selbsteinschätzung	40%
	rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)	
■ Kostenausschöpfung	Kostendach	CHF 44'925.00
■ Stundenausschöpfung	Kosten ist	CHF 12'773
	Kostenausschöpfung	28 43%
	Stundenausschöpfung	33%

Stundenabrechnung

Stundenabrechnung	Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardl AG	Kategorie		A														
	Kategorie		B														
	Kategorie		C														
	Kategorie		D														
	Kategorie		E														
	Kategorie		F														
	Kategorie		G														
	Kategorie		G1/2														
	Kategorie		G3/4														
Jauslin Stebler AG	Kategorie		A														
	Kategorie		B														45.75
	Kategorie		C									4.5	6.25	15	20		
	Kategorie		D									20.5	3.5	12	56.25		92.25
	Kategorie		E														5
	Kategorie		F														
	Kategorie		G														
	Kategorie		G1/2														6
	Kategorie		G3/4														26.5
Leipert AG	Kategorie		B														
	Kategorie		C														
	Kategorie		D														
	Kategorie		E														
	Kategorie		F														
Holinger AG	Kategorie		B														
	Kategorie		C														
	Kategorie		D														
	Kategorie		E														
	Kategorie		F														
	Kategorie		G1/2														
Total												25	9.75	34	106.75		175.5

Kostenabrechnung

Kostentabrechnung															
Ansatz (excl. MwSt. inkl. 5% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A														
CHF 122.00	B														
CHF 95.00	C								428	594	1'425	1'900		4'346	
CHF 86.00	D								1'763	301	1'032	4'838		7'934	
CHF 62.00	E											310		310	
CHF 50.00	F														
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2											24		24	
CHF 6.00	G3/4										42	117		159	
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total									2'190.50	894.75	2'499.00	7'188.50		CHF 12'772.75	

JAUSLIN STEBLER AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.10.21 bis 31.10.21

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP Bypass

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Roth Stefan	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
	Total	A	0	0.00
Forlin Sandro	B	0	122	0.00
Hartmann Peter	B	0	122	0.00
Mantinger Michael	B	0	122	0.00
Methner Raphael	B	0	122	0.00
	Total	B	0	0.00
Brauchli Stefan	C	0	95	0.00
Grieder Fabio	C	18	95	1'710.00
Hunziker Livia	C	2	95	190.00
Name Vorname	C	0	95	0.00
	Total	C	20	1'900.00
Abdelmoghni Ahmed	D	24.75	86	2'128.50
Deck Andreas	D	31.5	86	2'709.00
Rothfuss Fabian	D	0	86	0.00
Seebacher Andreas	D	0	86	0.00
Meyer Moritz	D	0	86	0.00
Nyffenegger Christoph	D	0	86	0.00
Brunner Andreas	D	0	86	0.00
Boeglin Chantal	D	0	86	0.00
	Total	D	56.25	4'837.50
Müller Jan	E	5	62	310.00
Brüngger Marco	E	0	62	0.00
Ladner Roman	E	0	62	0.00
Russer Elisabeth	E	0	62	0.00
Wortelboer Alexander	E	0	62	0.00
	Total	E	5	310.00
Dogan Esra	F	0	50	0.00
Prescha Deliah	F	0	50	0.00
	Total	F	0	0.00
Strittmatter Katja (Praktikantin)	G	0	8	0.00
Möri Anna	G	0	8	0.00
	Total	G	0	0.00
Straub Vanessa	G3/4	0	6	0.00
Hegi Yannick	G3/4	19.5	6	117.00
Schneider Anika	G1/2	6	4	24.00
	Total	G	25.5	141.00
Gesamttotal		106.75		7'188.50

ARBEITSRAPPORT

JAUSLIN
STEBLER

Periode: 01.10.2021 - 31.10.2021

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Auftrag-Nr.: 702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
AP Bypass

Mitarbeiter **Grieder Fabio (fg)** Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
06.10.2021	Infos aus PFS T/U an PV Umwelt, Abgleich weiteres Vorgehen und Stand der Arbeiten	1.00
07.10.2021	Werkleitungskonzept - Sichtung Grundlagen Entwässerung und BSA sowie Abklärungen betreffend Bestellungen Ergänzungen Werkleitungen Dritter	1.00
11.10.2021	Koordinationssitzung mit PV Umwelt betreffend Stand der Arbeiten, Dossierinhalt und weiteres Vorgehen; Besprechung mit A. Abdelmoghni betreffend Konzept Werkleitungen (BSA und EW) sowie div. Inputs	2.50
12.10.2021	Koordination mit A. Abdelmoghni betreffend Abgleich mit PV BSA zum Versatz der Verteilkabine; Andiskutieren Vorgehen Definition Belagsaufbauten	1.00
13.10.2021	Koordination betreffend Konzept Werkleitungen (EW und BSA) mit A. Abdelmoghni, Augenschein vor Ort inkl. Fotodokumentation	2.00
14.10.2021	Koordination mit J. Müller betreffend Konzept Werkleitungen (EW und BSA) inkl. kleine Korrekturen; PS Bau 20 inkl. Vor- und Nachbereitung; Abstimmung mit M. Meer betreffend PFS-Termin inkl. Info Projektteam	2.50
18.10.2021	Abgleich mit A. Deck und Y. Hegi betreffend Planerstellung und Zuständigkeiten; Zusammenstellen Angaben für Titelblatt AP-Dossier	1.50
19.10.2021	Kurzbesprechung mit A. Deck betreffend geometrischer Optimierung Bypass (Radien allgemein, Fahrspurbreiten und Zufahrt Kreisel)	1.00
20.10.2021	Besprechung Belagsaufbauten und Dimensionierung mit A. Abdelmoghni	0.75
21.10.2021	Bilateraler Abgleich mit PV BSA betreffend definierte Variante Bypass und Schnittstellen zu Werkleitungen und Kandelaber	0.50
25.10.2021	Besprechung aktualisierte Geometrisierung (Radien, Gefälle, Fussgängerführung) mit A. Deck und Definition weiteres Vorgehen Planerstellung für Abgabe Entwurf an FU	1.00

Mitarbeiter	Grieder Fabio (fg)	Kategorie:	C354	Architekt, Ingenieur (C)
Datum	Leistungsbeschrieb			Stunden
27.10.2021	Werkleitungskonzept - Kurzabgleich mit A. Abdelmoghni betreffend div. Punkten (Beschriftungen, Kennzeichnung Schnittstellen,...); Update Stand der Arbeiten durch Y. Hegi		0.75	
28.10.2021	Abgleich mit A. Deck und Y. Hegi betreffend div. offenen Punkten zu NP und QP sowie Werkleitungskonzept		1.00	
29.10.2021	Plankontrolle Situation, QP, NP, Werkleitungskonzept		1.50	
Summe			18.00	

ARBEITSRAPPORT

J AUSLIN
S STEBLER

Periode: 01.10.2021 - 31.10.2021

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
	Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
	Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
	Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
	Projektnummer: 090069
	AP Bypass

Mitarbeiter **Abdelmoghni Ahmed (aha)** Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
07.10.2021	Besichtigung bestehende Werkleitung im Bereich des Bypass und Erarbeitung Werkleitungskonzept im Entwurf.	3.00
11.10.2021	Bearbeitung Werkleitungen (BSA- Entwässerung) im Bereich Bypass gemäss Variante a+b. Abgleich mit Fabio Grieder.	3.50
13.10.2021	Erarbeitung Werkleitungskonzept Bypass Frick. bestehende Werkleitungen (Swisscom und KOPA) einlesen und Knoflikte ermitteln, interner Abgleich.	6.50
14.10.2021	Besprechung Belagsaufbau und zu bearbeitenden Unterlagen.	0.50
19.10.2021	Belagsaufbau Ermittlung Bereich Aussenkurve Fahrtrichtung Wittenbach.	0.50
20.10.2021	Erarbeitung Belagsaufbau (Trottoir und Bereich Bypass). Prüfung kurvenvorbereitung.	3.00
21.10.2021	Abgleich Konzept BSA mit Markus Leipert	0.50
22.10.2021	Werkleitungen (BSA und Entwässerung) Bearbeitung und neuen geometrie gemäss Abgleich vom 21.10.2021 mit Markus leipert. interner Abgleich. FS-Breiten und Kurvenverbreiterung gemäss VSS Prüfen.	3.50
26.10.2021	Prüfung Werkleitungsplan Stand 26.10 und Rückmeldung an Zeichner.	1.50
27.10.2021	Kurzer Abgleich Werkleitungsplan	0.25
28.10.2021	Prüfen und Abgleich Werkleitungsplan Stand 28.10 und mit dem zeichener bearbeiten.	2.00
Summe		24.75

ARBEITSRAPPORT

JAUSLIN
STEBLER

Periode: 01.10.2021 - 31.10.2021

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass

Mitarbeiter **Deck Andreas (dea)** Kategorie: D264 Zeichner Konstrukteur,
Bauleiter

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
18.10.2021	Konstruktion Radien Bypass AS Frick / Optimierung Zufahrt	4.00
19.10.2021	Ausarbeiten Bypass Geometrie / Abgleich Quer Gefälle / Erstellen Übersichten Werkleitungen	2.50
21.10.2021	Projekterierung Flächen und Geometrie AP Bypass / Prüfung Schleppkurven	1.00
22.10.2021	Besprechung A. Abdelmoghni (Werkleitungen BSA und Entwässerung) / Erstellen Modell 2dr Bypass inkl. LP und Quer Gefälle / Export Situation // Varianten Anschluss Trottoir an Werkhofareal	6.00
25.10.2021	Erarbeiten Projekt Bypass (Querprofile/Flächen Belagsersatz) / Prüfung Sichtweiten / Projekt Anschluss Trottoir an Werkhofgelände / Besprechung intern (F. Grieder)	5.00
26.10.2021	Erarbeiten Normalprofil (Neubau und Belagssanierung) / Prüfung Horax / Verax	3.00
27.10.2021	Aufbereiten Querprofile / Kontrolle // Ergänzungen Normalprofil / Ergänzung Situation (Gefälle, Verax)	3.00
28.10.2021	Erstellen Übersichtsplan / Ergänzung Situation (Markierungen neu, Zäune, Bepflanzung und Bäume, Belagskanten, Legende) / Korrex intern / Ergänzungen LP (Beschriftung)	3.50
29.10.2021	Ergänzung Situationsplan gem. NP/QP // Kontrolle, TB, Legenden und Export	3.50
Summe		31.50

ARBEITSRAPPORT

JAUSLIN
STEBLER

Periode: 01.10.2021 - 31.10.2021

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
	Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
	Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
	Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
	Projektnummer: 090069
	AP Bypass

Mitarbeiter	Hunziker Livia (Lgr)	Kategorie:	D154	Ingenieur (D)
-------------	-----------------------------	------------	------	---------------

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
05.10.2021	Werkleitungsanfrage an KOPA inkl. vorhandene Werkleitungen begutachten	0.50
08.10.2021	Durchsicht Grundlagen, Werkleitungsanfrage bei Firma KOPA inkl. Telefonat und E-Mai, Werkleitungsanfrage IWB inkl. Telefonat und E-Mail, Werkleitungsanfrage Gmd Frick (Anita Herzog), Werkleitungsanfrage GVM, Swisscom Werkleitungsanfrage inkl. div. Unterlagen ablegen,	1.50
Summe		2.00

ARBEITSRAPPORT

JAUSLIN
STEBLER

Periode: 01.10.2021 - 31.10.2021

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
	Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
	Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
	Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
	Projektnummer: 090069
	AP Bypass

Mitarbeiter	Müller Jan (jam)	Kategorie:	F256	Zeichner(F)
-------------	-------------------------	------------	------	-------------

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
14.10.2021	Erstellung Entwässerungsplan und BSA-Plan im Bereich Bypass und Absprache mit F. Grieder	5.00
Summe		5.00



ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.10.2021 - 31.10.2021

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass

Mitarbeiter	Hegi Yannick (yh)	Kategorie:	H	Lehrling (3. + 4. LJ)
-------------	--------------------------	------------	---	-----------------------

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
20.10.2021	Erstellung/ Korrekturen im Situationsplan	2.00
25.10.2021	Korrekturen Entwässerung + BSA in Werkleitungsplan einarbeiten. Darstellung Projekt Bypass einfügen, Massnahmen von A. Abdelmoghni einarbeiten	5.50
26.10.2021	Werkleitungsplan fertigstellen. Neue Leitungen (BSA/EW) verschieben + Darstellung, Legende und Darstellung allgemein (Leitungen anpassen, Projekt Bypass) und an Abdelmoghni Ahmed senden	5.00
27.10.2021	Querprofile kontrollieren/ fertigstellen	2.00
28.10.2021	Situation: Verax einarbeiten und Querprofilpunkte. Fertigstellen Längenprofil, Darstellung anpassen, Höhen und Gefälle abgleichen/kontrollieren. Querprofile: Darstellung anpassen , Korrekturen von A. Deck einarbeiten.	5.00
Summe		19.50

ARBEITSRAPPORT

JAUSLIN
STEBLER

Periode: 01.10.2021 - 31.10.2021

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass

Mitarbeiter **Schneider Anika (sca)** Kategorie: I Lehrling (1. + 2. LJ)



Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
26.10.2021	Aufbereitung Längenprofil, Aufbereitung Querprofile 1-3	2.00
27.10.2021	Aufbereitung Querprofil 4-6, Aufbereitung Normalprofil 1-2	2.00
28.10.2021	Korrekturen Querprofil, Normalprofil, Längenprofil gem. Korrex intern (A. Deck)	2.00
Summe		6.00





Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt:	N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen	Vertragsdatum:	14.11.2018
Vertragnehmer:	INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG	Vertragslaufzeit:	31.12.2022
Vertrag Nr.:	000003	Finanzierungskonto:	Unterhalt
Vertragsgegenstand:	PV Bau/BSA	Inventarobjekt:	FUP.2
Projektnummer:	090069	Phasen, beauftragt:	AP Bypass
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2021	Phasen, rapportiert:	AP Bypass
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	November		

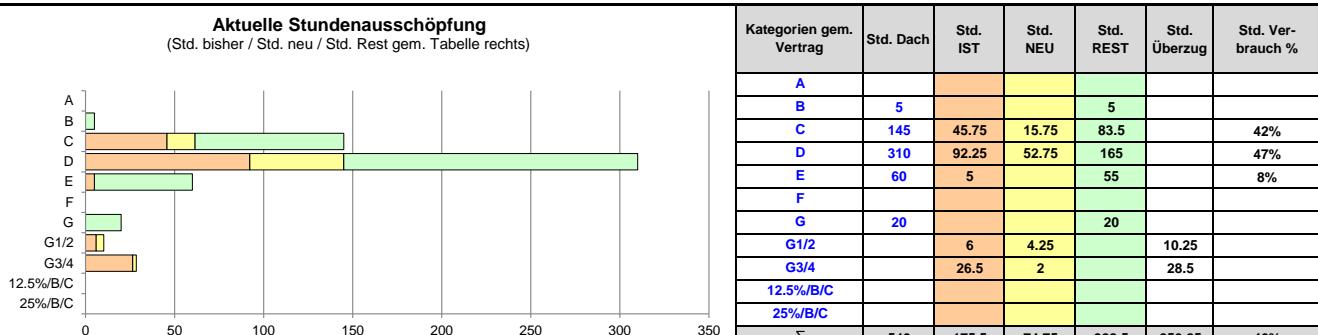

Stundenabrechnung

Name	Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG		A														
		B														
		C														
		D														
		E														
		F														
		G														
		G1/2														
		G3/4														
Jauslin Stebler AG		A														
		B														
		C								4.5	6.25	15	20	15.75		61.5
		D							20.5	3.5	12	56.25	52.75			145
		E										5				5
		F														
		G														
		G1/2										6	4.25			10.25
		G3/4									7	19.5	2			28.5
Leipert AG		B														
		C														
		D														
		E														
		F														
Holinger AG		B														
		C														
		D														
		E														
		F														
		G														
		G1/2														
Total										25	9.75	34	106.75	74.75		250.25

Ansatz (exkl. MwSt., inkl. 0% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A														
CHF 122.00	B														
CHF 95.00	C								428	594	1'425	1'900	1'496		5'643
CHF 86.00	D								1'763	301	1'032	4'838	4'537		12'470
CHF 62.00	E											310			310
CHF 50.00	F														
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2											24	17		41
CHF 6.00	G3/4										42	117	12		171
CHF 13.56	12.5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total									2'190.50	894.75	2'499.00	7'188.50	6'061.75		CHF 18'834.50

JAUSLIN STEBLER AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.11.21 bis 30.11.21


Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP Bypass

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Roth Stefan	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
Total	A	0		0.00
Forlin Sandro	B	0	122	0.00
Hartmann Peter	B	0	122	0.00
Mantinger Michael	B	0	122	0.00
Methner Raphael	B	0	122	0.00
Total	B	0		0.00
Brauchli Stefan	C	0	95	0.00
Gieder Fabio	C	10.25	95	973.75
Hunziker Livia	C	5.5	95	522.50
Name Vorname	C	0	95	0.00
Total	C	15.75		1'496.25
Abdelmoghn Ahmed	D	25	86	2'150.00
Deck Andreas	D	2.5	86	215.00
Dolder Silvio	D	25.25	86	2'171.50
Rothfuss Fabian	D	0	86	0.00
Seebacher Andreas	D	0	86	0.00
Meyer Moritz	D	0	86	0.00
Nyffenegger Christoph	D	0	86	0.00
Brunner Andreas	D	0	86	0.00
Boeglin Chantal	D	0	86	0.00
Total	D	52.75		4'536.50
Müller Jan	E	0	62	0.00
Brüngger Marco	E	0	62	0.00
Ladner Roman	E	0	62	0.00
Russer Elisabeth	E	0	62	0.00
Wortelboer Alexander	E	0	62	0.00
Total	E	0		0.00
Dogan Esra	F	0	50	0.00
Prescha Deliah	F	0	50	0.00
Total	F	0		0.00
Strittmatter Katja (Praktikantin)	G	0	8	0.00
Möri Anna	G	0	8	0.00
Total	G	0		0.00
Straub Vanessa	G3/4	0	6	0.00
Hegi Yannick	G3/4	2	6	12.00
Schneider Anika	G1/2	4.25	4	17.00
Total	G	6.25		29.00
Gesamttotal		74.75		6'061.75


Stunden-/ Cashausschöpfung (Honorarvertrag)

Projekt: N03 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmaßnahmen
Vertragnehmer: INGE EP RF BB, c/o Aegerter & Bosshardt AG
Vertrag Nr.: 000003
Vertragsgegenstand: PV Bau/BSA
Projektnummer: 090069
Aktuelles Beobachtungsjahr: 2021
Beobachtungsmonat (Std. NEU): Dezember

Vertragsdatum:	14.11.2018
Vertragslaufzeit:	31.12.2022
Finanzierungskonto:	Unterhalt
Inventarobjekt:	FUP.2
Phasen, beauftragt:	AP Bypass
Phasen, rapportiert:	AP Bypass

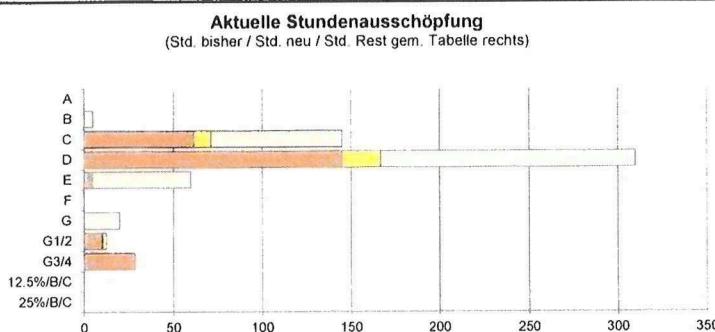

Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B	5			5		
C	145	61.5	9.75	73.75		49%
D	310	145	21.5	143.5		54%
E	60	5		55		8%
F						
G	20			20		
G1/2		10.25	2.25		12.5	
G3/4		28.5			28.5	
12.5%/B/C						
25%/B/C						
<u>Summe</u>	<u>540</u>	<u>250.25</u>	<u>33.5</u>	<u>297.25</u>	<u>283.75</u>	<u>53%</u>



quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer	
Selbsteinschätzung	90%
rechnerische Auswertungen (exkl. MWSt.)	
Kostendach	CHF 44'925.00
Kosten ist	CHF 21'619
Kostenauflösung	48.12%
Kostenabschöpfung	53%

Stundenabrechnung

Stundenabrechnung		Vorname	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Aegerter & Bosshardt AG		Kategorie	A														
		Kategorie	B														
		Kategorie	C														
		Kategorie	D														
		Kategorie	E														
		Kategorie	F														
		Kategorie	G														
		Kategorie	G1/2														
		Kategorie	G3/4														
Jauslin Stebler AG		Kategorie	A														
		Kategorie	B														
		Kategorie	C								4.5	6.25	15	20	15.75	9.75	71.25
		Kategorie	D								20.5	3.5	12	56.25	52.75	21.5	166.5
		Kategorie	E														5
		Kategorie	F														
		Kategorie	G														
		Kategorie	G1/2														
		Kategorie	G3/4														
Leipert AG		Kategorie	B														
		Kategorie	C														
		Kategorie	D														
		Kategorie	E														
		Kategorie	F														
Holinger AG		Kategorie	B														
		Kategorie	C														
		Kategorie	D														
		Kategorie	E														
		Kategorie	F														
		Kategorie	G1/2														
Total											25	9.75	34	106.75	74.75	33.5	283.75

Kostenabrechnung															
Ansatz (excl. MwSt. inkl. 5% Rabatt)	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
CHF 145.00	A														
CHF 122.00	B														
CHF 95.00	C								428	594	1'425	1'900	1'496	926	6'769
CHF 86.00	D								1'763	301	1'032	4'838	4'537	1'849	14'319
CHF 62.00	E											310		310	
CHF 50.00	F														
CHF 8.00	G														
CHF 4.00	G1/2										24	17	9	50	
CHF 6.00	G3/4										42	117	12	171	
CHF 13.56	12,5%/B/C														
CHF 27.13	25%/B/C														
Total									2'190.50	894.75	2'499.00	7'188.50	8'061.75	2'784.25	CHF 21'818.75

JAUSLIN STEBLER AG

Gesamtbelastung nach Mitarbeiter und Honorarklassen von 01.12.21 bis 31.12.21

Projekt: ASTRA F3, EP Rheinfelden-Frick, AP Bypass

Mitarbeiter	Kat.	Stunden	Kostensatz	Betrag
Roth Stefan	A	0	145	0.00
Name Vorname	A	0	145	0.00
	Total	A	0	0.00
Forlin Sandro	B	0	122	0.00
Hartmann Peter	B	0	122	0.00
Mantinger Michael	B	0	122	0.00
Methner Raphael	B	0	122	0.00
	Total	B	0	0.00
Brauchli Stefan	C	0	95	0.00
Grieder Fabio	C	4	95	380.00
Hunziker Livia	C	5.75	95	546.25
Name Vorname	C	0	95	0.00
	Total	C	9.75	926.25
Abdelmoghni Ahmed	D	9.5	86	817.00
Deck Andreas	D	0	86	0.00
Dolder Silvio	D	11.5	86	989.00
Rothfuss Fabian	D	0	86	0.00
Seebacher Andreas	D	0.5	86	43.00
Meyer Moritz	D	0	86	0.00
Nyffenegger Christoph	D	0	86	0.00
Brunner Andreas	D	0	86	0.00
Boeglin Chantal	D	0	86	0.00
	Total	D	21.5	1'849.00
Müller Jan	E	0	62	0.00
Brüngger Marco	E	0	62	0.00
Ladner Roman	E	0	62	0.00
Russer Elisabeth	E	0	62	0.00
Wortelboer Alexander	E	0	62	0.00
	Total	E	0	0.00
Dogan Esra	F	0	50	0.00
Prescha Deliah	F	0	50	0.00
	Total	F	0	0.00
Strittmatter Katja (Praktikantin)	G	0	8	0.00
Möri Anna	G	0	8	0.00
	Total	G	0	0.00
Straub Vanessa	G3/4	0	6	0.00
Hegi Yannick	G3/4	0	6	0.00
Schneider Anika	G1/2	2.25	4	9.00
	Total	G	2.25	9.00
Gesamttotal		33.5		2'784.25

ARBEITSRAPPORT

**J AUSLIN
S STEBLER**

Periode: 01.12.2021 - 31.12.2021

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass

Mitarbeiter **Grieder Fabio (fg)** Kategorie: C354 Architekt, Ingenieur (C)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
06.12.2021	Bilateraler Abgleich mit PV Umwelt betreffend Dokumentenlieferungen und offenen Fragen; Koordination mit A. Abdelmoghni betreffend Bauphasen Bypass und Schnittstelle MK-Dossier	1.50
08.12.2021	Absprache mit PV Verkehr betreffend Signalisation Bypass Frick	0.50
13.12.2021	Koordination mit S. Dolder betreffend offene Fragen zu AP-Plänen	0.50
22.12.2021	Koreferat und Ergänzung Technischer Bericht, Durchsicht aktueller Stand der Pläne	1.50
Summe		4.00



ARBEITSRAPPORT

**JAUSLIN
STEBLER**

Periode: 01.12.2021 - 31.12.2021

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass

Mitarbeiter **Hunziker Livia (Lgr)** Kategorie: C253 Leitender Ingenieur

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
10.12.2021	Bestehende Dienstbarkeiten überprüfen und Plan vorbereiten mit best. Dienstbarkeiten für Zeichnerin A. Schneider	0.75
20.12.2021	Grunderwerbstabelle für SABA mit Zonen ergänzen inkl. Grundeigentümer, ABlage GB Auszüge, Zeichnerkoordination A. Schneider für Aufbereiten LE-Plan SABA	5.00
Summe		5.75

ARBEITSRAPPORT

**J AUSLIN
S STEBLER**

Periode: 01.12.2021 - 31.12.2021

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass

Mitarbeiter **Abdelmoghni Ahmed (aha)** Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
02.12.2021	Bearbeitung Tech. Bericht (Grundlagen) und interne Abgleich.	0.50
03.12.2021	Abgleich Massnahmen VK un die damit verbundenen Kosten für den KV	0.50
06.12.2021	Bearbeitung Tech. Bericht gemäss Abgleich mit Fabio Grieder und Silvio Dolder. Unterteilung Projektperimeter in Abschnitten und Beschreibung im tech. Bericht. Besprechung Bauphasen mit Andreas Seebacher. Erarbeitung Bauphasen und Pläne aufskizziert inkl. interner Abgleich.	8.50
Summe		9.50

ARBEITSRAPPORT

**JAUSLIN
STEBLER**

Periode: 01.12.2021 - 31.12.2021

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass

Mitarbeiter **Dolder Silvio (sdo)** Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
01.12.2021	Ermitteln der Dienstbarkeiten gemäss Grundbuchauszüge und eintragen in die Grunderwerbstabelle der Parzellen 2211, 2238 und 552	0.50
06.12.2021	Anpassungen KV gemäss Angaben von A. Abdelmoghni, EP RhFr - Arbeitssitzung AP Bypass mit A. Abdelmoghni und F. Grieder	2.00
09.12.2021	Überprüfung aller Pläne (Situation, Werkleitungen, QP, NP, LP)	2.25
13.12.2021	Besprechung Plankorrekturen mit F. Grieder, Zusammenstellen fehlender Dokumente zur Plankorrektur, Bearbeiten Insel zwischen Kreisel und Bypass	1.75
14.12.2021	Anpassungen der Insel im NP und in der Situation, Korrektur aller Pläne und besprechen mit A. Schneider, Ermittlung Lage Leitungen mit relevanz für NP1	2.00
15.12.2021	Anpassen KV durch die Änderungen bei der Insel zwischen dem Bypass und dem Kreisel, Tabelle "Materialbewirtschaftung" bearbeiten, Korrektur Pläne	2.25
17.12.2021	Besprechung LE Plan mit L. Hunziker, Anpassen LE Plan	0.75
Summe		11.50



ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.12.2021 - 31.12.2021

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069

Auftrag-Nr.: 702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
AP Bypass

Mitarbeiter **Seebacher Andreas (san)** Kategorie: D154 Ingenieur (D)

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
06.12.2021	Kurzbalgeich mit A. Abdelmoghni zu temporärer VF Bypass Frick	0.50
Summe		0.50

ARBEITSRAPPORT

**JAUSLIN
STEBLER**

Periode: 01.12.2021 - 31.12.2021

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
	Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
	Projektnummer: 090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
	Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
	Projektnummer: 090069
	AP Bypass

Mitarbeiter	Schneider Anika (sca)	Kategorie:	I	Lehrling (1. + 2. LJ)
-------------	------------------------------	------------	---	-----------------------

Datum	Leistungsbeschrieb	Stunden
14.12.2021	Einführung von bearbeitung von Nische und Erstellung von Detailplan	0.25
14.12.2021	Einführung in Ap IF+LE Plan für bearbeitungen.	0.50
14.12.2021	Alle Pläne bei 05 Bypass verbessert nach kontrolle durch S. Dolder	1.50
Summe		2.25
